

# Informe de labores de obras del 4to trimestre del ejercicio 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**CHIAPA DE CORZO**  
2021-2024  
GOBERNEMOS JUNTOS

Honorable Ayuntamiento Constitucional de  
Chiapa de Corzo, Chiapas  
2021-2024



## Obras del 4to trimestre 2023

Nombre de la obra	Localidad	Inversión	%
Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Topada De La Flor	330,824.00	0.22
Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Playa Grande	330,824.00	0.22
Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Cabecera Municipal (Camino al Panteón)	330,824.00	0.22
Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1	San José Mujular	330,824.00	0.22
Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. La Joya	330,824.00	0.22
Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col El Amate	330,824.00	0.22
Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col El Refugio	330,824.00	0.22
Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. Unión Y Progreso	330,824.00	0.22
Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. Plan Chiapas	330,824.00	0.22
Pavimentación de calles concreto mixto	Col. Plan Chiapas	311,497.51	0.21
Rehabilitación de red de drenaje sanitario	Cabecera Municipal (Barrio Covadonga)	308,009.00	0.20
Rehabilitación de red de drenaje sanitario	Cabecera Municipal (Barrio Morelos)	308,009.00	0.20
Rehabilitación de calles tramos aislados (bacheo)	Col. Cahuare	327,329.70	0.22
Rehabilitación de calles tramos aislados (bacheo)	Cabecera Municipal (Barrio Santa Elena)	330,158.56	0.22
Ampliación de red de drenaje sanitario	Cabecera Municipal (Col. Jardines Del Grijalva)	315,345.56	0.21
Ampliación de red de agua potable	Cabecera Municipal (Col. Jardines Del Grijalva)	321,122.74	0.21
Rehabilitación de calles tramos aislados (bacheo)	Cabecera Municipal (Barrio Covadonga)	307,623.23	0.20
Ampliación del sistema de bombeo	Col. Emiliano Zapata III	311,103.23	0.21
Rehabilitación del sistema de bombeo	Col. V. Carranza	328,502.95	0.22
Pavimentación de calles con concreto hidráulico. (160 ml)	Margaritas	Pendiente	
Construcción de domo en cancha deportiva en COBACH N° 74	Julián Grajales	Pendiente	
Construcción de andadores peatonales	La Unión (El Castaño)	Pendiente	
Pavimentación de calles con concreto hidráulico. (200 ml)	Nueva Palestina	Pendiente	



## Obras del 4to trimestre 2023

Nombre de la obra	Localidad	Inversión	%
Pavimentación de calles con concreto hidráulico. (180 ml)	Candili	Pendiente	
Pavimentación de calles con concreto hidráulico. (269 ml)	Narcizo Mendoza	Pendiente	
Rehabilitación de la red de distribución de agua potable	Galecio Narcia	Pendiente	
Construcción de puente vehicular (17.5 ml a - 4.4)	El Recuerdo	Pendiente	
Modernización de camino e.c. con carpeta asfáltica (KM 2+500 AL 3+000)	Nucatili	Pendiente	
Pavimentación de calles con concreto hidráulico. (190 ml)	Cahuare	Pendiente	
Construcción de muros de contención y plataforma en jardín de niños León Felipe	Nandambua 1A Sección	Pendiente	
Ampliación de puente vehicular en calle 5 de Febrero	Cabecera Municipal (Barrio San Vicente)	Pendiente	
Revestimiento de camino e.c. (km 0+000 al 6+386)	Barranca Honda	Pendiente	
Pavimentación de calles con concreto hidráulico.	Nicolas Bravo	Pendiente	
Pavimentación de calles con concreto hidráulico (250 ml)	Carrillo Puerto	Pendiente	
Revestimiento callejón nandambua	Nandambua 2A Sección	Pendiente	
<b>Total</b>		<b>6,146,117.48</b>	<b>4.05</b>



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**CHIAPA DE CORZO**  
2021-2024  
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Topada de la Flor



# FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)

## FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

**MUNICIPIO:** CHIAPA DE CORZO  
**LOCALIDAD:** COL. TOPADA DE LA FLOR  
**NOMBRE DE LA OBRA:** REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1  
**PROGRAMA:** UR0000.- URBANIZACION  
**SUB-PROG:** UR0500.- CAMINOS RURALES

**Nº DE OBRA:** 23028

### Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$330,824.00	FISM	\$330,824.00	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$330,824.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$330,824.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

**Descripción de la Obra**

REHABILITACION DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

**Numero de Contrato**

MCC/DOPyDUM/FISM-0T-026/2023

**Número de Dictamen**

**Periodo de Ejecucion**


Fecha de Inicio		
	01/03/2023	
<b>Programado real</b>		
<b>Termino</b>	15/03/2023	

**Avances**

**Fisico: 100%**  
**Financiero: 100%**

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

**Fotografia Terminada**

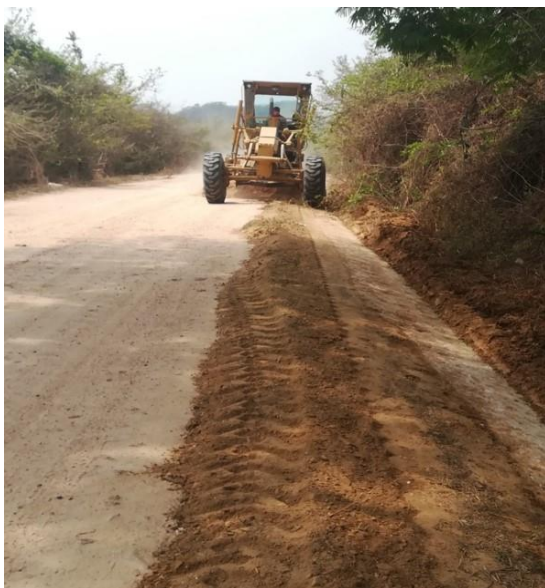



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**CHIAPA DE CORZO**  
2021-2024  
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Playa Grande



# FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)

## FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

**MUNICIPIO:** CHIAPA DE CORZO  
**LOCALIDAD:** COL. PLAYA GRANDE  
**NOMBRE DE LA OBRA:** REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1  
**PROGRAMA:** UR0000.- URBANIZACION  
**SUB-PROG:** UR0500.- CAMINOS RURALES

**Nº DE OBRA:** 23029

### Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$330,824.00	FISM	\$330,824.00	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$330,824.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$330,824.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

**Descripción de la Obra**

REHABILITACION DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

**Numero de Contrato**

MCC/DOPyDUM/FISM-0T-027/2023

**Número de Dictamen**

**Periodo de Ejecucion**

Fecha de inicio	
Programado real	01/03/2023
Termino	15/03/2023

**Avances**

**Fisico: 100%**  
**Financiero: 100%**

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

**Fotografia Terminada**





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**CHIAPA DE CORZO**  
2021-2024  
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Cabecera Municipal (Camino al Panteón)





# FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)

## FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

**MUNICIPIO:** CHIAPA DE CORZO  
**LOCALIDAD:** CABECERA MUNICIPAL (CAMINO AL PANTEON)  
**NOMBRE DE LA OBRA:** REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1  
**PROGRAMA:** UR0000.- URBANIZACION  
**SUB-PROG:** UR0500.- CAMINOS RURALES

**Nº DE OBRA:** 23030

### Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$330,824.00	FISM	\$330,824.00	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$330,824.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$330,824.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

**Descripción de la Obra**

REHABILITACION DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

**Numero de Contrato**

MCC/DOPYDUM/FISM-0T-028/2023

**Número de Dictamen**

**Periodo de Ejecucion**


Fecha de Inicio	
Programado real	01/03/2023
Termino	15/03/2023

**Avances**

**Fisico: 100%**  
**Financiero: 100%**

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

**Fotografia Terminada**

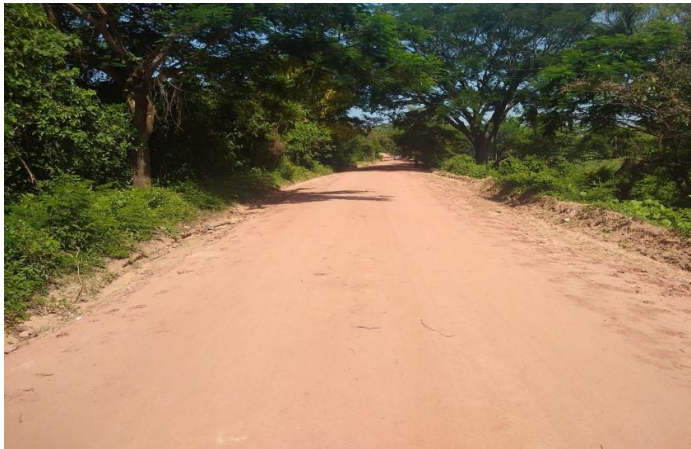



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**CHIAPA DE CORZO**  
2021-2024  
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la San José Mujular



**FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

**MUNICIPIO:** CHIAPA DE CORZO  
**LOCALIDAD:** COL. SAN JOSE MUJULAR  
**NOMBRE DE LA OBRA:** REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1  
**PROGRAMA:** UR0000.- URBANIZACION  
**SUB-PROG:** UR0500.- CAMINOS RURALES

**Nº DE OBRA:** 23031

**Situación Financiera**

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$330,824.00	FISM	\$330,824.00	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$330,824.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$330,824.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

**Descripción de la Obra**

REHABILITACION DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

**Numero de Contrato**

MCC/DOPyDUM/FISM-OT-029/2023

**Número de Dictamen**

**Periodo de Ejecucion**

Fecha de inicio	
Programado real	01/03/2023
Termino	15/03/2023

**Avances**

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

**Fotografia Terminada**





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**CHIAPA DE CORZO**  
2021-2024  
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. La Joya



# FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)

## FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

**MUNICIPIO:** CHIAPA DE CORZO  
**LOCALIDAD:** COL. LA JOYA  
**NOMBRE DE LA OBRA:** REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1  
**PROGRAMA:** UR0000.- URBANIZACION  
**SUB-PROG:** UR0500.- CAMINOS RURALES

**Nº DE OBRA:** 23032

### Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$330,824.00	FISM	\$330,824.00	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$330,824.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$330,824.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

**Descripción de la Obra**

REHABILITACION DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

**Numero de Contrato**

MCC/DOPyDUM/FISM-OT-030/2023

**Número de Dictamen**

**Periodo de Ejecucion**


Fecha de inicio	
Programado real	01/03/2023
Termino	15/03/2023

**Avances**

**Fisico: 100%**  
**Financiero: 100%**

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

**Fotografia Terminada**

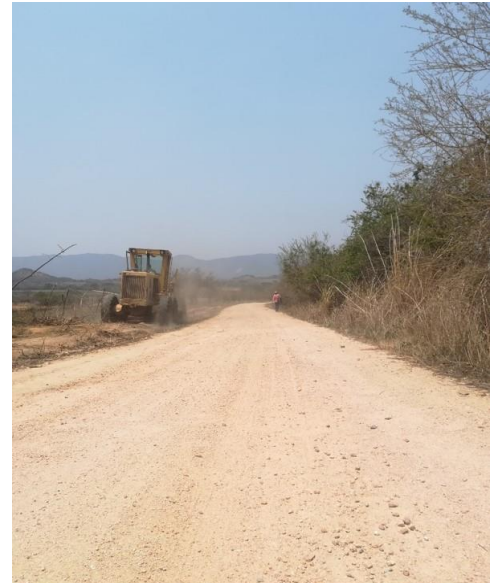



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**CHIAPA DE CORZO**  
2021-2024  
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col El Amate



**FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

**MUNICIPIO:** CHIAPA DE CORZO  
**LOCALIDAD:** COL. EL AMATE  
**NOMBRE DE LA OBRA:** REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1  
**PROGRAMA:** UR0000.- URBANIZACION  
**SUB-PROG:** UR0500.- CAMINOS RURALES

**Nº DE OBRA:** 23033

**Situación Financiera**

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$330,824.00	FISM	\$330,824.00	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$330,824.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$330,824.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

**Descripción de la Obra**

REHABILITACION DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

**Numero de Contrato**

MCC/DOPYDUM/FISM-OT-031/2023

**Número de Dictamen**

**Periodo de Ejecucion**

Fecha de inicio	
Programado real	01/03/2023
Termino	
	15/03/2023

**Avances**

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

**Fotografia Terminada**





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**CHIAPA DE CORZO**  
2021-2024  
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col El Refugio





**FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

**MUNICIPIO:** CHIAPA DE CORZO  
**LOCALIDAD:** COL. EL REFUGIO  
**NOMBRE DE LA OBRA:** REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1  
**PROGRAMA:** UR0000.- URBANIZACION  
**SUB-PROG:** UR0500.- CAMINOS RURALES

**Nº DE OBRA:** 23034

**Situación Financiera**

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$330,824.00	FISM	\$330,824.00	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$330,824.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$330,824.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

**Descripción de la Obra**

REHABILITACION DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

**Numero de Contrato**

MCC/DOPYDUM/FISM-OT-032/2023

**Número de Dictamen**

**Periodo de Ejecucion**

Fecha de inicio	
Programado real	01/03/2023
Termino	
	15/03/2023

**Avances**

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

**Fotografía Terminada**





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**CHIAPA DE CORZO**  
2021-2024  
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. Unión y Progreso



# FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)

## FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

**MUNICIPIO:** CHIAPA DE CORZO  
**LOCALIDAD:** COL. UNION Y PROGRESO  
**NOMBRE DE LA OBRA:** REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1  
**PROGRAMA:** UR0000.- URBANIZACION  
**SUB-PROG:** UR0500.- CAMINOS RURALES

**Nº DE OBRA:** 23035

### Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$330,824.00	FISM	\$330,824.00	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$330,824.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$330,824.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

**Descripción de la Obra**

REHABILITACION DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

**Numero de Contrato**

MCC/DOPyDUM/FISM-OT-033/2023

**Número de Dictamen**

**Periodo de Ejecucion**

Fecha de inicio	
Programado real	01/03/2023
Termino	15/03/2023

**Avances**

**Fisico: 100%**  
**Financiero: 100%**

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

**Fotografía Terminada**





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**CHIAPA DE CORZO**  
2021-2024  
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. Plan Chiapas



# FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)

## FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

**MUNICIPIO:** CHIAPA DE CORZO  
**LOCALIDAD:** COL. PLAN CHIAPAS  
**NOMBRE DE LA OBRA:** REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1  
**PROGRAMA:** UR0000.- URBANIZACION  
**SUB-PROG:** UR0500.- CAMINOS RURALES

**Nº DE OBRA:** 23036

### Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$330,824.00	FISM	\$330,824.00	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$330,824.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$330,824.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

**Descripción de la Obra**

REHABILITACION DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

**Numero de Contrato**

MCC/DOPYDUM/FISM-OT-034/2023

**Número de Dictamen**

**Periodo de Ejecucion**

Fecha de inicio	
Programado real	01/03/2023
Termino	15/03/2023

**Avances**

**Fisico: 100%**  
**Financiero: 100%**

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

**Fotografía Terminada**





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**CHIAPA DE CORZO**  
2021-2024  
GOBERNEMOS JUNTOS

**Obra:** Pavimentación de calles concreto mixto, ubicada en la Col. Plan Chiapas



**FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

**MUNICIPIO:** CHIAPA DE CORZO  
**LOCALIDAD:** COL. PLAN CHIAPAS  
**NOMBRE DE LA OBRA:** PAVIMENTACION DE CALLES CONCRETO MIXTO  
**PROGRAMA:** UR0000.- URBANIZACION  
**SUB-PROG:** UR2000.- PAVIMENTACIÓN

**Nº DE OBRA:** 23051

**Situación Financiera**

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$311,497.51	FISM	\$311,497.51	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$311,497.51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$311,497.51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

**Descripción de la Obra**

202.02 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACIONES, ACARREOS, 67 M3 DE MATERIAL DE BANCO, 55 M DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X45 CMS., 44 M2 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, 148.5 M2 DE ZAMPEADO DE PIEDRA BRAZA PARA HUELLAS DE PAVIMENTO, CORTE CON CORTADORA, APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES.

**Numero de Contrato**

MCC/DOPyDUM/FISM-OT-035/2023

**Número de Dictamen**

**Periodo de Ejecucion**

Fecha de Inicio	Fecha de Término
14/04/2023	28/04/2023
Programado real	
Termino	

**Avances**

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

**Fotografía Terminada**





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**CHIAPA DE CORZO**  
2021-2024  
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de red de drenaje sanitario, ubicada en la Cabecera Municipal (Barrio Covadonga)





**FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

**MUNICIPIO:** CHIAPA DE CORZO  
**LOCALIDAD:** CABECERA MUNICIPAL (BARRIO COVADONGA)  
**NOMBRE DE LA OBRA:** REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO  
**PROGRAMA:** AS0000.- AGUA Y SANEAMIENTO  
**SUB-PROG:** AS3200.- DRENAJE SANITARIO

**Nº DE OBRA:** 23061

**Situación Financiera**

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$308,009.00	FISM	\$308,009.00	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$308,009.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$308,009.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

**Descripción de la Obra**

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CONSISTENTE EN: LIMPIEZA Y TRAZO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN RED DE ATARJEAS, 8 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA PVC SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO, SILLETA DE 8" CON SALIDA DE 6" Y CODO DE PVC DE 6" Y REPOSICION DE CONCRETO EN CALLES.

**Numero de Contrato**

MCC/DOPyDUM/FISM-OT-036/2023

**Número de Dictamen**

**Periodo de Ejecucion**

Fecha de Inicio	Fecha de Término
14/04/2023	28/04/2023
Programado real	
Termino	

**Avances**

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

**Fotografía Terminada**





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**CHIAPA DE CORZO**  
2021-2024  
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de red de drenaje sanitario, ubicada en la Cabecera Municipal (Barrio Morelos)



# FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)

## FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

**MUNICIPIO:** CHIAPA DE CORZO  
**LOCALIDAD:** CABECERA MUNICIPAL (BARRIO MORELOS)  
**NOMBRE DE LA OBRA:** REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO  
**PROGRAMA:** AS0000.- AGUA Y SANEAMIENTO  
**SUB-PROG:** AS3200.- DRENAJE SANITARIO

**N° DE OBRA:** 23062

### Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$308,009.00	FISM	\$308,009.00	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$308,009.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$308,009.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

**Descripción de la Obra**

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CONSISTENTE EN: LIMPIEZA Y TRAZO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN RED DE ATARJEAS, 8 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA PVC SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO, SILLETA DE 8" CON SALIDA DE 6" Y CODO DE PVC DE 6" Y REPOSICION DE CONCRETO EN CALLES.

**Numero de Contrato**

MCC/DOPyDUM/FISM-0T-037/2023

**Número de Dictamen**

**Periodo de Ejecucion**

Fecha de Inicio	
Programado real	14/04/2023
Termino	28/04/2023

**Avances**

Fisico: 100%  
 Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

**Fotografia Terminada**





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**CHIAPA DE CORZO**  
2021-2024  
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de calles tramos aislados (bacheo), ubicada en la Col. Cahuare



# FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)

## FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

**MUNICIPIO:** CHIAPA DE CORZO  
**LOCALIDAD:** COL. CAHUARE  
**NOMBRE DE LA OBRA:** REHABILITACIÓN DE CALLES TRAMOS AISLADOS (BACHEO)  
**PROGRAMA:** UR0000.- URBANIZACION  
**SUB-PROG:** UR0900.- CALLE

**Nº DE OBRA:** 23063

### Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$327,329.70	FISM	\$327,329.70	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$327,329.70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$327,329.70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

**Descripción de la Obra**

REHABILITACIÓN DE CALLES TRAMOS AISLADOS (BACHEO), CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION, CORTE CON CORTADORA, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, ACARREOS, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL MEJORADO Y REPOSICION DE CONCRETO ASFALTICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

**Numero de Contrato**

MCC/DOPyDUM/FISM-OT-038/2023

**Número de Dictamen**

**Periodo de Ejecucion**

Fecha de Inicio	
Programado real	14/04/2023
Termino	28/04/2023

**Avances**

**Fisico: 100%**  
**Financiero: 100%**

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

**Fotografía Terminada**





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**CHIAPA DE CORZO**  
2021-2024  
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de calles tramos aislados (bacheo), ubicada en la Cabecera Municipal (Barrio Santa Elena)



# FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)

## FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

**MUNICIPIO:** CHIAPA DE CORZO  
**LOCALIDAD:** CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTA ELENA)  
**NOMBRE DE LA OBRA:** REHABILITACIÓN DE CALLES TRAMOS AISLADOS (BACHEO)  
**PROGRAMA:** UR0000.- URBANIZACION  
**SUB-PROG:** UR0900.- CALLE (OIR)

**Nº DE OBRA:** 23064

### Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$330,158.56	FISM	\$330,158.56	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$330,158.56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$330,158.56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

**Descripción de la Obra**

REHABILITACIÓN DE CALLES TRAMOS AISLADOS (BACHEO), CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION, CORTE CON CORTADORA, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, ACARREOS, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL MEJORADO Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR DE FC= 250 KG/CM2, ESTAMPADO EN CALLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

**Numero de Contrato**

MCC/DOPyDUM/FISM-OT-039/2023

**Número de Dictamen**

**Periodo de Ejecucion**

Fecha de inicio	
Programado real	14/04/2023
Termino	28/04/2023

**Avances**

**Fisico: 100%**  
**Financiero: 100%**

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

**Fotografia Terminada**





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**CHIAPA DE CORZO**  
2021-2024  
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Ampliación de red de drenaje sanitario, ubicada en la Cabecera Municipal (Col. Jardines Del Grijalva)





**FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

**MUNICIPIO:** CHIAPA DE CORZO  
**LOCALIDAD:** CABECERA MUNICIPAL (COL. JARDINES DEL GRIJALVA)  
**NOMBRE DE LA OBRA:** AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO  
**PROGRAMA:** AS0000.- AGUA Y SANEAMIENTO  
**SUB-PROG:** AS3200.- DRENAJE SANITARIO

**N° DE OBRA:** 23065

**Situación Financiera**

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$315,345.56	FISM	\$315,345.56	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$315,345.56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$315,345.56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

**Descripción de la Obra**

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CONSISTENTE EN: LIMPIEZA Y TRAZO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 10", POZO DE VISITA Y REPOSICION DE CONCRETO EN CALLES.

**Numero de Contrato**

MCC/DOPyDUM/FISM-0T-040/2023

**Número de Dictamen**

**Periodo de Ejecucion**

Fecha de Inicio	
Programado real	25/04/2023
Termino	
	09/05/2023

**Avances**

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

**Fotografia Terminada**





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**CHIAPA DE CORZO**  
2021-2024  
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Ampliación de red de agua potable, ubicada en la Cabecera Municipal (Col. Jardines Del Grijalva)



**FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

**MUNICIPIO:** CHIAPA DE CORZO  
**LOCALIDAD:** CABECERA MUNICIPAL (COL. JARDINES DEL GRIJALVA)  
**NOMBRE DE LA OBRA:** AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO  
**PROGRAMA:** AS0000.- AGUA Y SANEAMIENTO  
**SUB-PROG:** AS0900.- RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

**N° DE OBRA:** 23066

**Situación Financiera**

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$321,122.74	FISM	\$321,122.74	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$321,122.74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$321,122.74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

**Descripción de la Obra**

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: LIMPIEZA Y TRAZO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 2 1/2" DE DIAMETRO, RD-26 Y REPOSICION DE CONCRETO EN CALLES.

**Numero de Contrato**

MCC/DOPyDUM/FISM-0T-041/2023

**Número de Dictamen**

**Periodo de Ejecucion**

Fecha de Inicio	
Programado real	25/04/2023
Termino	
	09/05/2023

**Avances**

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

**Fotografia Terminada**





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**CHIAPA DE CORZO**  
2021-2024  
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de calles tramos aislados (bacheo), ubicada en la Cabecera Municipal (Barrio Covadonga)



**FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

**MUNICIPIO:** CHIAPA DE CORZO  
**LOCALIDAD:** CABECERA MUNICIPAL (BARRIO COVADONGA)  
**NOMBRE DE LA OBRA:** REHABILITACIÓN DE CALLES TRAMOS AISLADOS (BACHEO)  
**PROGRAMA:** UR0000.- URBANIZACION  
**SUB-PROG:** UR0900.- CALLE

**Nº DE OBRA:** 23067

**Situación Financiera**

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$307,623.23	FISM	\$307,623.23	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$307,623.23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$307,623.23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

**Descripción de la Obra**

REHABILITACIÓN DE CALLES (BACHEO), CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION, CORTE CON CORTADORA, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, ACARREOS, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL MEJORADO Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR DE FC= 250 KG/CM2, ESTAMPADO DE CONCRETO EN CALLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

**Numero de Contrato**

MCC/DOPyDUM/FISM-OT-042/2023

**Número de Dictamen**

**Periodo de Ejecucion**

Fecha de inicio	Programado real	Termino
08/05/2023		
		22/05/2023

**Avances**

Fisico: 100%  
 Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

**Fotografia Terminada**





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**CHIAPA DE CORZO**  
2021-2024  
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ **Obra:** Ampliación del sistema de bombeo, ubicada en la Col. Emiliano Zapata III



**FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

**MUNICIPIO:** CHIAPA DE CORZO  
**LOCALIDAD:** CABECERA MUNICIPAL (BARRIO COVADONGA)  
**NOMBRE DE LA OBRA:** AMPLIACION DEL SISTEMA DE BOMBEO  
**PROGRAMA:** AS0000.- AGUA Y SANEAMIENTO  
**SUB-PROG:** AS3100.- CARCAMO

**Nº DE OBRA:** 23080

**Situación Financiera**

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$311,103.23	FISM	\$311,103.23	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$311,103.23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$311,103.23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

**Descripción de la Obra**

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA VERTICAL TIPO SUMERGIBLE ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO MONOFASICO DE 10 HP A 220 VOLTS CON 2.00 METROS DE TUBERIA DE COLUMNA DE 2" DE DIAMETRO, CON CABLE TIPO SUBMARINO Y CABEZAL DE DESCARGA DE 2".

**Numero de Contrato**

MCC/DOPYDUM/FISM-OT-043/2023

**Número de Dictamen**

**Periodo de Ejecucion**

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
17/05/2023	31/05/2023
<b>Programado real</b>	
<b>Termino</b>	

**Avances**

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

**Fotografia Terminada**





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**CHIAPA DE CORZO**  
2021-2024  
GOBERNEMOS JUNTOS

**❑ Obra:** Rehabilitación del sistema de bombeo, ubicada en la Col. V. Carranza





**FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

**MUNICIPIO:** CHIAPA DE CORZO  
**LOCALIDAD:** COL. VENUSTIANO CARRANZA  
**NOMBRE DE LA OBRA:** REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO  
**PROGRAMA:** AS0000.- AGUA Y SANEAMIENTO  
**SUB-PROG:** AS3100.- CARCAMO

**Nº DE OBRA:** 23081

**Situación Financiera**

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$328,502.95	FISM	\$328,502.95	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$328,502.95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$328,502.95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

**Descripción de la Obra**

REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO CONSISTENTE EN: REPARACION DE CUERPO DE TAZONES ENCAMIZADOS DE BOMBAVERTICAL TIPO TURBINA MARCA BNJ MODELO 6AC DE 21 TAZONES, FLECHA DE AJUSTE DE 1" DIAMETRO X 2.72 MTS, CONJUNTO ESTOPERO DE 1", TUBO DE COLUMNA DE 4" DIAMETRO X 1.52 MTS. COMPLETO CON FLECHA Y PORTACHUMACERA.

**Numero de Contrato**

MCC/DOPYDUM/FISM-OT-043/2023

**Número de Dictamen**

**Periodo de Ejecucion**

Fecha de inicio	Fecha de termino
17/05/2023	31/05/2023
<b>Programado real</b>	
<b>Termino</b>	

**Avances**

**Fisico: 100%**  
**Financiero: 100%**

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

**Fotografia Terminada**





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**CHIAPA DE CORZO**  
2021-2024  
GOBERNEMOS JUNTOS

**Obra:** Pavimentación de calles con concreto hidráulico. (160 ml)

# REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: BANOBRAS-FAIS

Nombre de la obra: Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico

## AVANCE DE TRABAJOS: (COL. LAS MARGARITAS)

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, EXCAVACIONES, ACARREOS, MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS., CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10M CMS. DE ESPESOR, CORTE CON CORTADORA, ESTAMPADO DE CONCRETO PARA FORMACION DE CENEFAS, APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES.

## ANEXO

ANTES



DURANTE



OBRA TERMINADA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**CHIAPA DE CORZO**  
2021-2024  
GOBERNEMOS JUNTOS

**Obra:** Construcción de domo en cancha deportiva en COBACH N° 74

# REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: BANOBRAS-FAIS

Nombre de la obra: **CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DEPORTIVA EN COBACH No. 74.**

## AVANCE DE TRABAJOS: (COL. JULIÁN GRAJALES)

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN AREA DE DESPLANTE, EXCAVACIONES, RELLENOS, PLANTILLA DE CONCRETO DE 100 KG/CM2, CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, ACERO PARA REFUERZO, CIMBRAS, ESTRUCTURA METÁLICA, DE SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN. ANCLAS DE VARILLAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA ZINTRO 0-100, PLACA DE ACERO, CANALON DE LAMINA LISA GALVANIZADA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, LUMINARIO AUTOBALASTRADO, INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA.

## ANEXOS

ANTES

DURANTE



OBRA TERMINADA



Col. Julián Grajales



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**CHIAPA DE CORZO**  
2021-2024  
GOBERNEMOS JUNTOS

**Obra:** Construcción de andadores peatonales

# REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: BANOBRAS-FAIS

Nombre de la obra: Construcción De Andadores Peatonales.

## AVANCE DE TRABAJOS: (COL. LA UNIÓN EL CASTAÑO)

TRABAJOS DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN CALLES, EXCAVACIONES, ACARREOS, MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES GUARNICIÓN INVERTIDA CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS., APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES, BASE DE CONCRETO, POSTE DE FIERRO CONICO, LUMINARIA SOLAR.

ANTES



DURANTE



OBRA TERMINADA



Col. La Unión El Castaño



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**CHIAPA DE CORZO**  
2021-2024  
GOBERNEMOS JUNTOS

**Obra:** Pavimentación de calles con concreto hidráulico. (200 ml)



# REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: BANOBRAS-FAIS

Nombre de la obra: Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico

## AVANCE DE TRABAJOS: (COL. NUEVA PALESTINA)

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, EXCAVACIONES, ACARREOS, MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS., CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10M CMS. DE ESPESOR, CORTE CON CORTADORA, ESTAMPADO DE CONCRETO PARA FORMACION DE CENEFAS, APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES.

## ANEXO

ANTES



DURANTE



OBRA TERMINADA



Col. Nueva Palestina



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**CHIAPA DE CORZO**  
2021-2024  
GOBERNEMOS JUNTOS

**❑ Obra:** Pavimentación de calles con concreto hidráulico. (180 ml)

# REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: BANOBRAS-FAIS

Nombre de la obra: Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico

## AVANCE DE TRABAJOS: (COL. CANDILI)

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, EXCAVACIONES, ACARREOS, MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS., CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10M CMS. DE ESPESOR, CORTE CON CORTADORA, ESTAMPADO DE CONCRETO PARA FORMACION DE CENEFAS, APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES.

## ANEXO

ANTES



DURANTE



OBRA TERMINADA



Col. Candili



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**CHIAPA DE CORZO**  
2021-2024  
GOBERNEMOS JUNTOS

**Obra:** Pavimentación de calles con concreto hidráulico. (269 ml)

# REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: BANOBRAS-FAIS

Nombre de la obra: Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico

## AVANCE DE TRABAJOS: (COL. NARCISO MENDOZA)

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, EXCAVACIONES, ACARREOS, MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS., CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10M CMS. DE ESPESOR, CORTE CON CORTADORA, ESTAMPADO DE CONCRETO PARA FORMACION DE CENEFAS, APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES.

## ANEXO

ANTES



DURANTE



OBRA TERMINADA



Col. Narciso Mendoza



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**CHIAPA DE CORZO**  
2021-2024  
GOBERNEMOS JUNTOS

**❑ Obra:** Rehabilitación de la red de distribución de agua potable

# REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: BANOBRAS-FAIS

Nombre de la obra: Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable.

## AVANCE DE TRABAJOS: (COL. GALECIO NARCIA)

TRAZO Y NIVELACIÓN EN CALLES, RUPTURA DE PAVIMENTO, ACARREOS, EXCAVACIONES, DE PLANTILLA APISONADA CON PISÓN DE MANO, RELLENOS, CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, TOMAS DOMICILIARIAS, TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA, TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, PIEZAS ESPECIALES, ABRAZADERA PARA TOMAS DOMICILIARIAS, TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO, CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES.

## INICIO



# ANEXOS

DURANTE



OBRA TERMINADA



Col. Galecio Narcia





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**CHIAPA DE CORZO**  
2021-2024  
GOBERNEMOS JUNTOS

**Obra:** Construcción de puente vehicular  
(17.5 ml a - 4.4)

# ANEXOS

Ubicación: EL RECUERDO Programa: BANOBRAS-FAIS

Nombre de la obra: "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (17.5 ML A - 4.4) "

ANTES



DURANTE



EN PROCESO





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**CHIAPA DE CORZO**  
2021-2024  
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Modernización de camino e.c. con carpeta asfáltica (km 2+500 al 3+000)

# REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: BANOBRAS-FAIS

Nombre de la obra: Modernización De Camino Tipo "C" Con Carpeta Asfáltica De Km 2+500 Al 3+465 (1a. Etapa).

## AVANCE DE TRABAJOS: (COL. NUCATILI)

DESMONTE PARA DENSIDAD, DESPALME EN MATERIAL A, EXCAVACIONES, EXCAVACIONES DE PRÉSTAMOS COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE, PAGO DE RAGALIAS, ACARREOS, SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA TRITURADA, OPERACIÓN DE ACAMELLONAMIENTO, OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASES, PUENTE DE CONCRETO HIDRÁULICO, ZAMPAEADO DE MAMPOSTERIA, ACERO DE REFUERZO.

## ANEXOS

ANTES



DURANTE



OBRA TERMINADA



Col. Nucatili



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**CHIAPA DE CORZO**  
2021-2024  
GOBERNEMOS JUNTOS

**Obra:** Pavimentación de calles con concreto hidráulico. (190 ml)

# REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: BANOBRAS-FAIS

Nombre de la obra: Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico

## AVANCE DE TRABAJOS: (CAHUARE)

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, EXCAVACIONES, ACARREOS, MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS., CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10M CMS. DE ESPESOR, CORTE CON CORTADORA, ESTAMPADO DE CONCRETO PARA FORMACION DE CENEFAS, APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES.

## ANEXO

ANTES



DURANTE



OBRA TERMINADA



Cahuare



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**CHIAPA DE CORZO**  
2021-2024  
GOBERNEMOS JUNTOS

**❑ Obra:** Construcción de muros de contención y plataforma en jardín de niños León Felipe



# REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: BANOBRAS-FAIS

Nombre de la obra: Construcción De Muros De Contención Y Plataforma En Jardín De Niños León Felipe.

## AVANCE DE TRABAJOS: (COL. NANDAMBUA 1ª. SECCION)

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE, EXCAVACIONES, MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, SUMINISTRO DE MATERIAL TRITURADO DE 1 1/2", SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO EN PVC, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, RELLENOS, ACARREOS, MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO EN HIDROSANITARIA.

ANTES



DURANTE



OBRA TERMINADA



Col. Nandambua 1ª. Sección



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**CHIAPA DE CORZO**  
2021-2024  
GOBERNEMOS JUNTOS

**❑ Obra: Ampliación de puente vehicular en calle 5 de Febrero**

# REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: BANOBRAS-FAIS

Nombre de la obra: Ampliación De Puente Vehicular En Calle 5 De Febrero

## AVANCE DE TRABAJOS: (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN VICENTE)

EXCAVACIONES, RELLENOS, H DE BOMBEO, SOBRECARREROS DE MATERIALES, MATERIAL PARA DRENES DE MUROS CON PIEDRA DE PEPENA, TUBOS PARA DRENES DE 10 CMS. DE DIÁMETRO, CONCRETO HIDRÁULICO EN CUERPO DE ESTRIBOS, MOLDES PARA PUENTES EN ESTRIBOS, CONCRETO HIDRÁULICO EN CORONAS, MOLDES PARA PUENTES EN CORONAS, ACERO DE REFUERZO, APLANADO DE MURO, RECUBRIMIENTO DE PINTURA, ANCLAJE DE VARILLAS, ESTRUCTURAS, CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=250 KG/CM2 EN LOSAS Y BANQUETAS, DREN VERTICAL, TUBOS PARA DRENES DE 15 CMS. DE DIÁMETRO, JUNTAS DE DILATACIÓN, APROCHES, DEMOLICIONES, CONCRETO HIDRÁULICO EN PAVIMENTO Y BANQUETAS, DE MAMPOSTERIA, CONCRETO HIDRÁULICO EN MUROS, MOLDES PARA PUENTE EN MUROS, SEÑALAMIENTO.

ANTES



# ANEXOS

DURANTE



OBRA TERMINADA



Cabecera Municipal (Barrio San Vicente)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**CHIAPA DE CORZO**  
2021-2024  
GOBERNEMOS JUNTOS

**Obra:** Revestimiento de camino e.c.  
(km 0+000 al 6+386)

# REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: BANOBRAS-FAIS

Nombre de la obra: Revestimiento De Camino E.C. (Km 0+000 Al 6+386).

## AVANCE DE TRABAJOS: (BARRANCA HONDA)

RASTREO Y CONFIGURACIÓN DE CAMINOS CON MAQUINA MOTOCONFORMADORA, MATERIAL PARA REVESTIMIENTO, ACARREOS, EXCAVACIONES, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES.

ANTES



# ANEXOS

DURANTE



OBRA TERMINADA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**CHIAPA DE CORZO**  
2021-2024  
GOBERNEMOS JUNTOS

**Obra:** Pavimentación de calles con concreto hidráulico.



# REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: BANOBRAS-FAIS

Nombre de la obra: Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico

## AVANCE DE TRABAJOS: (COL. NICOLÁS BRAVO)

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, EXCAVACIONES, ACARREOS, MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS., CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10M CMS. DE ESPESOR, CORTE CON CORTADORA, ESTAMPADO DE CONCRETO PARA FORMACION DE CENEFAS, APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES.

## ANEXO

ANTES



DURANTE



OBRA TERMINADA



Col. Nicolás Bravo



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**CHIAPA DE CORZO**  
2021-2024  
GOBERNEMOS JUNTOS

**Obra:** Pavimentación de calles con concreto hidráulico (250 ml)

# REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: BANOBRAS-FAIS

Nombre de la obra: Pavimentación De Calles Con Concreto Mixto

## AVANCE DE TRABAJOS:

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN CALLES, EXCAVACIONES, MATERIAL MEDIDO COMPACTO, ACARREOS, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS. CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, CORTE CON CORTADORA, ZAMPEADO PARA PISO DE PIEDRA BRAZA, SEPARACIÓN DE JUNTA CONSTRUCTIVA, APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES, TRAZO Y NIVELACIÓN EN CALLES, MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, TUBERÍA DE POLIETILENO DE LATA DENSIDAD DE 13MM, TOMAS DOMICILIARIAS, CAJAS DE OPERACION DE VÁLVULAS



# ANEXOS



**Imagen 1. Col. Carrillo Puerto**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**CHIAPA DE CORZO**  
2021-2024  
GOBERNEMOS JUNTOS

**Obra:**                    **Revestimiento**                    **callejón**  
**nandambua**

# REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: BANOBRAS-FAIS


Nombre de la obra: Revestimiento De Camino E.C. (Km 0+000 Al 6+386).

**AVANCE DE TRABAJOS: (CALLEJON RIBERA NANDAMBUA)**

RASTREO Y CONFIGURACIÓN DE CAMINOS CON MAQUINA MOTOCONFORMADORA, MATERIAL PARA REVESTIMIENTO, ACARREOS.


## ANEXOS

INICIO

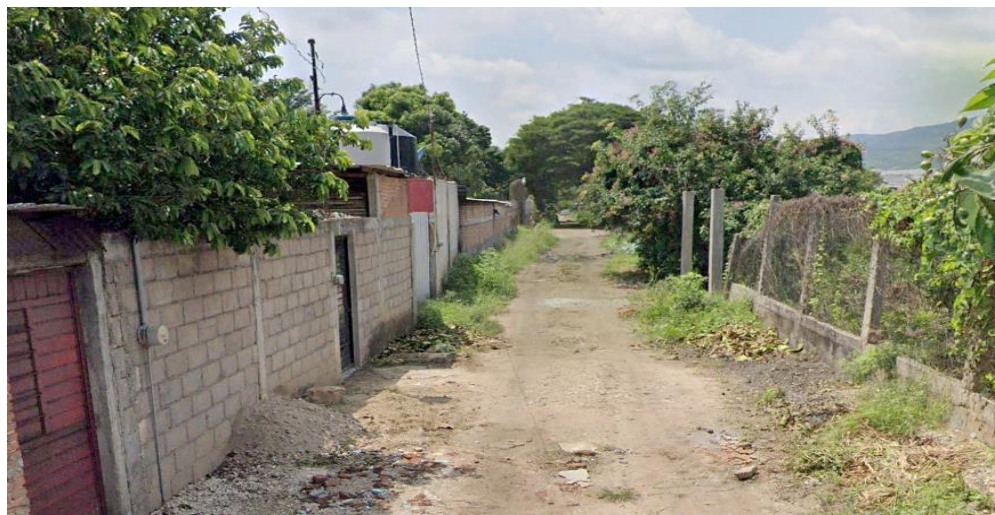

# ANEXOS

DURANTE

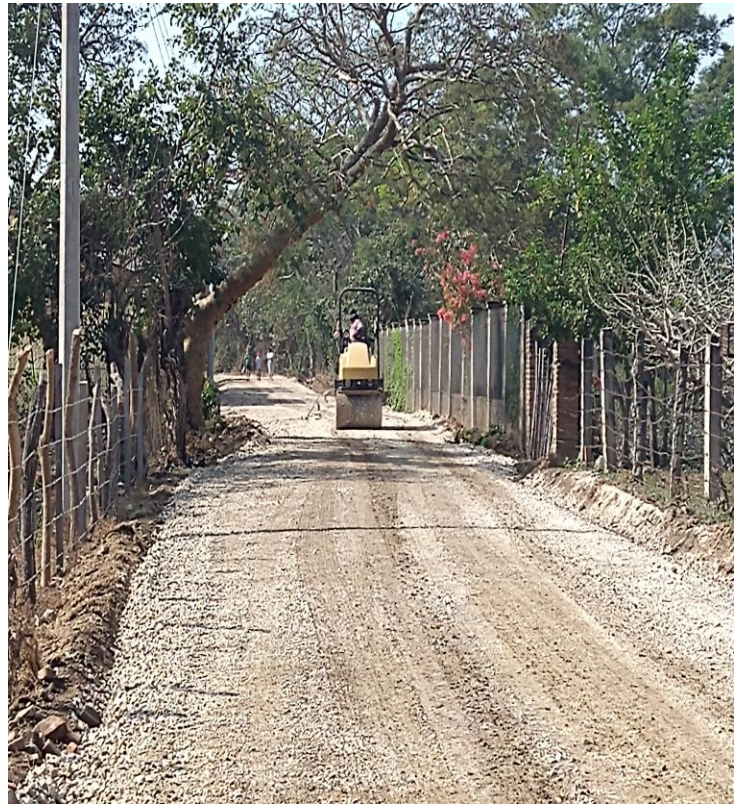

OBRA TERMINADA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**CHIAPA DE CORZO**  
2021-2024  
GOBERNEMOS JUNTOS

Honorable Ayuntamiento Constitucional de  
Chiapa de Corzo, Chiapas  
2021-2024

