

Informe anual de labores de obras del ejercicio 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

Honorable Ayuntamiento Constitucional de
Chiapa de Corzo, Chiapas
2021-2024

Obras del ejercicio 2023

Nombre de la obra	Localidad	Inversión	%
Construcción del sistema de agua potable a realizarse en la localidad de colonia San Joaquin 1	San Joaquin I	4,204,659.32	2.77
Pavimentación de calles con concreto hidráulico a realizarse en la localidad de "El Tejar"	El Tejar	2,596,775.56	1.71
Ampliación del centro de salud	Chiapa De Corzo	3,398,462.28	2.24
Revestimiento de camino rural	El Palmar	5,495,000.00	3.62
Revestimiento de camino rural	San Martin La Escalera	5,495,000.00	3.62
Ampliación de la red de energía eléctrica	El Horizonte	5,336,477.33	3.52
Rehabilitación de red de distribución y carcamo de bombeo	Distrito Federal	2,500,000.00	1.65
Construcción de domo y cancha de usos múltiples	Angel Albino Corzo	2,873,109.18	1.89
Construcción de domo en cancha multideportiva existente en espacio público	Chile Verde	2,943,581.93	1.94
Rehabilitación de red de distribución de agua potable (2da. etapa)	Galecio Narcía	2,347,585.15	1.55
Construcción de domo y cancha de usos múltiples	Nuevo Carmen Tonapac	2,862,073.06	1.89
Construcción de cancha de usos múltiples	San Jose Mujular	820,817.82	0.54
Construcción de red de distribución de agua entubada	Los Framboyanes 1	490,613.75	0.32
Rehabilitación de escuela telesecundaria no. 115 Benito Juárez García CCT 07ETV0310S	America Libre	1,662,424.88	1.10
Construcción de sistema sanitario	La Santina	792,507.96	0.52
Construcción de domo y cancha de usos múltiples	General Emiliano Zapata li	2,791,600.31	1.84
Construcción de línea de conducción y red de distribución de agua potable	Monte Rico	3,000,000.00	1.98
Pavimentación de calles con concreto hidráulico	Paso Achiote	3,924,649.03	2.59
Pavimentación de calles con concreto hidráulico	Emiliano Zapata I	2,076,761.82	1.37
Revestimiento de camino rural	Emiliano Zapata (Zapata Iii)	5,495,000.00	3.62
Pavimentación de calles con concreto hidráulico	Rivera El Ranchito	5,038,491.90	3.32
Pavimentación de calles con concreto hidráulico	Ignacio Allende	4,397,347.75	2.90
Construcción de red de distribución de agua entubada	Lomas Verdes	579,197.55	0.38

Obras del ejercicio 2023

Nombre de la obra	Localidad	Inversión	%
Construcción de barda perimetral en la escuela primaria niños héroes	Julio César Ruíz Ferro	1,085,924.89	0.72
Construcción de alcantarillado pluvial	El Palmar	369,538.09	0.24
Pavimentacion de calles con concreto mixto	Julio César Ruíz Ferro	1,273,532.11	0.84
Pavimentación de calles con concreto hidraulico	San Rafael	2,392,712.17	1.58
Pavimentacion de calle con concreto mixto	La Trituradora	1,606,548.39	1.06
Pavimentacion con concreto mixto	San Sebastián	2,018,021.84	1.33
Pavimentacion de calle con concreto mixto	El Manguito Yolna	2,239,926.43	1.48
Pavimentación de calles con concreto mixto	3 De Marzo	2,119,276.43	1.40
Construcción de tanque público de agua potable ubicado en la localidad de Nuevo Bochil	Nuevo Bochil	1,831,208.68	1.21
Construcción de tanque público de agua potable ubicado en la localidad de Vista Hermosa	Vista Hermosa	1,324,431.00	0.87
Construccion de tanque de rebombeo e instalacion de bomba tipo sumergible ubicado en la localidad de Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	4,639,767.73	3.06
Pavimentacion de calles con concreto hidraulico ubicado en la localidad de María Candelaria	María Candelaria	2,417,047.24	1.59
Construcción de sistema sanitario	San Francisco	3,267,129.33	2.15
Rehabilitacion de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. Francisco Sarabia	330,786.00	0.22
Rehabilitacion de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. Ignacio Allende	330,786.00	0.22
Rehabilitacion de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. Nicolas Bravo	330,786.00	0.22
Rehabilitacion de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. El Ranchito	330,786.00	0.22
Rehabilitacion de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. Julian Grajales	330,786.00	0.22
Rehabilitacion de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. La Escalera	330,786.00	0.22
Rehabilitacion de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. Salvador Urbina	330,786.00	0.22
Rehabilitacion de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. El Amatal	330,786.00	0.22
Rehabilitacion de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. Cupasmi	330,786.00	0.22
Rehabilitacion de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. Monte Rico	330,786.00	0.22

Obras del ejercicio 2023

Nombre de la obra	Localidad	Inversión	%
Rehabilitacion de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. Nva. Palestina	330,786.00	0.22
Rehabilitacion de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. Distrito Federal	330,786.00	0.22
Rehabilitacion de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. Galecio Narcia	330,786.00	0.22
Rehabilitacion de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. San Sebastian	330,786.00	0.22
Rehabilitacion de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. Las Tunas	330,786.00	0.22
Rehabilitacion de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. Nva Carmen Tonapac	330,786.00	0.22
Rehabilitacion de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. Playa Grande	330,786.00	0.22
Rehabilitacion de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. Juan De Grijalva	330,786.00	0.22
Rehabilitacion de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col Julio Cesar Ruiz Ferro	330,786.00	0.22
Rehabilitacion de camino rural (tramos aislados) etapa 1	La Santina	330,786.00	0.22
Rehabilitacion de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. Vista Hermosa	330,786.00	0.22
Rehabilitacion de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. Narciso Mendoza	330,786.00	0.22
Rehabilitacion de camino rural (tramos aislados) etapa 1	La Cadelaria	330,786.00	0.22
Rehabilitacion de camino rural (tramos aislados) etapa 1	El Turizal	330,786.00	0.22
Rehabilitacion de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Ribera Zaragoza	330,786.00	0.22
Rehabilitacion de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Topada De La Flor	330,824.00	0.22
Rehabilitacion de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Playa Grande	330,824.00	0.22
Rehabilitacion de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Cabecera Municipal (Camino Al Panteon)	330,824.00	0.22
Rehabilitacion de camino rural (tramos aislados) etapa 1	San Jose Mujular	330,824.00	0.22
Rehabilitacion de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. La Joya	330,824.00	0.22
Rehabilitacion de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col El Amate	330,824.00	0.22
Rehabilitacion de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col El Refugio	330,824.00	0.22
Rehabilitacion de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. Union Y Progreso	330,824.00	0.22

Obras del ejercicio 2023

Nombre de la obra	Localidad	Inversión	%
Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. Plan Chiapas	330,824.00	0.22
Pavimentación de calles concreto mixto	Col. Plan Chiapas	311,497.51	0.21
Rehabilitación de red de drenaje sanitario	Cabecera Municipal (Barrio Covadonga)	308,009.00	0.20
Rehabilitación de red de drenaje sanitario	Cabecera Municipal (Barrio Morelos)	308,009.00	0.20
Rehabilitación de calles tramos aislados (bacheo)	Col. Cahuare	327,329.70	0.22
Rehabilitación de calles tramos aislados (bacheo)	Cabecera Municipal (Barrio Santa Elena)	330,158.56	0.22
Ampliación de red de drenaje sanitario	Cabecera Municipal (Col. Jardines Del Grijalva)	315,345.56	0.21
Ampliación de red de agua potable	Cabecera Municipal (Col. Jardines Del Grijalva)	321,122.74	0.21
Rehabilitación de calles tramos aislados (bacheo)	Cabecera Municipal (Barrio Covadonga)	307,623.23	0.20
Ampliación del sistema de bombeo	Col. Emiliano Zapata Iii	311,103.23	0.21
Rehabilitación del sistema de bombeo	Col. V. Carranza	328,502.95	0.22
Pavimentación de calles con concreto hidráulico. (160 ml)	Margaritas	Pendiente	
Construcción de domo en cancha deportiva en cobach n° 74	Julian Grajales	Pendiente	
Construcción de andadores peatonales	La Union (El Castaño)	Pendiente	
Pavimentación de calles con concreto hidráulico. (200 ml)	Nueva Palestina	Pendiente	
Pavimentación de calles con concreto hidráulico. (180 ml)	Candili	Pendiente	
Pavimentación de calles con concreto hidráulico. (269 ml)	Narcizo Mendoza	Pendiente	
Rehabilitación de la red de distribución de agua potable	Galecio Narcia	Pendiente	
Construcción de puente vehicular (17.5 ml a - 4.4)	El Recuerdo	Pendiente	
Modernización de camino e.c. con carpeta asfáltica (KM 2+500 AL 3+000)	Nucatili	Pendiente	
Pavimentación de calles con concreto hidráulico. (190 ml)	Cahuare	Pendiente	
Construcción de muros de contención y plataforma en jardín de niños León Felipe	Nandambua 1A Sección	Pendiente	
Ampliación de puente vehicular en calle 5 de Febrero	Cabecera Municipal (Barrio San Vicente)	Pendiente	



Obras del ejercicio 2023

Nombre de la obra	Localidad	Inversión	%
Revestimiento de camino e.c. (km 0+000 al 6+386)	Barranca Honda	Pendiente	
Pavimentación de calles con concreto hidráulico.	Nicolas Bravo	Pendiente	
Pavimentación de calles con concreto hidráulico (250 ml)	Carrillo Puerto	Pendiente	
Revestimiento callejon nandambua	Nandambua 2A Seccion	Pendiente	
		Total	112,122,968.39
			73.92



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ Obra: Construcción del sistema de agua potable a realizarse en la localidad de colonia San Joaquín 1



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. SAN JOAQUIN 1
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
PROGRAMA: AS0000.- AGUA Y SANEAMIENTO
SUB-PROG: AS0900.- RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE

Nº DE OBRA: 23021

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$4,204,659.32	F.I.S.M.	\$3,963,993.72	F.I.S.M.	\$240,665.60
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$4,204,659.32	TOTAL	\$3,963,993.72	TOTAL	\$240,665.60

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

DEMOLICION DE APLANADOS, 40.89 M2 DE APLANADO DE MURO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, 65.82 M2 DE GUSANEADO SOBRE MUROS DE MAMPOSTERIA EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO, 2 PZA DE ESCALERA MARINA, VALVULA DE SECCIONAMIENTO, CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS, 39 M DE MALLA CICLON GALVANIZADA, 1 PZA DE PUERTA, EQUIPO DE CLORACION, 100 KG DE SUMINISTRO DE HIPOCLORITO, RED DE DISTRIBUCION, 5,695 M DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 75MM, 99 M DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO, ATRAQUES DE RED DE DISTRIBUCION, VALVULAS DE SECCIONAMIENTO, CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, 90 TOMAS DOMICILIARIAS, 450 M DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-001/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	Programado real	Termino
03/04/2023		01/06/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 94%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada



REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: Construcción del Sistema de Agua Potable


AVANCE DE TRABAJOS: (COL. SAN JOAQUIN I)

TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y CONEXIONES DE SALIDA DE TANQUE SUPERFICIAL, DESINSECCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN, TOMAS DOMICILIARIAS.

ANTES



DURANTE

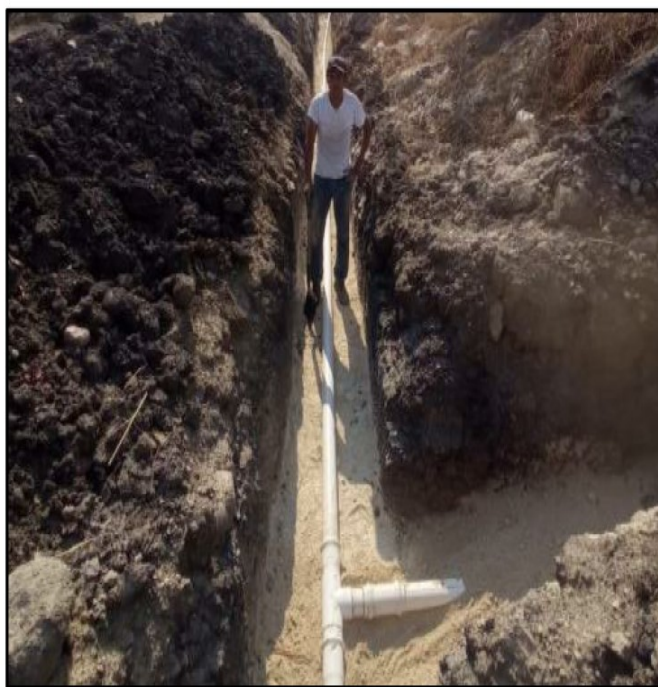

ANEXOS

OBRA TERMINADA



Col. San Joaquín I



- ❑ **Obra:** Pavimentación de calles con concreto hidráulico a realizarse en la localidad de “El Tejar”



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. EL TEJAR
NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR2000.- PAVIMENTACION

N° DE OBRA: 23038

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$2,596,775.56	F.I.S.M.	\$2,596,775.56	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$2,596,775.56	TOTAL	\$2,596,775.56	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

1,257.80 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACIONES, 525.15 M3 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO, 1,167.00 M2 DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, 227.00 M DE ESTAMPADO DE CONCRETO EN CALLES PARA FORMACION DE CENEFAS, CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO, SEPARACION DE JUNTA CONSTRUCTIVA, 454.00 M DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS., 454.00 M DE APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES, ACARREOS, VALVULA DE SECCIONAMIENTO, CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS, 227 M DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 50 MM DE DIAMETRO, 210 M DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM DE DIAMETRO.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-002/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
03/04/2023	01/06/2023

Avances

Fisico: 100%
 Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada



REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO

AVANCE DE TRABAJOS: (COL. EL TEJAR)

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, EXCAVACIONES, ACARREOS, MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS., CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10M CMS. DE ESPESOR, CORTE CON CORTADORA, ESTAMPADO DE CONCRETO PARA FORMACION DE CENEFAS, APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES.

ANEXOS

ANTES




ANEXOS

DURANTE



OBRA TERMINADA

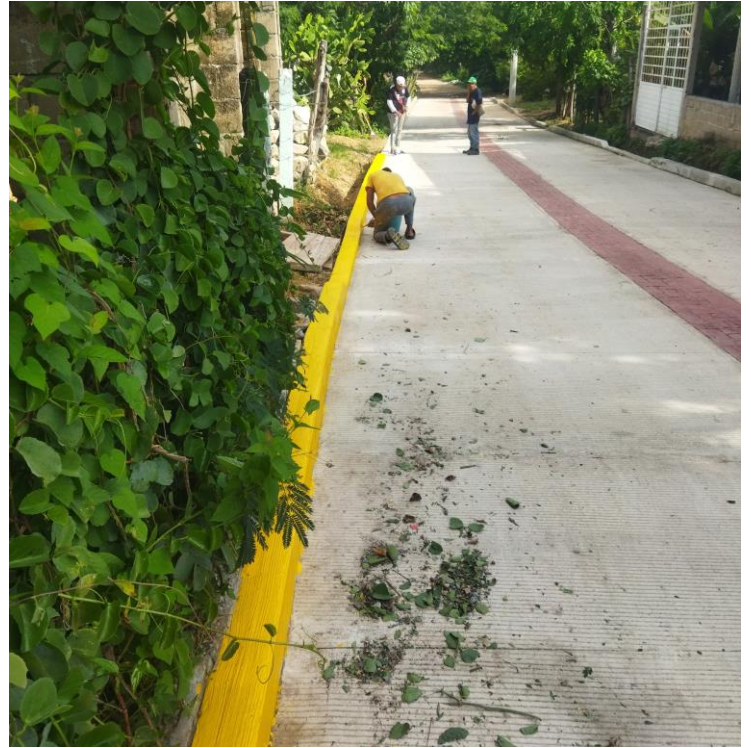

Col. El Tejar



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ **Obra:** Ampliación del centro de salud





FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN MIGUEL)
NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD
PROGRAMA: SA0000.- SALUD
SUB-PROG: SA0700.- CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS

Nº DE OBRA: 23049

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$3,398,462.28	F.I.S.M.	\$3,330,155.97	F.I.S.M.	\$68,306.31
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$3,398,462.28	TOTAL	\$3,330,155.97	TOTAL	\$68,306.31

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIONES, RELLENOS, MATERIAL DE BANCO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION, CIMBRA, CONCRETO PARA LOSAS Y TRABES, COLUMNAS, CADENAS Y CASTILLOS, MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR EN TABIQUE ROJO, APLANADO DE MURO, CANCELERIA, APLICACION DE PINTURA EN MUROS, APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA, FALSO PLAFOND, SEÑALIZACION, PISO DE ADOQUIN, INSTALACION SANITARIA, HIDRAULICA Y ELECTRICA.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-003/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
03/04/2023	01/07/2023
Programado real	
Termino	

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 98%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada



ANEXOS

Localidad: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD

ANTES



DURANTE



OBRA TERMINADA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ **Obra:** Revestimiento de camino rural,
ubicado en la colonia El Palmar



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. EL PALMAR
NOMBRE DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR2100.- REVESTIMIENTO

Nº DE OBRA: 23048

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$5,495,000.00	F.I.S.M.	\$5,435,206.43	F.I.S.M.	\$59,793.57
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$5,495,000.00	TOTAL	\$5,435,206.43	TOTAL	\$59,793.57

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

8.86 KM DE BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, 195.73 M3 DE DESPALME EN MATERIAL A, EXTRACCION DE MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS, 9,747 M3 DE OPERACIÓN DE TENDIDO Y COMPACTACION DE REVESTIMIENTO, AGUA UTILIZADA, ACARREOS DE AGUA, ACARREOS

Numero de Contrato

MCC/DOPYDUM/FISMUN-004/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
03/04/2023	01/06/2023
Programado real	
Termino	

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 99%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Revestimiento de camino rural, ubicado en la colonia San Martín La Escalera



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. SAN MARTIN (LA ESCALERA)
NOMBRE DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR2100.- REVESTIMIENTO

N° DE OBRA: 23047

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M	\$5,495,000.00	F.I.S.M	\$5,428,663.60	F.I.S.M.	\$66,336.40
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$5,495,000.00	TOTAL	\$5,428,663.60	TOTAL	\$66,336.40

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

8.86 KM DE BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, DESPALME EN MATERIAL A, EXTRACCION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES, 9,747 M3 DE OPERACIÓN DE TENDIDO Y COMPACTACION DE REVESTIMIENTO, AGUA UTILIZADA EN COMPACTACION, ACARREOS DEL AGUA, ACARREOS.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-005/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	Programado real	Termino
03/04/2023		
		01/06/2023

Avances

Fisico: 100%
 Financiero: 99%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ **Obra:** Ampliación de la red de energía eléctrica



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. EL HORIZONTE
NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA
PROGRAMA: VI0000.- VIVIENDA
SUB-PROG: VI1600.- ELECTRIFICACION

N° DE OBRA: 23039

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$5,336,477.33	F.I.S.M.	\$5,336,477.33	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$5,336,477.33	TOTAL	\$5,336,477.33	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

3 PZA DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-13-600 ARRASTRE, 1 PZA DE POSTE DE CONCRETO PC-13-600 C/G, 26 PZA DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750 C/G, 9 PZA DE POSTE DE CONCRETO PC-9-400 C/G, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION, 1 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUCHILLA TRIPLE DISPARO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVOS, RETENIDAS, 9 PZA DE TIERRA FISICA TIPO 1K, SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR, 600 M DE CABLE DE ALUMINIO TIPO NEUTRANES 2+1, 80 PZA DE CONECTOR DERIVADOR, 120 PZA DE ACOMETIDAS, EQUIPO DE MEDICION, 8 PZA DE FORO ANTIFAUNA, 8 PZA DE PUENTES EN ESTRUCTURAS, 95 PZA DE DESMANTELAMIENTO DE ACOMETIDAS, REUBICACION DE ACOMETIDAS, DESMANTELAMIENTO DE POSTES DE CONCRETO, DESMANTELAMIENTO DE TRANSFORMADOR, TRAMITES ANTE C.F.E.

Numero de Contrato

MCC/DOPYDUM/FISMUN-006/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	Fecha de termino
17/04/2023	15/06/2023
Programado real	
Termino	

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografia Terminada



ANEXOS

Ubicación: EL HORIZONTE

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA


ANTES



DURANTE



OBRA TERMINADA

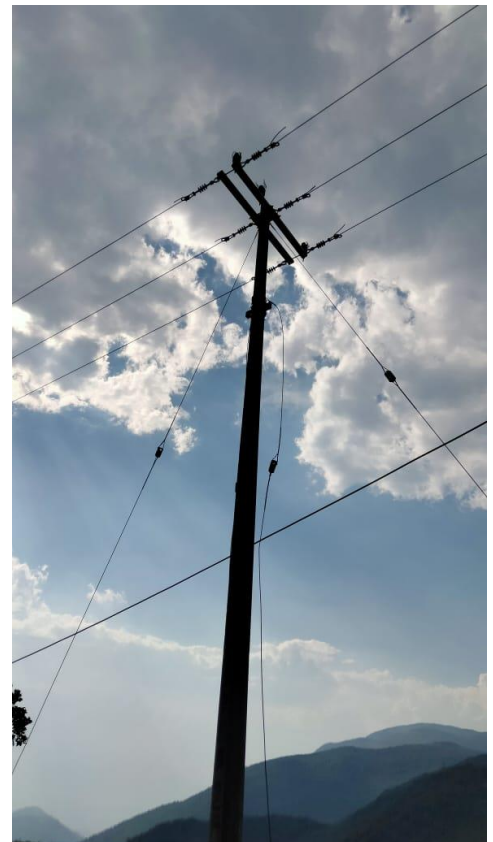



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ **Obra:** Rehabilitación de red de distribución y cárcamo de bombeo



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. DISTRITO FEDERAL
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION Y CARCAMO DE BOMBEO
PROGRAMA: AS0000.- AGUA Y SANEAMIENTO
SUB-PROG: AS0900.- RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE

N° DE OBRA: 23040

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$2,500,000.00	F.I.S.M.	\$2,500,000.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$2,500,000.00	TOTAL	\$2,500,000.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO CON BOMBA SUMERGIBLE, CAJAS DE OPERACIÓN, 11.29 M2 DE MURO DE 15CMS. DE ESPESOR DE BLOCK HUECO, APLANADOS DE MUROS, REFUERZO DE ACERO, INSTALACION ELECTRICA, RED DE DISTRIBUCION, 2.385 M DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 50MM EN RED DE AGUA POTABLE, 1.522 M DE DESMANTELAMIENTO DE TUBERIA DE PVC, CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, VALVULAS DE SECCIONAMIENTO, 278 Tomas DOMICILIARIAS, 2,780 M DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, CONSTRUCCION DE HIDRANTE PUBLICO.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-007/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
19/04/2023	17/06/2023
Programado real	
Termino	

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada



REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: Rehabilitación de red de distribución y cárcamo de bombeo

AVANCE DE TRABAJOS: (COL. DISTRITO FEDERAL)

TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO, CAJA DE OPERACIÓN, REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, ASI COMO REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS.

ANEXOS

INICIO



ANEXOS

DURANTE



OBRA TERMINADA



Col. Distrito Federal



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ Obra: Construcción de domo y cancha de usos múltiples



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. ANGEL ALBINO CORZO
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR1000.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Nº DE OBRA: 23044

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$2,873,109.18	F.I.S.M.	\$1,792,328.06	F.I.S.M.	\$1,080,781.12
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$2,873,109.18	TOTAL	\$1,792,328.06	TOTAL	\$1,080,781.12

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

592 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE CANCHA, EXCAVACIONES, RELLENO DE EXCAVACIONES, ACARREOS, CIMENTACION, 1.733 KG DE SUMINSTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE COLUMNA METALICA TUBO DE ACERO CED. 40, ESTRUCTURA METALICA, PERFIL MONTEN, 96 PZA DE ANCLA DE VARILLA, TENSOSES, 599 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO R72 CAL. 26, 65 M DE CANALON DE LAMINA LISA, INSTALACION ELECTRICA, 15 PZA DE LUMINARIA LED, INSTALACION PLUVIAL, ACABADOS, 102 M DE MALLA CICLONICA, PUERTA ABATIBLE, 540 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, 54 M3 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION, 540 M2 DE REFUERZO DE MALLA LAC, 451 M2 DE APLICACION DE PINTURA, 2 PZA DE BASE DE PORTERIA.

Numero de Contrato

MCC/DOPYDUM/FISMUN-008/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	Fecha de termino
17/04/2023	30/06/2023
Programado real	
Termino	

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 62%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada



ANEXOS

Ubicación: ANGEL ALBINO CORZO

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

=====

OBRA TERMINADA





- ❑ **Obra:** Construcción de domo en cancha multideportiva existente en espacio público



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. CHILE VERDE
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA MULTIDEPORTIVA EXISTENTE EN ESPACIO PÚBLICO
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR1000.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Nº DE OBRA: 23046

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$2,943,581.93	F.I.S.M.	\$2,333,224.11	F.I.S.M.	\$610,357.82
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$2,943,581.93	TOTAL	\$2,333,224.11	TOTAL	\$610,357.82

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

592 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE CANCHA, EXCAVACIONES, RELLENO DE EXCAVACIONES, ACARREOS, CIMENTACION, 1,733 KG DE SUMINSTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE COLUMNA METALICA TUBO DE ACERO CED. 40, ESTRUCTURA METALICA, PERFIL MONTEN, 96 PZA DE ANCLA DE VARILLA, TENSOSES, 599 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO R72 CAL. 26, 65 M DE CANALON DE LAMINA LISA, INSTALACION ELECTRICA, 15 PZA DE LUMINARIA LED, INSTALACION PLUVIAL, ACABADOS, 102 M DE MALLA CICLONICA, PUERTA ABATIBLE, 540 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, 54 M3 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION, 540 M2 DE REFUERZO DE MALLA LAC, 451 M2 DE APLICACION DE PINTURA, 2 PZA DE BASE DE PORTERIA.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-009/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	Fecha de termino
17/04/2023	
	15/06/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 92%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada



ANEXOS

Ubicación: CHILE VERDE

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA MULTIDEPORTIVA EXISTENTE EN ESPACIO PÚBLICO

ANTES



DURANTE



OBRA TERMINADA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ **Obra:** Rehabilitación de red de distribución de agua potable (2da. etapa)



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. GALECIO NARCIA
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA)
PROGRAMA: AS0000.- AGUA Y SANEAMIENTO
SUB-PROG: AS0905.- REHABILITACION

N° DE OBRA: 23050

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M	\$2,347,585.15	F.I.S.M	\$2,347,585.15	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$2,347,585.15	TOTAL	\$2,347,585.15	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

1,030 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACIONES, RELLENOS, 157 M3 DE PLANTILLA DE MATERIAL MEJORADO PARA RECIBIR TUBERIA, 727 M DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 250 MM DE DIAMETRO, 302 M DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 300 MM DE DIAMETRO, POZOS DE VISITA, ACARREOS, 26 PZA DE BROCALES PARA POZOS DE VISITA, DESCARGAS DOMICILIARIAS: 162 M2 DE TRAZO Y NIVELACION DE CALLES, EXCAVACIONES, ACARREOS, RELLENOS, 272 M DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 160MM DE DIAMETRO, 41 PZA DE SILLETAS DE PVC SANITARIO, 41 PZA DE REGISTROS, REPOSICION DE CARPETA.

Numero de Contrato

MCC/DOPYDUM/FISMUN-010/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
17/04/2023	15/06/2023

Avances

Fisico: 100%
 Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada



ANEXOS

Ubicación: GALECIO NARCÍA

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA)

=====

ANTES



OBRA DURANTE





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ **Obra:** Construcción de domo y cancha de usos múltiples



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. NUEVO CARMEN TONAPAC
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR1000.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Nº DE OBRA: 23052

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$2,862,073.06	F.I.S.M.	\$2,862,073.06	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$2,862,073.06	TOTAL	\$2,862,073.06	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE DESPLANTE, EXCAVACIONES, RELLENOS, CIMENTACION, ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, ANCLAS DE VARILLA LISA, LAMINA ZINTRO R-72 CAL. 26, INSTALACION ELECTRICA, LUMINARIA, PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE, 2 PZA DE BASE DE PORTERIA EN CANCHA DE BASQUETBOL.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-011/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
17/04/2023	30/06/2023

Avances

Fisico: 100%
 Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografía Terminada



ANEXOS

Ubicación: NUEVO CARMEN TONAPAC Programa: FISMUN

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

ANTES



DURANTE



OBRA TERMINADA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ Obra: Construcción de cancha de usos múltiples



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. SAN JOSE MUJULAR
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR1000.-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Nº DE OBRA: 23053

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M	\$820,817.82	F.I.S.M	\$820,817.82	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$820,817.82	TOTAL	\$820,817.82	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

576 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN CANCHA, EXCAVACIONES, RELLENO DE EXCAVACIONES, PLANTILLA DE CONCRETO, CONCRETO EN CIMENTACION, ACERO DE REFUERZO, 36.92 M2 DE MURETE DE ENRASE, 579.95 M2 DE PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, REFUERZO DE MALLA LAC 6-6/10-10, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, 2 PZA DE BASE DE PORTERIA, TUBO NEGRO DE 63MM PARA CANCHA DE VOLEIBOL, INSTALACION ELECTRICA, MURO DE ACOMETIDA, 4 PZA DE LUMINARIA PARA CANCHA, ACARREOS.

Numero de Contrato

MCC/DOPYDUM/FISMUN-012/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	Fecha de termino
24/04/2023	22/06/2023
Programado real	
Termino	

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada



REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas. Programa: FISMUN

Nombre de la obra: Construcción de cancha de usos múltiples

AVANCE DE TRABAJOS: (COL. SAN JOSÉ MUJULAR)

TRABAJOS DE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION EN ÁREA DE DESPLANTE, CONCRETO $F'c= 200$ KG/CM², SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PORTERIA, INSTALACIÓN ELECTRICA.

ANTES




ANEXOS

DURANTE



OBRA TERMINADA

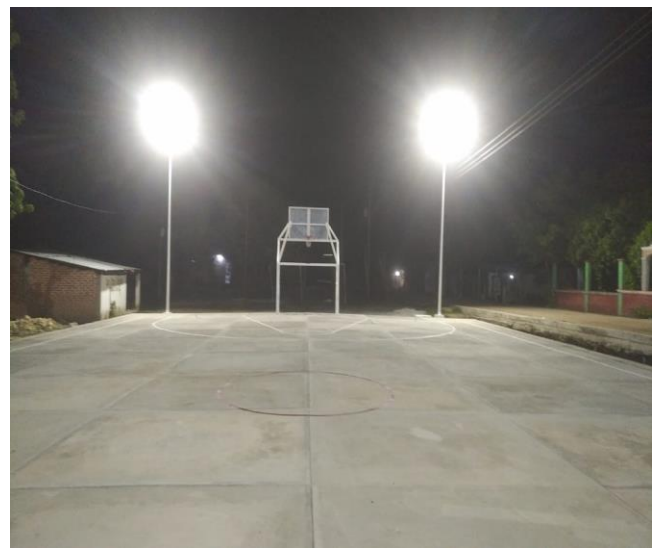

Col. San José Mujular



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

Obra: Construcción de red de distribución de agua entubada



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. LOS FRAMBOYANES I
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA
PROGRAMA: AS0000.- AGUA Y SANEAMIENTO
SUB-PROG: AS0900.-RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE

Nº DE OBRA: 23088

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$490,613.75	F.I.S.M.	\$268,693.72	F.I.S.M.	\$221,920.03
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$490,613.75	TOTAL	\$268,693.72	TOTAL	\$221,920.03

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

SISTEMA DE DESINFECCION: CAJAS PARA OPERACIÓN DE VALVULAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION CON HIPOCLORITO DE CALCIO, RED DE DISTRIBUCION: 987.20 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, CAJAS PARA OPERACIÓN DE VALVULAS, VALVULA DE COMPUERTA, 987.20 M DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 50MM, PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACIONES, 54.30 M3 DE PLANTILLA APISONADA, RELLENO, TOMAS DOMICILIARIAS: 235 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACIONES, RELLENOS, 47 TOMAS DOMICILIARIAS, 235 M DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM.

Numero de Contrato

MCC/DOPYDUM/FISMUN-013/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Término
17/04/2023	15/06/2023
Programado real	
Termino	

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 55%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada



ANEXOS

Ubicación: LOS FRAMBOYANES 1

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA

=====

ANTES



DURANTE





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ **Obra:** Rehabilitación de escuela telesecundaria no. 115 Benito Juárez García CCT 07ETV0310S



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. AMERICA LIBRE
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ESCUELA TELESECUNDARIA No. 115 BENITO JUÁREZ GARCÍA CCT: 07ETV0310S
PROGRAMA: ED0000.- EDUCACION
SUB-PROG: ED1900.- MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Nº DE OBRA: 23055

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$1,662,424.88	F.I.S.M.	\$1,662,424.88	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$1,662,424.88	TOTAL	\$1,662,424.88	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICIONES, ACARREOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN MUROS, REHABILITACION DEL ASTA DE BANDERA, IMPERMEABILIZANTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON, REHABILITACION DE PORTERIA, JARDINERIAS, TECHADO: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, RELLENOS, ACARREOS, PLANTILLA DE CONCRETO, ACERO PARA REFUERZO, SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION HIDRAULICA.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-014/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	Fecha de termino
24/04/2023	22/06/2023
Programado real	
Termino	

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada



capturada en moto g⁺ plus

12 de mayo de 2023 6:34 p. m.

REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: FISMUN


Nombre de la obra: Rehabilitación de Escuela Telesecundaria No. 115 Benito Juárez García CCT 07ETV0310S

AVANCE DE TRABAJOS: (COL. AMERICA LIBRE)


TRABAJOS DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICIONES, ACARREOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN MUROS, REHABILITACION DEL ASTA DE BANDERA, IMPERMEABILIZANTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON, REHABILITACION DE PORTERIA, JARDINERIAS, TECHADO: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, RELLENOS, ACARREOS, PLANTILLA DE CONCRETO, ACERO PARA REFUERZO, SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION HIDRAULICA.

ANEXOS

ANTES

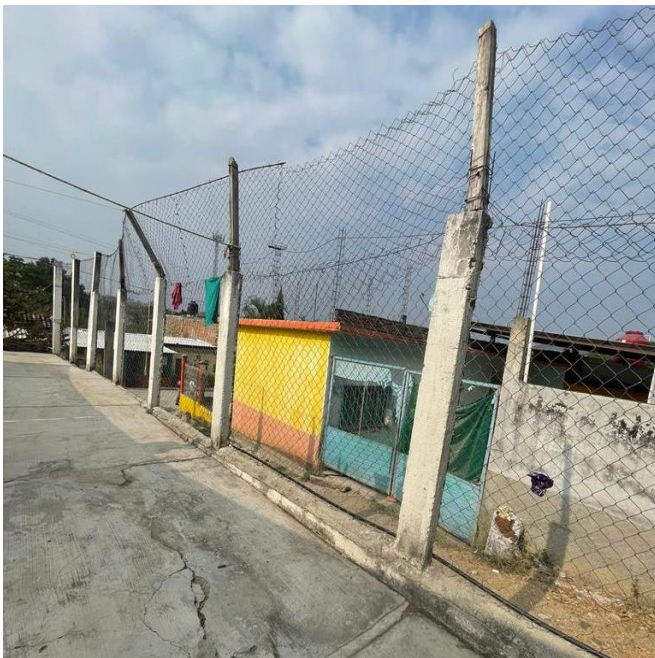

DURANTE

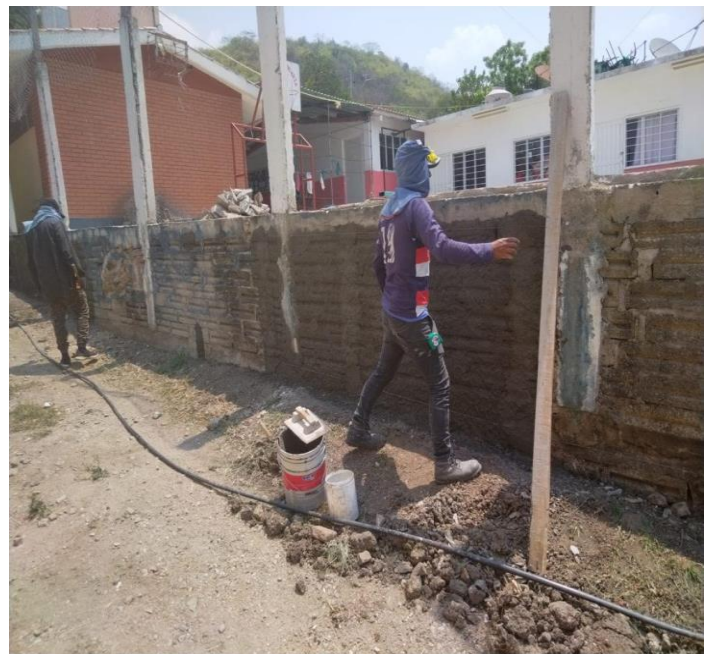

ANEXOS

OBRA TERMINADA



Col. América Libre



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

Obra: Construcción de sistema sanitario



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. LA SANTINA
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA SANITARIO
PROGRAMA: AS0000.- AGUA Y SANEAMIENTO
SUB-PROG: AS1100.- DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO

Nº DE OBRA: 23085

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$792,507.96	F.I.S.M.	\$792,507.96	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$792,507.96	TOTAL	\$792,507.96	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

198 M2 DE TRAZO Y NIVELACION DE CALLES, EXCAVACIONES, 81 M3 DE RELLENO EN ZANJAS PRODUCTO DE LA EXCAVACION, 188 M3 DE RELLENO DE MATERIAL DE BANCO, 26 M3 DE PLANTILLA PARA RECIBIR TUBERIA, 198.50 M DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 250 MM, POZOS DE VISITA, ACARREOS, DESCARGAS DOMICILIARIAS: 46 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREOS, 78 M DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160MM, 13 PZA DE REGISTROS.

Numero de Contrato

MCC/DOPYDUM/FISMUN-015/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	Programado real	Termino
24/04/2023		
		22/06/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografía Terminada



ANEXOS

Ubicación: LA SANTINA Programa: FISMUN


Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA SANITARIO

=====

ANTES



DURANTE

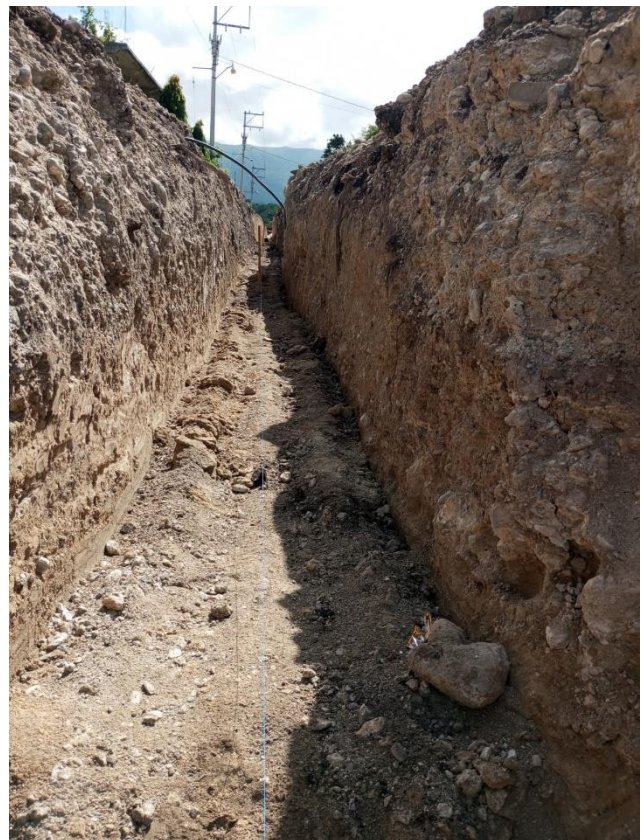

ANEXOS

Ubicación: LA SANTINA

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA SANITARIO

DURANTE



OBRA TERMINADA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

Obra: Construcción de domo y cancha de usos múltiples



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. GENERAL EMILIANO ZAPATA II
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR1000.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Nº DE OBRA: 23041

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$2,791,600.31	F.I.S.M.	\$2,791,600.31	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$2,791,600.31	TOTAL	\$2,791,600.31	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE DESPLANTE, EXCAVACIONES, RELLENOS, CIMENTACION, ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, ANCLAS DE VARILLA LISA, LAMINA ZINTRO R-72 CAL. 26, INSTALACION ELECTRICA, LUMINARIA, PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE, 2 PZA DE BASE DE PORTERIA EN CANCHA DE BASQUETBOL.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-016/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	
Programado real	17/04/2023
Termino	30/06/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografía Terminada



ANEXOS

Ubicación: GENERAL EMILIANO ZAPATA II


Programa: FISMUN

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

ANTES



DURANTE

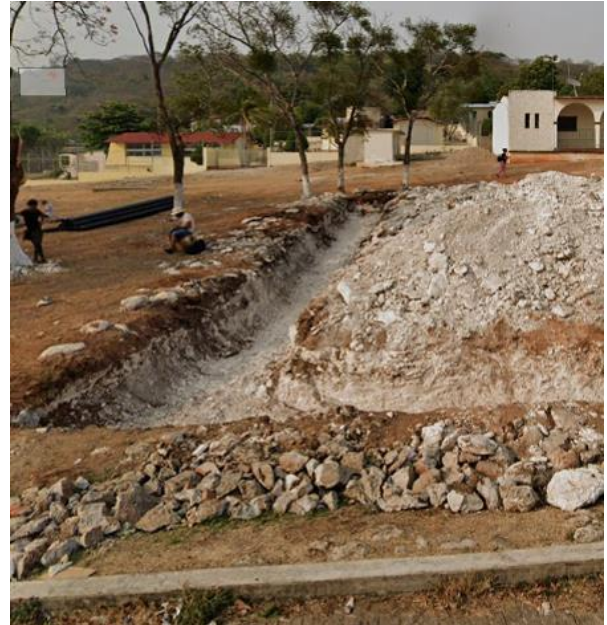

OBRA TERMINADA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ Obra: Construcción de línea de conducción y red de distribución de agua potable



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: RIBERA DE MONTE RICO
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
PROGRAMA: AS0000.- AGUA Y SANEAMIENTO
SUB-PROG: AS2100.- LINEAS DE CONDUCCION

N° DE OBRA: 23054

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$3,000,000.00	F.I.S.M.	\$2,907,953.54	F.I.S.M.	\$92,046.46
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$3,000,000.00	TOTAL	\$2,907,953.54	TOTAL	\$92,046.46

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, CONSISTENTES EN: TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, ACARREOS, EXCAVACIONES, RELLENOS, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REHABILITACIÓN EN CAJAS DE OPERACIÓN DE VALVULAS, TENDIDO DE TUBERÍA DE PVC DE DIFERENTES DIAMETROS, PIEZAS ESPECIALES Y REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO EJECUTIVO DEL CONTRATO.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-017/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	
Programado real	24/04/2023
Termino	07/07/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 97%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada



REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

AVANCE DE TRABAJOS: (COL. MONTE RICO)

LÍNEA DE CONDUCCIÓN, DE SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 3", ATRAQUES, VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION, VALVULA DE COMPUERTA, MALLA CICLON, CONSTRUCCION DE CARCAMO DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, INSTALACION DE ESCALERA MARINA, BOMBEO DE ACHIQUE, MURO DE ACOMETIDA, TREN DE DESCARGA, EQUIPO ELECTROMECHANICO, BOMBA TIPO SUMERGIBLE, EQUIPO DE CLORACION CON HIPOCLORITO, DEMOLICION DE TANQUE SUPERFICIAL, MURO DE MAMPOSTERIA, RED DE DISTRIBUCION CON DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 100MM, TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO.

ANEXOS

ANTES



ANEXOS

DURANTE



OBRA TERMINADA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ **Obra:** Pavimentación de calles con concreto hidráulico, Ubicado en la localidad de Paso Achiote



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. PASO ACHIOTE
NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR2000.- PAVIMENTACION

N° DE OBRA: 23069

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$3,924,649.03	F.I.S.M.	\$3,924,649.03	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$3,924,649.03	TOTAL	\$3,924,649.03	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

2,190 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACIONES, ACARREOS, 547 M3 DE RELLENO DE EXCAVACIONES, 936 M3 DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, 593 M DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X45 CMS., 2,100 M2 DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, 300 M DE ESTAMPADO DE CONCRETO EN CALLES PARA FORMACION DE CENEFA DE 50 CMS. DE ANCHO, 53 M3 DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO, SEPARACION DE JUNTA CONSTRUCTIVA, APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN GUARNICIONES, 140 M DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, 112 M DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 25MM, 112 M DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CEMENTAR DE 25MM, TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 50MM, 29 TOMAS DOMICILIARIAS, 14 PZA DE REGISTROS.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-018/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
02/05/2023	30/06/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada



REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO

AVANCE DE TRABAJOS: (COL. PASO ACHIOTE)

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, EXCAVACIONES, ACARREOS, MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS., CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10M CMS. DE ESPESOR, CORTE CON CORTADORA, ESTAMPADO DE CONCRETO PARA FORMACION DE CENEFAS, APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES.

ANEXOS

ANTES



ANEXOS

DURANTE



OBRA TERMINADA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ **Obra:** Pavimentación de calles con concreto hidráulico, Ubicado en la localidad de Emiliano Zapata I



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. EMILIANO ZAPATA I
NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR2000.- PAVIMENTACION

N° DE OBRA: 23068

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$2,076,761.82	F.I.S.M.	\$2,076,761.82	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$2,076,761.82	TOTAL	\$2,076,761.82	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

1,569 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACIONES, 362 M3 DE RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, 252.50 M DE ESTAMPADO DE CONCRETO EN CALLES PARA FORMACION DE CENEFAS DE 50 CM. DE ANCHO, ACARREOS, 1,479 M2 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, 493 M DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X45 CMS., APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA EN GUARNICIONES, 64 M DE SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLIETILENO DE 13MM DE DIAMETRO.

Numero de Contrato

MCC/DOPYDUM/FISMUN-019/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
02/05/2023	30/06/2023

Avances

Fisico: 100%
 Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada



REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: Pavimentación de calles con concreto hidráulico

AVANCE DE TRABAJOS: (COL. EMILIANO ZAPATA I)

TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, REHABILITACION DE DRENAJE, REHABILITACION DE AGUA ENTUBADA, CONCRETO F' c=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, ESTAMPADO DE CONCRETO PARA FORMACION DE CENEFA, CONCRETO F' c=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES, APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES, ALCANTARILLADO PLUVIAL.

ANEXOS

ANTES



ANEXOS

DURANTE



OBRA TERMINADA



Col. Emiliano Zapata I



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ **Obra:** Revestimiento de camino rural





FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. EMILIANO ZAPATA
NOMBRE DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR2100.- REVESTIMIENTO

Nº DE OBRA: 23072

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M	\$5,495,000.00	F.I.S.M	\$5,495,000.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$5,495,000.00	TOTAL	\$5,495,000.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

6.00 KM DE RASTREO Y CONFIGURACION DE CAMINOS CON MAQUINA MOTOCOMFORMADORA, 6.00 KM DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO, ACARREOS, EXCAVACIONES.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-020/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
08/05/2023	06/07/2023
Programado real	
Termino	

Avances

Fisico: 100%
Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ **Obra:** Pavimentación de calles con concreto hidráulico, Ubicado en la localidad de Rivera El Ranchito



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. EL RANCHITO
NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR2000.- PAVIMENTACION

N° DE OBRA: 23071

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M	\$5,038,491.90	F.I.S.M	\$4,971,095.89	F.I.S.M.	\$67,396.01
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$5,038,491.90	TOTAL	\$4,971,095.89	TOTAL	\$67,396.01

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

2,590 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACIONES, 1,165.50 M3 DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, ACARREOS, 700 M DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 CON SECCION DE 15X20X40 CMS., 1,225 M2, 612.50 M2 Y 612.50 M2 DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, 1,169 M2 DE CORTE CON CORTADORA, APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES, 350 ML DE ESTAMPADO DE CONCRETO EN CALLES PARA FORMACION DE CENEFAS, 350 M DE SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO HIDRAULICO DE PVC, CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, VALVULA DE SECCIONAMIENTO, 180 M DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, 36 TOMAS DOMICILIARIAS.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-021/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	
Programado real	08/05/2023
Termino	06/07/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 99%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ **Obra:** Pavimentación de calles con concreto hidráulico, Ubicado en la localidad de Ignacio Allende



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. IGNACIO ALLENDE
NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR2000.- PAVIMENTACION

N° DE OBRA: 23073

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$4,397,347.75	F.I.S.M.	\$4,351,141.23	F.I.S.M.	\$46,206.52
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$4,397,347.75	TOTAL	\$4,351,141.23	TOTAL	\$46,206.52

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

2,268 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACIONES, 1,065.60 M3 DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, ACARREOS, 640 M DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS., 2,240 M2 DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, 1,000 M DE CORTE CORTADORA, APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES, 320 M DE ESTAMPADO DE CONCRETO EN CALLES PARA FORMACION DE CENEFAS, 300 M DE SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO HIDRAULICO DE PVC, CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, VALVULA DE SECCIONAMIENTO, 180 M DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, 36 TOMAS DOMICILIARIAS

Numero de Contrato

MCC/DOPYDUM/FISMUN-022/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Término
08/05/2023	06/07/2023
Programado real	
Termino	

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

Obra: Construcción de red de distribución de agua entubada



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. LOMAS VERDES
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA
PROGRAMA: AS0000.- AGUA Y SANEAMIENTO
SUB-PROG: AS0900.-RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE

Nº DE OBRA: 23090

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$579,197.55	F.I.S.M.	\$264,626.58	F.I.S.M.	\$314,570.97
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$579,197.55	TOTAL	\$264,626.58	TOTAL	\$314,570.97

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra
 SISTEMA DE DESINFECCION, RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA, TOMAS DOMICILIARIAS.

Numero de Contrato
 MCC/DOPYDUM/FISMUN-023/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion	
Fecha de inicio	22/05/2023
Programado real	
Termino	20/07/2023

Avances
 Fisico: 100%
 Financiero: 46%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografía Terminada



ANEXOS

Ubicación: LOMAS VERDES

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA

ANTES



DURANTE



OBRA TERMINADA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ **Obra:** Construcción de barda perimetral en la escuela primaria niños héroes



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA DE PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES
PROGRAMA: ED0000.- EDUCACION
SUB-PROG: ED2100.- PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)

Nº DE OBRA: 23076

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$1,085,924.89	F.I.S.M.	\$1,085,924.89	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$1,085,924.89	TOTAL	\$1,085,924.89	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

571 M2 DE DESMANTELAMIENTO DE CERCAS DE MALLA CICLONICA, 95 PZA DE DESMANTELAMIENTO DE POSTES DE LINEA EN CERCA, 8 PZA DE DESMANTELAMIENTO DE POSTES DE ARRANQUE Y PUERTAS EN CERCAS, DESMANTELAMIENTO DE POSTES SUPERIOR, RETENIDAS Y ALAMBRES, 257 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE DESPLANTE, EXCAVACIONES, 228 M2 DE MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION, ACERO DE REFUERZO, 25 M3 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 EN CIMENTACION, 714 M3 DE MURO DE 15 CMS. DE ESPESOR DE TABICON PRENSADO, RELLENO, 128 M3 DE MATERIAL DE BANCO, ACARREOS.

Numero de Contrato

MCC/DOPYDUM/FISMUN-024/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
22/05/2023	20/06/2023

Avances

Fisico: 100%
 Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada



ANEXOS

Ubicación: JULIO CÉSAR RUÍZ FERRO

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES

ANTES



DURANTE



ANEXOS

Ubicación: JULIO CÉSAR RUÍZ FERRO


Programa: FISMUN

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES

EN PROCESO



OBRA TERMINADA

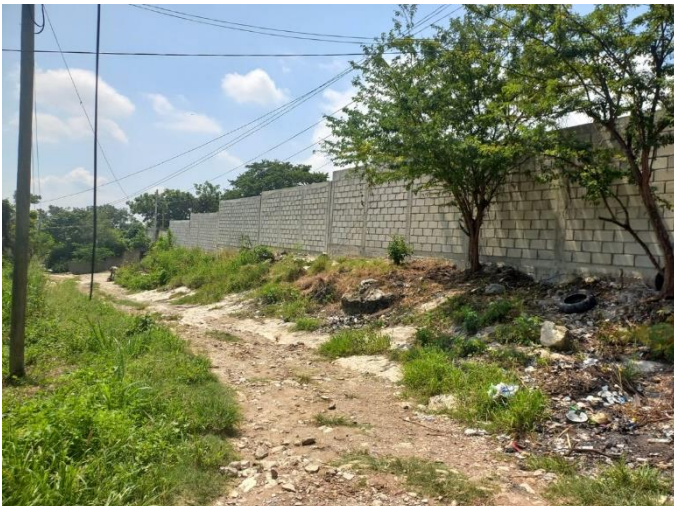

ANEXOS

Ubicación: JULIO CÉSAR RUÍZ FERRO

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES

=====

OBRA TERMINADA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

Obra: Construcción de alcantarillado pluvial



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. EL PALMAR
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
PROGRAMA: AS0000.- AGUA Y SANEAMIENTO
SUB-PROG: AS1100.- DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO

N° DE OBRA: 23077

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$369,538.09	F.I.S.M.	\$369,538.09	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$369,538.09	TOTAL	\$369,538.09	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

48.20 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACIONES, 69.20 M3 DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, 62.75 M3 DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, 34.08 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO, 12 M DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 102MM, ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION, CIMBRA, 5.46 M3 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 EN OBRA, ACARREOS.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-025/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Término
22/05/2023	15/06/2023
Programado real	
Termino	

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada



REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: Construcción de alcantarillado pluvial

AVANCE DE TRABAJOS: (COL. EL PALMAR)

TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, PLANTILLA DE CONCRETO, TUBO SANITARIO DE PVC DE 102MM, ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION, CIMBRA, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN OBRA, ACARREOS.

ANEXOS

ANTES



ANEXOS

DURANTE



OBRA TERMINADA



Col. El Palmar



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ **Obra:** Pavimentación de calles con concreto mixto, ubicado en la localidad Julio César Ruíz Ferro



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO
NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR2000.- PAVIMENTACION

N° DE OBRA: 23079

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M	\$1,273,532.11	F.I.S.M	\$1,273,532.11	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$1,273,532.11	TOTAL	\$1,273,532.11	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

1,176.80 M2 DE TRAZO Y NIVELACION DE CALLES, EXCAVACIONES, 464 M3 DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, ACARREOS, 400 M DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS; 280 M2 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, 880 M2 DE ZAMPEADO PARA PISO ELABORADO CON PIEDRA BRAZA, CORTE CON CORTADORA, APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES, SEPARACION DE JUNTA CONSTRUCTIVA.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-026/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	Programado real	Termino
22/05/2023		
		20/07/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada



REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO

AVANCE DE TRABAJOS: (COL. JULIO CÉSAR RUIZ FERRO)

TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACIONES, ACARREOS, RELLENO DE EXCAVACIONES, CONCRETO F'C=200 KG/CM² DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, CONCRETO F'C=150 KG/CM² EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS., PISO DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION, APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES.

ANEXOS

ANTES



ANEXOS

DURANTE



OBRA TERMINADA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Pavimentación de calles con concreto hidráulico, en la localidad San Rafael



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. SAN RAFAEL
NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR2000.- PAVIMENTACION

Nº DE OBRA: 23082

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$2,392,712.17	F.I.S.M.	\$2,365,913.18	F.I.S.M.	\$26,798.99
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$2,392,712.17	TOTAL	\$2,365,913.18	TOTAL	\$26,798.99

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

MPIA, TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACIONES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO, ESTAMPADO DE CONCRETO EN CALLES PARA FORMACION DE CENEFAS, ACARREOS, CONCRETO DE FC=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, CONCRETO DE FC=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X45 CMS., APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA EN GUARNICIONES, TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 50MM, RELLENO, VALVULA DE COMPUERTA, CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, ABRAZADERAS PARA TOMAS DOMICILIARIAS, TOMAS DOMICILIARIAS, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM DE DIAMETRO, CONCRETO DE FC=150 KG/CM2 EN CIMENTACION, CIMBRAS.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-027/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	Fecha de termino
22/05/2023	21/07/2023
Programado real	
Termino	

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 99%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografía Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Pavimentación de calle con concreto mixto, ubicado en la localidad La Trituradora



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. LA TRITURADORA
NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR2000.- PAVIMENTACION

Nº DE OBRA: 23086

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$1,606,548.39	F.I.S.M.	\$1,606,548.39	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$1,606,548.39	TOTAL	\$1,606,548.39	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

1,200 M2 DE TRAZO Y NIVELACION DE CALLES, EXCAVACIONES, ACARREOS, 240 M3 DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PETREO, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL, 240 M3 DE MATERIAL TRITURADO DE 3/4", 610 M2 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, 400 M DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS., 600 M2 DE PISO DE PIEDRA BRAZA, CORTE CON CORTADORA, SEPARACION DE JUNTA CONSTRUCTIVA, APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES, 60 TOMAS DOMICILIARIAS, CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, VALVULA DE SECCIONAMIENTO, 120 M DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-028/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	Programado real	Termino
05/06/2023		
		03/08/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada



REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas. Programa: FISMUN

Nombre de la obra: PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO

AVANCE DE TRABAJOS: (COL. LA TRITURADORA)

TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACIONES, ACARREOS, RELLENO DE EXCAVACIONES, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS., PISO DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION, APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES.

ANEXOS

ANTES



ANEXOS

DURANTE



OBRA TERMINADA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ Obra: Pavimentación con concreto mixto en la colonia San Sebastián



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. SAN SEBASTIAN
NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR2000.- PAVIMENTACION

Nº DE OBRA: 23078

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M	\$2,018,021.84	F.I.S.M	\$1,942,962.99	F.I.S.M.	\$75,058.85
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$2,018,021.84	TOTAL	\$1,942,962.99	TOTAL	\$75,058.85

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripcion de la Obra

1,658 M2 DE TRAZO Y NIVELACION DE CALLES, EXCAVACIONES, 466 M3 DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, ACARREOS, 480 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS.672 M2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, 768 M2 DE ZAMPEADO PARA PISO ELABORADO CON PIEDRA BRAZA, CORTE CON CORTADORA, APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES, SEPARACION DE JUNTA CONSTRUCTIVA, MURO DE MAMPOSTERIA: 28 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE DESPLANTE, 11.90 M3 DE MATERIAL DE BANCO, 28 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, 39 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, 14.40 M DE SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 102MM.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-029/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	
Programado real	05/06/2023
Termino	03/08/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 96%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografia Terminada



ANEXOS

Ubicación: SAN SEBASTIÁN Programa: FISMUN

Nombre de la obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO

=====

OBRA TERMINADA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ **Obra:** Pavimentación de calle con concreto mixto, ubicado en la localidad El Manguito Yolna



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. MANGUITO YOLNA
NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR2000.- PAVIMENTACION

Nº DE OBRA: 23097

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$2,239,926.43	F.I.S.M.	\$2,026,507.46	F.I.S.M.	\$213,418.97
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$2,239,926.43	TOTAL	\$2,026,507.46	TOTAL	\$213,418.97

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACIONES, ACARREOS, RELLENO DE EXCAVACIONES, CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, CONCRETO FC=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS., PISO DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION, APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-030/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	
Programado real	07/06/2023
Termino	05/08/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 90%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada



REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas. Programa: FISMUN

Nombre de la obra: PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO

AVANCE DE TRABAJOS: (COL. EL MANGUITO YOLNA)

TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACIONES, ACARREOS, RELLENO DE EXCAVACIONES, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS., PISO DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION, APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES.

ANEXOS

ANTES



ANEXOS

DURANTE



OBRA TERMINADA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ **Obra:** Pavimentación de calles con concreto mixto, ubicado en la localidad 3 de Marzo



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. 3 DE MARZO
NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR2000.- PAVIMENTACION

Nº DE OBRA: 23084

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M	\$2,119,276.43	F.I.S.M	\$1,929,577.05	F.I.S.M.	\$189,699.38
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$2,119,276.43	TOTAL	\$1,929,577.05	TOTAL	\$189,699.38

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripcion de la Obra

1,680 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACIONES, ACARREOS, 1,440 M2 DE COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL, SUMINISTRO DE MATERIAL TRITURADO, OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION, 720 M3 DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, 424 M DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS., 720 M2 DE PISO DE PIEDRA BRAZA, CORTE CON CORTADORA, SEPARACION DE JUNTA CONSTRUCTIVA, APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES, 25 TOMAS DOMICILIARIAS, 200 M DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-032/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Término
26/06/2023	24/08/2023

Avances

Físico: 100%

Financiero: 91%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografia Terminada



REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas. Programa: FISMUN

Nombre de la obra: PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO

AVANCE DE TRABAJOS: (COL. 3 DE MARZO)

TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACIONES, ACARREOS, RELLENO DE EXCAVACIONES, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS., PISO DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION, APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES.

ANEXOS

ANTES



ANEXOS

DURANTE



OBRA TERMINADA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ Obra: Construcción de tanque público de agua potable ubicado en la localidad de Nuevo Bochil



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. NUEVO BOCHIL
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE
PROGRAMA: AS0000.-AGUA Y SANEAMIENTO
SUB-PROG: AS0300.- DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE

Nº DE OBRA: 23083

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M	\$1,831,208.68	F.I.S.M	\$1,580,408.13	F.I.S.M.	\$250,800.55
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$1,831,208.68	TOTAL	\$1,580,408.13	TOTAL	\$250,800.55

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

100 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO, 88 M3 DE DESPALME DEL TERRENO, EXCAVACION, RELLENOS, 36 HR DE BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTECEBANTE, CONCRETO EN CIMENTACION, ACERO DE REFUERZO, 74 M2 DE MURO DE MAMPOSTERIA JUNTEADA, APLANADO DE MURO, IMPERMEABILIZACION, ESCALERA MARINA, 76.27 M2 DE GUSANEADO SBRE MUROS DE MAMPOSTERIA, 121 M3 DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE MAMPOSTERIA, APLANADOS, 56 M DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLON 55X55 MM, TUBERIA DE ACERO SOLDABLE, VALVULA DE COMPUERTA, CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION CON HIPLOCLORITO DE CALCIO AL 65%, SUMINISTRO DE HIPLOCLORITO DE CALCIO AL 65%.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-033/2023

Numero de Dictamen

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 86%

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	
Programado real	14/07/2023
Termino	11/09/2023

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografia Terminada



ANEXOS

Ubicación: NUEVO BOCHIL

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE

ANTES



DURANTE





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

Obra: Construcción de tanque público de agua potable ubicado en la localidad de Vista Hermosa



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. VISTA HERMOSA
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE
PROGRAMA: AS0000.- AGUA Y SANEAMIENTO
SUB-PROG: AS0300.- DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE

Nº DE OBRA: 23087

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$1,324,431.00	F.I.S.M.	\$1,099,613.19	F.I.S.M.	\$224,817.81
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$1,324,431.00	TOTAL	\$1,099,613.19	TOTAL	\$224,817.81

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO, DESPALME DEL TERRENO, EXCAVACION, RELLENOS, BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA, CONCRETO EN CIMENTACION, ACERO DE REFUERZO, MURO DE MAMPOSTERIA JUNTEADA, APLANADO DE MURO, IMPERMEABILIZACION, ESCALERA MARINA, 150 M3 DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE MAMPOSTERIA, APLANADOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLON 55X55 MM, TUBERIA DE ACERO SOLDABLE, VALVULA DE COMPUERTA, CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION CON HIPLOCLORITO DE CALCIO AL 65%, SUMINISTRO DE HIPLOCLORITO DE CALCIO AL 65%.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-034/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

	Fecha de Inicio	
Programado real		14/07/2023
Termino		11/09/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 83%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada



ANEXOS

Ubicación: VISTA HERMOSA

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE

ANTES



DURANTE





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Construcción de tanque de rebombeo e instalación de bomba tipo sumergible ubicado en la localidad de Venustiano Carranza



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. VENUSTIANO CARRANZA
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE DE REBOMBEO E INSTALACION DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE
PROGRAMA: AS0000.- AGUA Y SANEAMIENTO
SUB-PROG: AS0300.- DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE

Nº DE OBRA: 23098

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M	\$4,639,767.73	F.I.S.M	\$3,543,413.23	F.I.S.M.	\$1,096,354.50
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$4,639,767.73	TOTAL	\$3,543,413.23	TOTAL	\$1,096,354.50

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO MECANICO DEL BOMBEO, BOMBA VERTICAL TIPO SUMERGIBLE, ARRANCADOR AUTOMATICO, INSTALACION ELECTRICA DE CASETA DE CONTROL, ACARREOS, CONEXIONES DE LLEGADA AL TANQUE DE REBOMBEO, VALVULA DE COMPUERTA, CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO DE 30M3: EXCAVACIONES, RELLENOS, BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, CONCRETO EN CIMENTACION, ACERO DE REFUERZO, PINTURA, 36 M DE MALLA CICLON, PORTON, ESCALERA MARINA, CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL EN REBOMBEO, AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION EN MEDIA TENSION, INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO MECANICO REBOMBEO, TREN DE DESCARGA.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-035/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	
Programado real	07/07/2023
Termino	31/12/2023

Avances

Físico: 100%

Financiero: 76%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografia Terminada



ANEXOS

Ubicación: VENUSTIANO CARRANZA

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE TANQUE DE REBOMBEO E INSTALACION DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE

ANTES



DURANTE





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ Obra: Pavimentación de calles con concreto hidráulico ubicado en la localidad de María Candelaria



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. MARIA CANDELARIA
NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR2000.- PAVIMENTACION

Nº DE OBRA: 23089

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M	\$2,417,047.24	F.I.S.M	\$2,193,453.86	F.I.S.M.	\$223,593.38
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$2,417,047.24	TOTAL	\$2,193,453.86	TOTAL	\$223,593.38

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, DESPALME DE TERRENO A MANO, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL, MATERIAL DE BANCO, ACARREOS, CONCRETO F'c=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS., CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, CONCRETO ESTAMPADO PARA CENEFA, APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-036/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
01/08/2023	29/09/2023
Programado real	
Termino	

Avances

Fisico: 100%
Financiero: 91%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografia Terminada



ANEXOS

Ubicación: MARÍA CANDELARIA

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO

ANTES



DURANTE



EN PROCESO



ANEXOS

Ubicación: MARÍA CANDELARIA

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO

=====

OBRA TERMINADA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

Obra: Construcción de sistema sanitario



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. SAN FRANCISCO
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA SANITARIO
PROGRAMA: AS0000.- AGUA Y SANEAMIENTO
SUB-PROG: AS1100.- DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO

Nº DE OBRA: 23091

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M	\$3,267,129.33	F.I.S.M	\$3,097,815.85	F.I.S.M.	\$169,313.48
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$3,267,129.33	TOTAL	\$3,097,815.85	TOTAL	\$169,313.48

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

1,030 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACIONES, RELLENOS, 157 M3 DE PLANTILLA DE MATERIAL MEJORADO PARA RECIBIR TUBERIA, 727 M DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 250 MM DE DIAMETRO, 302 M DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 300 MM DE DIAMETRO, POZOS DE VISITA, ACARREOS, 26 PZA DE BROCALES PARA POZOS DE VISITA, DESCARGAS DOMICILIARIAS: 162 M2 DE TRAZO Y NIVELACION DE CALLES, EXCAVACIONES, ACARREOS, RELLENOS, 272 M DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 160MM DE DIAMETRO, 41 PZA DE SILLETAS DE PVC SANITARIO, 41 PZA DE REGISTROS, REPOSICION DE CARPETA.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-037/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Termino
01/08/2023	29/09/2023
Programado real	

Avances

Fisico: 100%
 Financiero: 95%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. Francisco Sarabia



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. FRANCISCO SARABIA
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23001

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPYDUM/FISM-OT-001/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Término
30/01/2023	13/02/2023
Programado real	
Termino	

Avances

Físico: 100%
 Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografía Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. Ignacio Allende



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. IGNACIO ALLENDE
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23002

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPYDUM/FISM-OT-002/2023

Numero de Dictamen

Avances

Físico: 100%

Financiero: 100%

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	
Programado real	30/01/2023
Termino	
	13/02/2023

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografía Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. Nicolas Bravo



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. NICOLAS BRAVO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

N° DE OBRA:

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripcion de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPYDUM/FISM-OT-003/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	
Programado real	30/01/2023
Termino	
	13/02/2023

Avances

Fisico: 100%
Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. El Ranchito



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. EL RANCHITO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23004

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPyDUM/FISM-OT-004/2023

Numero de Dictamen

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio

30/01/2023

Programado real

Termino

13/02/2023

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. Julián Grajales



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. JULIAN GRAJALES
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23005

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPyDUM/FISM-OT-005/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	
Programado real	30/01/2023
Termino	13/02/2023

Avances

Fisico: 100%
 Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. La Escalera



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. LA ESCALERA
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23019

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPyDUM/FISM-OT-006/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	
Programado real	30/01/2023
Termino	
	13/02/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. Salvador Urbina



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. SALVADOR URBINA
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23006

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPyDUM/FISM-OT-007/2023

Numero de Dictamen

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio

30/01/2023

Programado real

Termino

13/02/2023

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. El Amatal



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. AMATAL
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

N° DE OBRA: 23007

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPYDUM/FISM-OT-008/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	
Programado real	30/01/2023
Termino	
	13/02/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. Cupasmi



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. CUPASMI
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23008

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPyDUM/FISM-OT-009/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	
Programado real	30/01/2023
Termino	
	13/02/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. Monte Rico



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: MONTE RICO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23009

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPYDUM/FISM-OT-010/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	
Programado real	30/01/2023
Termino	
	13/02/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografía Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. Nva. Palestina



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. NUEVA PALESTINA
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23010

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPyDUM/FISM-OT-011/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	Programado real	Termino
30/01/2023		
		13/02/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. Distrito Federal



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. DISTRITO FEDERAL
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

N° DE OBRA: 23011

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPYDUM/FISM-OT-012/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	
Programado real	30/01/2023
Termino	
	13/02/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. Galecio Narcia



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. GALECIO NARCIA
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

N° DE OBRA: 23012

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M	\$330,786.00	F.I.S.M	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPYDUM/FISM-OT-013/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	
Programado real	30/01/2023
Termino	
	13/02/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografía Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. San Sebastián



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. SAN SEBASTIAN
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

N° DE OBRA: 23013

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPYDUM/FISM-OT-014/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	
Programado real	30/01/2023
Termino	
	13/02/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografía Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. Las Tunas



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. LAS TUNAS
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

N° DE OBRA: 23014

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M	\$330,786.00	F.I.S.M	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPYDUM/FISM-OT-015/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	Programado real	Termino
30/01/2023		
		13/02/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografía Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. Nva Carmen Tonapac



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. NUEVO CARMEN TONAPAC
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23018

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPYDUM/FISM-OT-016/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Programado real	Termino
30/01/2023		
		13/02/2023

Avances

Fisico: 100%
 Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. Playa Grande



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. PLAYA GRANDE
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23015

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPyDUM/FISM-OT-017/2023

Numero de Dictamen

Avances

Físico: 100%

Financiero: 100%

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	
Programado real	30/01/2023
Termino	13/02/2023

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografia Terminada





- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. Juan De Grijalva



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. JUAN DEL GRIJALVA
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23016

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPyDUM/FISM-OT-018/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Término
30/01/2023	13/02/2023

Avances

Físico: 100%
 Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Término	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliación de Plazo				

Fotografía Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col Julio Cesar Ruiz Ferro



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23017

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPYDUM/FISM-OT-019/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	Programado real	Termino
30/01/2023		
		13/02/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en La Santina



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL (LA SANTINA)
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

N° DE OBRA: 23022

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M	\$330,786.00	F.I.S.M	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPYDUM/FISM-OT-020/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	
Programado real	30/01/2023
Termino	
	13/02/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografia Terminada





- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. Vista Hermosa



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL (VISTA HERMOSA)
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23023

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPyDUM/FISM-OT-021/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	
Programado real	30/01/2023
Termino	
	13/02/2023



Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada

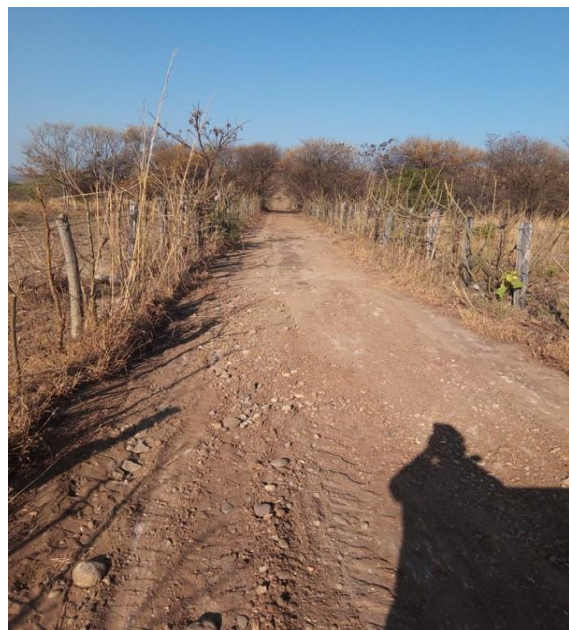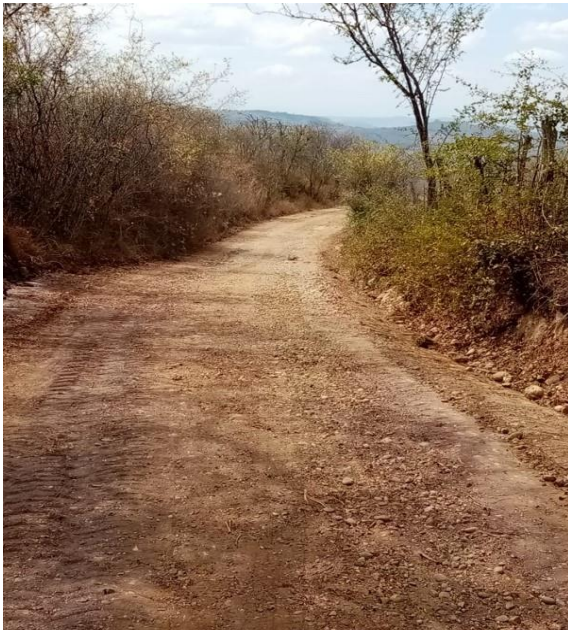



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. Narciso Mendoza



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. NARCISO MENDOZA
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23024

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPYDUM/FISM-OT-022/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	
Programado real	30/01/2023
Termino	13/02/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en La Cadelaria



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. LA CANDELARIA
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23025

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPyDUM/FISM-OT-023/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	
Programado real	14/02/2023
Termino	28/02/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la El Turizal



FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. EL TURIZAL
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23026

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$330,786.00	FISM	\$330,786.00	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Contrato

MCC/DOPYDUM/FISM-0T-024/2023

Número de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Término
14/02/2023	28/02/2023
Programado real	
Termino	

Avances

Fisico: 100%
 Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografía Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Ribera Zaragoza



FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. RIBERA ZARAGOZA
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23027

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$330,786.00	FISM	\$330,786.00	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Contrato

MCC/DOPYDUM/FISM-OT-025/2023

Número de Dictamen

Periodo de Ejecucion


Fecha de inicio	Fecha de termino
14/02/2023	
	28/02/2023

Avances

Fisico: 100%
 Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada

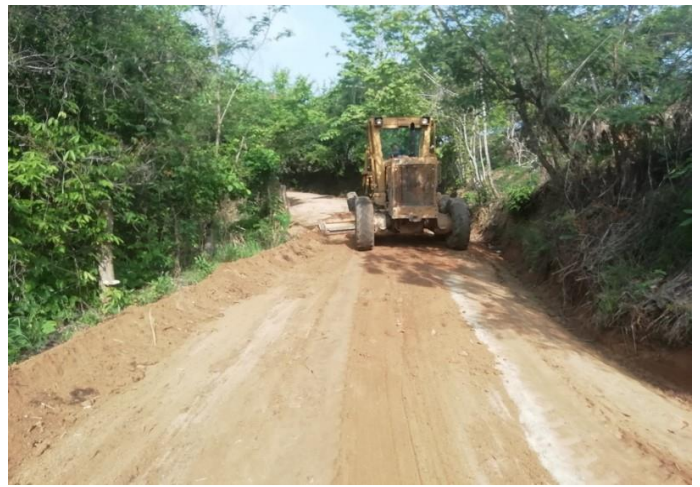



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Topada de la Flor



FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. TOPADA DE LA FLOR
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23028

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$330,824.00	FISM	\$330,824.00	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,824.00	TOTAL	\$330,824.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACION DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISM-0T-026/2023

Número de Dictamen

Periodo de Ejecucion


Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
01/03/2023	15/03/2023
Programado real	
Termino	

Avances

Fisico: 100%
 Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada

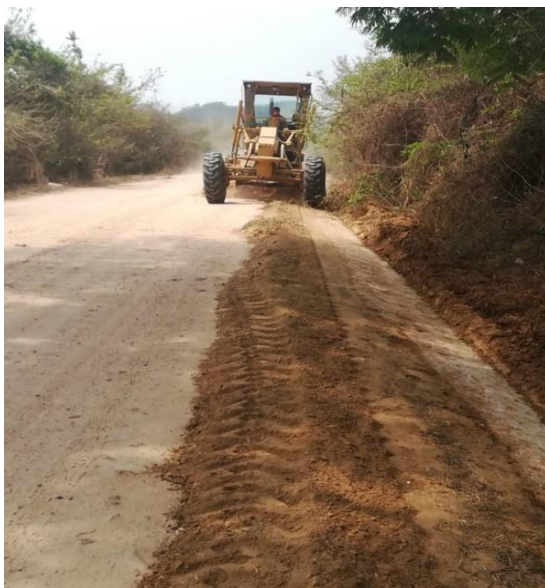



- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Playa Grande



FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. PLAYA GRANDE
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23029

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$330,824.00	FISM	\$330,824.00	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,824.00	TOTAL	\$330,824.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACION DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISM-0T-027/2023

Número de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	
Programado real	01/03/2023
Termino	15/03/2023

Avances

Fisico: 100%
Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Cabecera Municipal (Camino al Panteón)



FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL (CAMINO AL PANTEON)
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23030

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$330,824.00	FISM	\$330,824.00	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,824.00	TOTAL	\$330,824.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACION DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Contrato

MCC/DOPYDUM/FISM-0T-028/2023

Número de Dictamen

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio

01/03/2023


Programado real

Termino

15/03/2023

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada

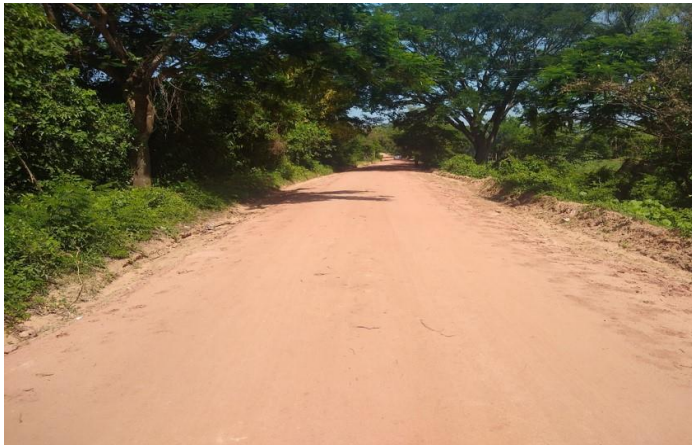



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la San José Mujular



FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. SAN JOSE MUJULAR
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23031

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$330,824.00	FISM	\$330,824.00	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,824.00	TOTAL	\$330,824.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACION DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISM-OT-029/2023

Número de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	
Programado real	01/03/2023
Termino	15/03/2023

Avances

Fisico: 100%
Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. La Joya



FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. LA JOYA
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23032

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$330,824.00	FISM	\$330,824.00	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,824.00	TOTAL	\$330,824.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACION DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISM-OT-030/2023

Número de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	
Programado real	01/03/2023
Termino	15/03/2023

Avances

Fisico: 100%
Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col El Amate



FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. EL AMATE
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23033

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$330,824.00	FISM	\$330,824.00	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,824.00	TOTAL	\$330,824.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACION DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Contrato

MCC/DOPYDUM/FISM-OT-031/2023

Número de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	Fecha de termino
01/03/2023	15/03/2023
Programado real	
Termino	

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col El Refugio



FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. EL REFUGIO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23034

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$330,824.00	FISM	\$330,824.00	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,824.00	TOTAL	\$330,824.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACION DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Contrato

MCC/DOPYDUM/FISM-OT-032/2023

Número de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	
Programado real	01/03/2023
Termino	15/03/2023

Avances

Fisico: 100%
Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografía Terminada





- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. Unión y Progreso



FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. UNION Y PROGRESO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23035

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$330,824.00	FISM	\$330,824.00	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,824.00	TOTAL	\$330,824.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACION DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISM-OT-033/2023

Número de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	
	01/03/2023
Programado real	
Termino	15/03/2023

Avances

Fisico: 100%
Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografía Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. Plan Chiapas



FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. PLAN CHIAPAS
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23036

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$330,824.00	FISM	\$330,824.00	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,824.00	TOTAL	\$330,824.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACION DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Contrato

MCC/DOPYDUM/FISM-OT-034/2023

Número de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	
Programado real	01/03/2023
Termino	15/03/2023

Avances

Fisico: 100%
Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ **Obra:** Pavimentación de calles concreto mixto, ubicada en la Col. Plan Chiapas



FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. PLAN CHIAPAS
NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CONCRETO MIXTO
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR2000.- PAVIMENTACIÓN

Nº DE OBRA: 23051

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$311,497.51	FISM	\$311,497.51	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$311,497.51	TOTAL	\$311,497.51	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Descripción de la Obra

202.02 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACIONES, ACARREOS, 67 M3 DE MATERIAL DE BANCO, 55 M DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X45 CMS., 44 M2 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, 148.5 M2 DE ZAMPEADO DE PIEDRA BRAZA PARA HUELLAS DE PAVIMENTO, CORTE CON CORTADORA, APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISM-OT-035/2023

Número de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Término
14/04/2023	28/04/2023
Programado real	
Termino	

Avances

Fisico: 100%
 Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografía Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de red de drenaje sanitario, ubicada en la Cabecera Municipal (Barrio Covadonga)



FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL (BARRIO COVADONGA)
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
PROGRAMA: AS0000.- AGUA Y SANEAMIENTO
SUB-PROG: AS3200.- DRENAJE SANITARIO

Nº DE OBRA: 23061

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$308,009.00	FISM	\$308,009.00	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$308,009.00	TOTAL	\$308,009.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CONSISTENTE EN: LIMPIEZA Y TRAZO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN RED DE ATARJEAS, 8 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA PVC SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO, SILLETA DE 8" CON SALIDA DE 6" Y CODO DE PVC DE 6" Y REPOSICION DE CONCRETO EN CALLES.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISM-0T-036/2023

Número de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Término
14/04/2023	28/04/2023
Programado real	
Termino	

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografía Terminada





- ❑ **Obra:** Rehabilitación de red de drenaje sanitario, ubicada en la Cabecera Municipal (Barrio Morelos)



FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL (BARRIO MORELOS)
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
PROGRAMA: AS0000.- AGUA Y SANEAMIENTO
SUB-PROG: AS3200.- DRENAJE SANITARIO

N° DE OBRA: 23062

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$308,009.00	FISM	\$308,009.00	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$308,009.00	TOTAL	\$308,009.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CONSISTENTE EN: LIMPIEZA Y TRAZO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO EN RED DE ATARJEAS, 8 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA PVC SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO, SILLETA DE 8" CON SALIDA DE 6" Y CODO DE PVC DE 6" Y REPOSICION DE CONCRETO EN CALLES.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISM-0T-037/2023

Número de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	
Programado real	14/04/2023
Termino	
	28/04/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de calles tramos aislados (bacheo), ubicada en la Col. Cahuare



FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. CAHUARE
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLES TRAMOS AISLADOS (BACHEO)
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR0900.- CALLE

Nº DE OBRA: 23063

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$327,329.70	FISM	\$327,329.70	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$327,329.70	TOTAL	\$327,329.70	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE CALLES TRAMOS AISLADOS (BACHEO), CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION, CORTE CON CORTADORA, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, ACARREOS, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL MEJORADO Y REPOSICION DE CONCRETO ASFALTICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISM-OT-038/2023

Número de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	
Programado real	14/04/2023
Termino	28/04/2023

Avances

Fisico: 100%
Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografía Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de calles tramos aislados (bacheo), ubicada en la Cabecera Municipal (Barrio Santa Elena)



FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTA ELENA)
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLES TRAMOS AISLADOS (BACHEO)
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR0900.- CALLE (OIR)

Nº DE OBRA: 23064

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$330,158.56	FISM	\$330,158.56	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,158.56	TOTAL	\$330,158.56	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE CALLES TRAMOS AISLADOS (BACHEO), CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION, CORTE CON CORTADORA, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, ACARREOS, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL MEJORADO Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR DE FC= 250 KG/CM2, ESTAMPADO EN CALLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISM-OT-039/2023

Número de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	
Programado real	14/04/2023
Termino	28/04/2023

Avances

Fisico: 100%
Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografía Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Ampliación de red de drenaje sanitario, ubicada en la Cabecera Municipal (Col. Jardines Del Grijalva)



FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL (COL. JARDINES DEL GRIJALVA)
NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO
PROGRAMA: AS0000.- AGUA Y SANEAMIENTO
SUB-PROG: AS3200.- DRENAJE SANITARIO

N° DE OBRA: 23065

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$315,345.56	FISM	\$315,345.56	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$315,345.56	TOTAL	\$315,345.56	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CONSISTENTE EN: LIMPIEZA Y TRAZO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 10", POZO DE VISITA Y REPOSICION DE CONCRETO EN CALLES.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISM-0T-040/2023

Número de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	
Programado real	25/04/2023
Termino	
	09/05/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Ampliación de red de agua potable, ubicada en la Cabecera Municipal (Col. Jardines Del Grijalva)



FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL (COL. JARDINES DEL GRIJALVA)
NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO
PROGRAMA: AS0000.- AGUA Y SANEAMIENTO
SUB-PROG: AS0900.- RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

N° DE OBRA: 23066

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$321,122.74	FISM	\$321,122.74	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$321,122.74	TOTAL	\$321,122.74	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: LIMPIEZA Y TRAZO, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 2 1/2" DE DIAMETRO, RD-26 Y REPOSICION DE CONCRETO EN CALLES.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISM-0T-041/2023

Número de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	
Programado real	25/04/2023
Termino	
	09/05/2023

Avances

Fisico: 100%
Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de calles tramos aislados (bacheo), ubicada en la Cabecera Municipal (Barrio Covadonga)



FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL (BARRIO COVADONGA)
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLES TRAMOS AISLADOS (BACHEO)
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR0900.- CALLE

Nº DE OBRA: 23067

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$307,623.23	FISM	\$307,623.23	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$307,623.23	TOTAL	\$307,623.23	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE CALLES (BACHEO), CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACION, CORTE CON CORTADORA, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, ACARREOS, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL MEJORADO Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR DE FC= 250 KG/CM2, ESTAMPADO DE CONCRETO EN CALLES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISM-0T-042/2023

Número de Dictamen

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	
Programado real	08/05/2023
Termino	22/05/2023

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografía Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ **Obra:** Ampliación del sistema de bombeo, ubicada en la Col. Emiliano Zapata III



FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL (BARRIO COVADONGA)
NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE BOMBEO
PROGRAMA: AS0000.- AGUA Y SANEAMIENTO
SUB-PROG: AS3100.- CARCAMO

Nº DE OBRA: 23080

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$311,103.23	FISM	\$311,103.23	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$311,103.23	TOTAL	\$311,103.23	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Descripción de la Obra

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA VERTICAL TIPO SUMERGIBLE ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO MONOFASICO DE 10 HP A 220 VOLTS CON 2.00 METROS DE TUBERIA DE COLUMNA DE 2" DE DIAMETRO, CON CABLE TIPO SUBMARINO Y CABEZAL DE DESCARGA DE 2".

Numero de Contrato

MCC/DOPYDUM/FISM-OT-043/2023

Número de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
17/05/2023	31/05/2023
Programado real	
Termino	

Avances

Fisico: 100%
Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ Obra: Rehabilitación del sistema de bombeo, ubicada en la Col. V. Carranza



FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. VENUSTIANO CARRANZA
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO
PROGRAMA: AS0000.- AGUA Y SANEAMIENTO
SUB-PROG: AS3100.- CARCAMO

N° DE OBRA: 23081

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$328,502.95	FISM	\$328,502.95	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$328,502.95	TOTAL	\$328,502.95	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO CONSISTENTE EN: REPARACION DE CUERPO DE TAZONES ENCAMIZADOS DE BOMBAVERTICAL TIPO TURBINA MARCA BNJ MODELO 6AC DE 21 TAZONES, FLECHA DE AJUSTE DE 1" DIAMETRO X 2.72 MTS, CONJUNTO ESTOPERO DE 1", TUBO DE COLUMNA DE 4" DIAMETRO X 1.52 MTS. COMPLETO CON FLECHA Y PORTACHUMACERA.

Numero de Contrato

MCC/DOPYDUM/FISM-OT-043/2023

Número de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	Fecha de termino
17/05/2023	31/05/2023
Programado real	
Termino	

Avances

Fisico: 100%
Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

Obra: Pavimentación de calles con concreto hidráulico. (160 ml)

REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: BANOBRAS-FAIS

Nombre de la obra: Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico

AVANCE DE TRABAJOS: (COL. LAS MARGARITAS)

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, EXCAVACIONES, ACARREOS, MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS., CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10M CMS. DE ESPESOR, CORTE CON CORTADORA, ESTAMPADO DE CONCRETO PARA FORMACION DE CENEFAS, APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES.

ANEXO

ANTES



DURANTE



OBRA TERMINADA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

Obra: Construcción de domo en cancha deportiva en COBACH N° 74

REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: BANOBRAS-FAIS

Nombre de la obra: **CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DEPORTIVA EN COBACH No. 74.**

AVANCE DE TRABAJOS: (COL. JULIÁN GRAJALES)

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN AREA DE DESPLANTE, EXCAVACIONES, RELLENOS, PLANTILLA DE CONCRETO DE 100 KG/CM2, CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, ACERO PARA REFUERZO, CIMBRAS, ESTRUCTURA METÁLICA, DE SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN. ANCLAS DE VARILLAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA ZINTRO 0-100, PLACA DE ACERO, CANALON DE LAMINA LISA GALVANIZADA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, LUMINARIO AUTOBALASTRADO, INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA.

ANEXOS

ANTES



DURANTE



OBRA TERMINADA



Col. Julián Grajales



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

Obra: Construcción de andadores peatonales

REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: BANOBRAS-FAIS

Nombre de la obra: Construcción De Andadores Peatonales.

AVANCE DE TRABAJOS: (COL. LA UNIÓN EL CASTAÑO)

TRABAJOS DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN CALLES, EXCAVACIONES, ACARREOS, MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM² DE 10 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO F'C=200 KG/CM² DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES GUARNICIÓN INVERTIDA CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS., APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES, BASE DE CONCRETO, POSTE DE FIERRO CONICO, LUMINARIA SOLAR.

ANTES



DURANTE



OBRA TERMINADA



Col. La Unión El Castaño



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

Obra: Pavimentación de calles con concreto hidráulico. (200 ml)

REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: BANOBRAS-FAIS

Nombre de la obra: Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico

AVANCE DE TRABAJOS: (COL. NUEVA PALESTINA)

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, EXCAVACIONES, ACARREOS, MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS., CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10M CMS. DE ESPESOR, CORTE CON CORTADORA, ESTAMPADO DE CONCRETO PARA FORMACION DE CENEFAS, APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES.

ANEXO

ANTES



DURANTE



OBRA TERMINADA



Col. Nueva Palestina



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

Obra: Pavimentación de calles con concreto hidráulico. (180 ml)

REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: BANOBRAS-FAIS

Nombre de la obra: Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico

AVANCE DE TRABAJOS: (COL. CANDILI)

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, EXCAVACIONES, ACARREOS, MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS., CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10M CMS. DE ESPESOR, CORTE CON CORTADORA, ESTAMPADO DE CONCRETO PARA FORMACION DE CENEFAS, APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES.

ANEXO

ANTES



DURANTE



OBRA TERMINADA



Col. Candili



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

Obra: Pavimentación de calles con concreto hidráulico. (269 ml)

REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: BANOBRAS-FAIS

Nombre de la obra: Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico

AVANCE DE TRABAJOS: (COL. NARCISO MENDOZA)

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, EXCAVACIONES, ACARREOS, MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS., CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10M CMS. DE ESPESOR, CORTE CON CORTADORA, ESTAMPADO DE CONCRETO PARA FORMACION DE CENEFAS, APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES.

ANEXO

ANTES



DURANTE



OBRA TERMINADA



Col. Narciso Mendoza



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

Obra: Rehabilitación de la red de distribución de agua potable

REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: BANOBRAS-FAIS

Nombre de la obra: Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable.

AVANCE DE TRABAJOS: (COL. GALECIO NARCIA)

TRAZO Y NIVELACIÓN EN CALLES, RUPTURA DE PAVIMENTO, ACARREOS, EXCAVACIONES, DE PLANTILLA APISONADA CON PISÓN DE MANO, RELLENOS, CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, TOMAS DOMICILIARIAS, TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA, TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, PIEZAS ESPECIALES, ABRAZADERA PARA TOMAS DOMICILIARIAS, TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO, CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES.

INICIO



ANEXOS

DURANTE



OBRA TERMINADA



Col. Galecio Narcia



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

Obra: Construcción de puente vehicular
(17.5 ml a - 4.4)

ANEXOS

Ubicación: EL RECUERDO Programa: BANOBRAS-FAIS

Nombre de la obra: "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (17.5 ML A - 4.4) "


ANTES



DURANTE



EN PROCESO

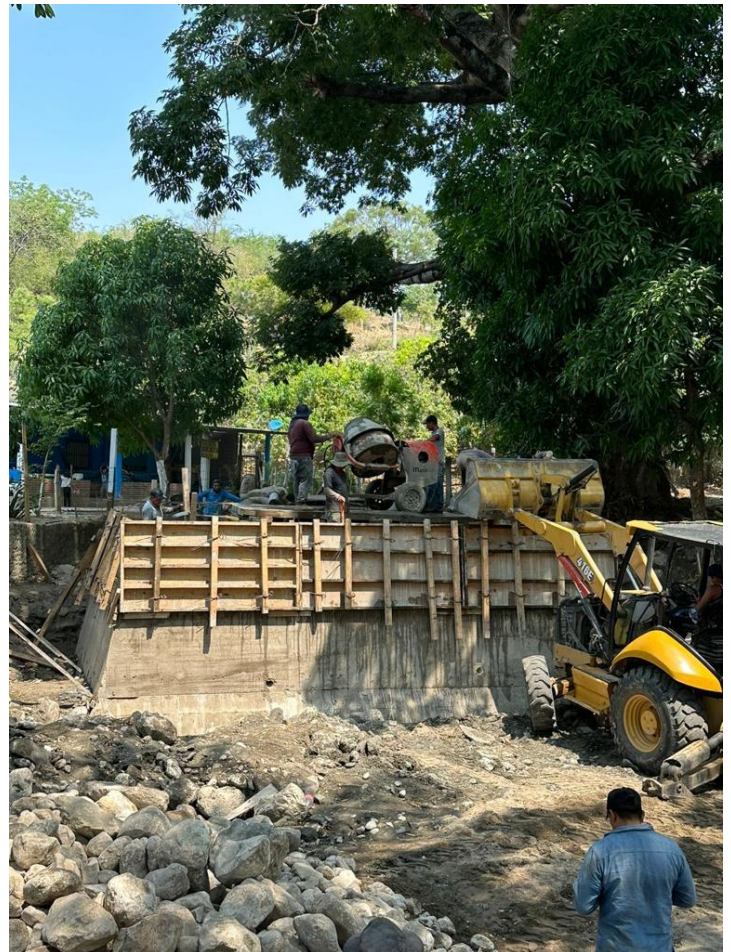



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Modernización de camino e.c. con carpeta asfáltica (km 2+500 al 3+000)

REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: BANOBRAS-FAIS

Nombre de la obra: Modernización De Camino Tipo "C" Con Carpeta Asfáltica De Km 2+500 Al 3+465 (1a. Etapa).

AVANCE DE TRABAJOS: (COL. NUCATILI)

DESMONTE PARA DENSIDAD, DESPALME EN MATERIAL A, EXCAVACIONES, EXCAVACIONES DE PRÉSTAMOS COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE, PAGO DE RAGALIAS, ACARREOS, SUMINISTRO DE MATERIAL DE GRAVA TRITURADA, OPERACIÓN DE ACAMELLONAMIENTO, OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASES, PUENTE DE CONCRETO HIDRÁULICO, ZAMPAEADO DE MAMPOSTERIA, ACERO DE REFUERZO.

ANEXOS

ANTES



DURANTE



OBRA TERMINADA



Col. Nucatili



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

Obra: Pavimentación de calles con concreto hidráulico. (190 ml)

REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: BANOBRAS-FAIS

Nombre de la obra: Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico

AVANCE DE TRABAJOS: (CAHUARE)

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, EXCAVACIONES, ACARREOS, MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS., CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10M CMS. DE ESPESOR, CORTE CON CORTADORA, ESTAMPADO DE CONCRETO PARA FORMACION DE CENEFAS, APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES.

ANEXO

ANTES



DURANTE



OBRA TERMINADA



Cahuare



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ **Obra:** Construcción de muros de contención y plataforma en jardín de niños León Felipe

REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: BANOBRAS-FAIS

Nombre de la obra: Construcción De Muros De Contención Y Plataforma En Jardín De Niños León Felipe.

AVANCE DE TRABAJOS: (COL. NANDAMBUA 1ª. SECCION)

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE, EXCAVACIONES, MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, SUMINISTRO DE MATERIAL TRITURADO DE 1 1/2", SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO EN PVC, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, RELLENOS, ACARREOS, MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO EN HIDROSANITARIA.

ANTES



DURANTE



OBRA TERMINADA



Col. Nandambua 1ª. Sección



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

Obra: Ampliación de puente vehicular
en calle 5 de Febrero

REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: BANOBRAS-FAIS

Nombre de la obra: Ampliación De Puente Vehicular En Calle 5 De Febrero

AVANCE DE TRABAJOS: (CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN VICENTE)

EXCAVACIONES, RELLENOS, H DE BOMBEO, SOBRECARREROS DE MATERIALES, MATERIAL PARA DRENES DE MUROS CON PIEDRA DE PEPENA, TUBOS PARA DRENES DE 10 CMS. DE DIÁMETRO, CONCRETO HIDRÁULICO EN CUERPO DE ESTRIBOS, MOLDES PARA PUENTES EN ESTRIBOS, CONCRETO HIDRÁULICO EN CORONAS, MOLDES PARA PUENTES EN CORONAS, ACERO DE REFUERZO, APLANADO DE MURO, RECUBRIMIENTO DE PINTURA, ANCLAJE DE VARILLAS, ESTRUCTURAS, CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=250 KG/CM2 EN LOSAS Y BANQUETAS, DREN VERTICAL, TUBOS PARA DRENES DE 15 CMS. DE DIÁMETRO, JUNTAS DE DILATACIÓN, APROCHES, DEMOLICIONES, CONCRETO HIDRÁULICO EN PAVIMENTO Y BANQUETAS, DE MAMPOSTERIA, CONCRETO HIDRÁULICO EN MUROS, MOLDES PARA PUENTE EN MUROS, SEÑALAMIENTO.

ANTES



ANEXOS

DURANTE



OBRA TERMINADA



Cabecera Municipal (Barrio San Vicente)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

Obra: Revestimiento de camino e.c.
(km 0+000 al 6+386)

REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: BANOBRAS-FAIS

Nombre de la obra: Revestimiento De Camino E.C. (Km 0+000 Al 6+386).

AVANCE DE TRABAJOS: (BARRANCA HONDA)

RASTREO Y CONFIGURACIÓN DE CAMINOS CON MAQUINA MOTOCONFORMADORA, MATERIAL PARA REVESTIMIENTO, ACARREOS, EXCAVACIONES, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES.

ANTES



ANEXOS

DURANTE



OBRA TERMINADA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

Obra: Pavimentación de calles con concreto hidráulico.

REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: BANOBRAS-FAIS

Nombre de la obra: Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico

AVANCE DE TRABAJOS: (COL. NICOLÁS BRAVO)

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, EXCAVACIONES, ACARREOS, MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS., CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10M CMS. DE ESPESOR, CORTE CON CORTADORA, ESTAMPADO DE CONCRETO PARA FORMACION DE CENEFAS, APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES.

ANEXO

ANTES



DURANTE



OBRA TERMINADA



Col. Nicolás Bravo



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

Obra: Pavimentación de calles con concreto hidráulico (250 ml)

REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: BANOBRAS-FAIS

Nombre de la obra: Pavimentación De Calles Con Concreto Mixto

AVANCE DE TRABAJOS:

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN CALLES, EXCAVACIONES, MATERIAL MEDIDO COMPACTO, ACARREOS, CONCRETO F'C=150 KG/CM² EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS. CONCRETO F'C=200 KG/CM² DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, CORTE CON CORTADORA, ZAMPEADO PARA PISO DE PIEDRA BRAZA, SEPARACIÓN DE JUNTA CONSTRUCTIVA, APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES, TRAZO Y NIVELACIÓN EN CALLES, MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, TUBERÍA DE POLIETILENO DE LATA DENSIDAD DE 13MM, TOMAS DOMICILIARIAS, CAJAS DE OPERACION DE VÁLVULAS



ANEXOS



Imagen 1. Col. Carrillo Puerto



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

Obra: **Revestimiento** **callejón**
nandambua

REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: BANOBRAS-FAIS

Nombre de la obra: Revestimiento De Camino E.C. (Km 0+000 Al 6+386).

AVANCE DE TRABAJOS: (CALLEJON RIBERA NANDAMBUA)

RASTREO Y CONFIGURACIÓN DE CAMINOS CON MAQUINA MOTOCONFORMADORA, MATERIAL PARA REVESTIMIENTO, ACARREOS.


ANEXOS

INICIO



ANEXOS

DURANTE

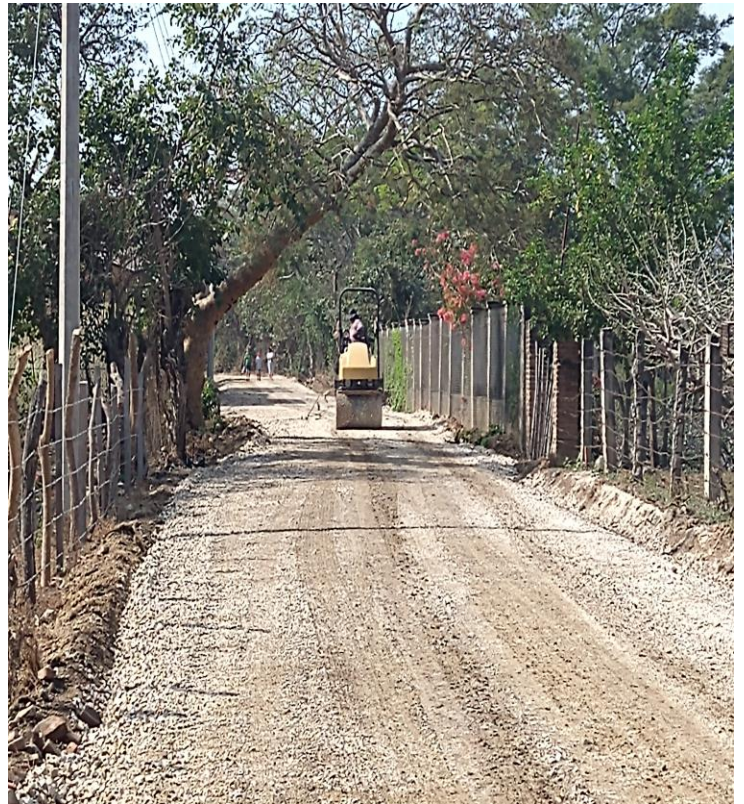

OBRA TERMINADA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

Honorable Ayuntamiento Constitucional de
Chiapa de Corzo, Chiapas
2021-2024

