

Informe de labores de obras del 1er trimestre del ejercicio 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

Honorable Ayuntamiento Constitucional de
Chiapa de Corzo, Chiapas
2021-2024



Obras del 1er trimestre 2023

Nombre de la obra	Localidad	Inversión	%
Construcción del sistema de agua potable a realizarse en la localidad de colonia San Joaquin 1	San Joaquin I	4,204,659.32	2.77
Pavimentación de calles con concreto hidráulico a realizarse en la localidad de "El Tejar"	El Tejar	2,596,775.56	1.71
Ampliación del centro de salud	Chiapa De Corzo	3,398,462.28	2.24
Revestimiento de camino rural	El Palmar	5,495,000.00	3.62
Revestimiento de camino rural	San Martin La Escalera	5,495,000.00	3.62
Ampliación de la red de energía eléctrica	El Horizonte	5,336,477.33	3.52
Rehabilitación de red de distribución y carcamo de bombeo	Distrito Federal	2,500,000.00	1.65
Construcción de domo y cancha de usos múltiples	Angel Albino Corzo	2,873,109.18	1.89
Construcción de domo en cancha multideportiva existente en espacio público	Chile Verde	2,943,581.93	1.94
Rehabilitación de red de distribución de agua potable (2da. etapa)	Galecio Narcía	2,347,585.15	1.55
Construcción de domo y cancha de usos múltiples	Nuevo Carmen Tonapac	2,862,073.06	1.89
Construcción de cancha de usos múltiples	San Jose Mujular	820,817.82	0.54
Total		40,873,541.63	26.95



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ Obra: Construcción del sistema de agua potable a realizarse en la localidad de colonia San Joaquín 1



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. SAN JOAQUIN 1
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
PROGRAMA: AS0000.- AGUA Y SANEAMIENTO
SUB-PROG: AS0900.- RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE

Nº DE OBRA: 23021

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$4,204,659.32	F.I.S.M.	\$3,963,993.72	F.I.S.M.	\$240,665.60
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$4,204,659.32	TOTAL	\$3,963,993.72	TOTAL	\$240,665.60

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

DEMOLICION DE APLANADOS, 40.89 M2 DE APLANADO DE MURO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, 65.82 M2 DE GUSANEADO SOBRE MUROS DE MAMPOSTERIA EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO, 2 PZA DE ESCALERA MARINA, VALVULA DE SECCIONAMIENTO, CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS, 39 M DE MALLA CICLON GALVANIZADA, 1 PZA DE PUERTA, EQUIPO DE CLORACION, 100 KG DE SUMINISTRO DE HIPOCLORITO, RED DE DISTRIBUCION, 5,695 M DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 75MM, 99 M DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO, ATRAQUES DE RED DE DISTRIBUCION, VALVULAS DE SECCIONAMIENTO, CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, 90 TOMAS DOMICILIARIAS, 450 M DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM.

Numero de Contrato

MCC/DOPYDUM/FISMUN-001/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	Programado real	Termino
03/04/2023		01/06/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 94%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada



REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: Construcción del Sistema de Agua Potable


AVANCE DE TRABAJOS: (COL. SAN JOAQUIN I)

TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y CONEXIONES DE SALIDA DE TANQUE SUPERFICIAL, DESINSECCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN, TOMAS DOMICILIARIAS.

ANTES



DURANTE

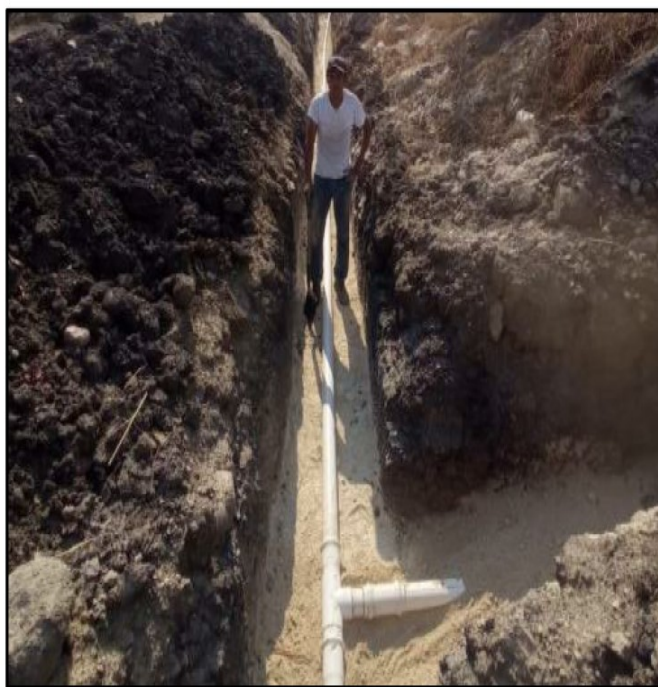

ANEXOS

OBRA TERMINADA



Col. San Joaquín I



- ❑ **Obra:** Pavimentación de calles con concreto hidráulico a realizarse en la localidad de “El Tejar”



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. EL TEJAR
NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR2000.- PAVIMENTACION

N° DE OBRA: 23038

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$2,596,775.56	F.I.S.M.	\$2,596,775.56	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$2,596,775.56	TOTAL	\$2,596,775.56	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

1,257.80 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACIONES, 525.15 M3 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO, 1,167.00 M2 DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, 227.00 M DE ESTAMPADO DE CONCRETO EN CALLES PARA FORMACION DE CENEFAS, CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO, SEPARACION DE JUNTA CONSTRUCTIVA, 454.00 M DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS., 454.00 M DE APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES, ACARREOS, VALVULA DE SECCIONAMIENTO, CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS, 227 M DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 50 MM DE DIAMETRO, 210 M DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM DE DIAMETRO.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-002/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
03/04/2023	01/06/2023
Programado real	
Termino	

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada



REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO

AVANCE DE TRABAJOS: (COL. EL TEJAR)

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, EXCAVACIONES, ACARREOS, MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS., CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10M CMS. DE ESPESOR, CORTE CON CORTADORA, ESTAMPADO DE CONCRETO PARA FORMACION DE CENEFAS, APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES.

ANEXOS

ANTES




ANEXOS

DURANTE



OBRA TERMINADA

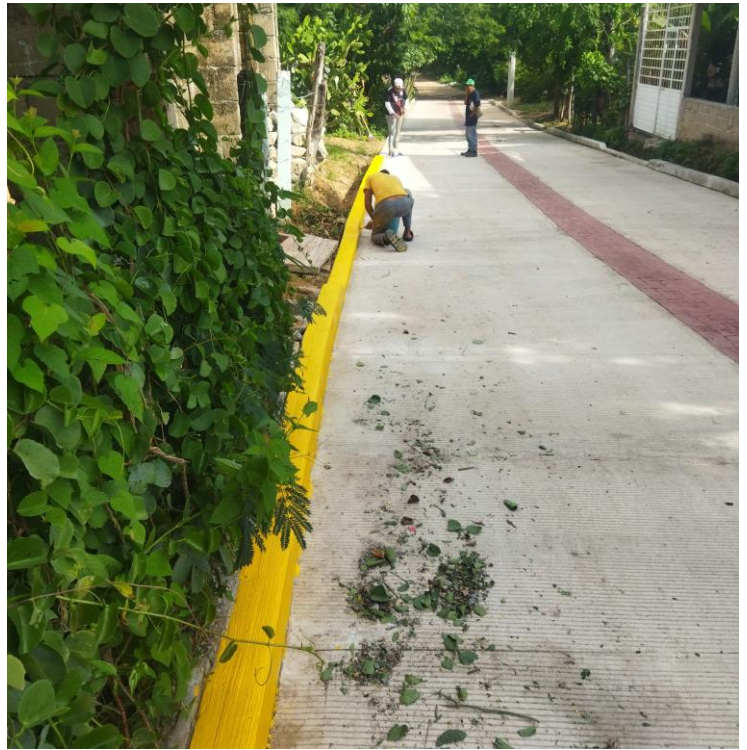

Col. El Tejar



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ **Obra:** Ampliación del centro de salud





FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN MIGUEL)
NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD
PROGRAMA: SA0000.- SALUD
SUB-PROG: SA0700.- CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS

Nº DE OBRA: 23049

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$3,398,462.28	F.I.S.M.	\$3,330,155.97	F.I.S.M.	\$68,306.31
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$3,398,462.28	TOTAL	\$3,330,155.97	TOTAL	\$68,306.31

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIONES, RELLENOS, MATERIAL DE BANCO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACION, ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION, CIMBRA, CONCRETO PARA LOSAS Y TRABES, COLUMNAS, CADENAS Y CASTILLOS, MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR EN TABIQUE ROJO, APLANADO DE MURO, CANCELERIA, APLICACION DE PINTURA EN MUROS, APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA, FALSO PLAFOND, SEÑALIZACION, PISO DE ADOQUIN, INSTALACION SANITARIA, HIDRAULICA Y ELECTRICA.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-003/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
03/04/2023	01/07/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 98%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada



ANEXOS

Localidad: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD

ANTES



DURANTE



OBRA TERMINADA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ **Obra:** Revestimiento de camino rural,
ubicado en la colonia El Palmar



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. EL PALMAR
NOMBRE DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR2100.- REVESTIMIENTO

N° DE OBRA: 23048

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$5,495,000.00	F.I.S.M.	\$5,435,206.43	F.I.S.M.	\$59,793.57
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$5,495,000.00	TOTAL	\$5,435,206.43	TOTAL	\$59,793.57

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

8.86 KM DE BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, 195.73 M3 DE DESPALME EN MATERIAL A, EXTRACCION DE MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS, 9,747 M3 DE OPERACIÓN DE TENDIDO Y COMPACTACION DE REVESTIMIENTO, AGUA UTILIZADA, ACARREOS DE AGUA, ACARREOS

Numero de Contrato

MCC/DOPYDUM/FISMUN-004/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
03/04/2023	01/06/2023
Programado real	
Termino	

Avances

Fisico: 100%
 Financiero: 99%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Revestimiento de camino rural, ubicado en la colonia San Martín La Escalera



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. SAN MARTIN (LA ESCALERA)
NOMBRE DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR2100.- REVESTIMIENTO

N° DE OBRA: 23047

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M	\$5,495,000.00	F.I.S.M	\$5,428,663.60	F.I.S.M.	\$66,336.40
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$5,495,000.00	TOTAL	\$5,428,663.60	TOTAL	\$66,336.40

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

8.86 KM DE BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, DESPALME EN MATERIAL A, EXTRACCION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES, 9,747 M3 DE OPERACIÓN DE TENDIDO Y COMPACTACION DE REVESTIMIENTO, AGUA UTILIZADA EN COMPACTACION, ACARREOS DEL AGUA, ACARREOS.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-005/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	Programado real	Termino
03/04/2023		
		01/06/2023

Avances

Fisico: 100%
 Financiero: 99%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ **Obra:** Ampliación de la red de energía eléctrica



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. EL HORIZONTE
NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA
PROGRAMA: VI0000.- VIVIENDA
SUB-PROG: VI1600.- ELECTRIFICACION

N° DE OBRA: 23039

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$5,336,477.33	F.I.S.M.	\$5,336,477.33	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$5,336,477.33	TOTAL	\$5,336,477.33	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

3 PZA DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-13-600 ARRASTRE, 1 PZA DE POSTE DE CONCRETO PC-13-600 C/G, 26 PZA DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750 C/G, 9 PZA DE POSTE DE CONCRETO PC-9-400 C/G, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION, 1 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUCHILLA TRIPLE DISPARO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVOS, RETENIDAS, 9 PZA DE TIERRA FISICA TIPO 1K, SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR, 600 M DE CABLE DE ALUMINIO TIPO NEUTRANES 2+1, 80 PZA DE CONECTOR DERIVADOR, 120 PZA DE ACOMETIDAS, EQUIPO DE MEDICION, 8 PZA DE FORO ANTIFAUNA, 8 PZA DE PUENTES EN ESTRUCTURAS, 95 PZA DE DESMANTELAMIENTO DE ACOMETIDAS, REUBICACION DE ACOMETIDAS, DESMANTELAMIENTO DE POSTES DE CONCRETO, DESMANTELAMIENTO DE TRANSFORMADOR, TRAMITES ANTE C.F.E.

Numero de Contrato

MCC/DOPYDUM/FISMUN-006/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
17/04/2023	15/06/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografia Terminada



ANEXOS

Ubicación: EL HORIZONTE

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA


ANTES



DURANTE



OBRA TERMINADA

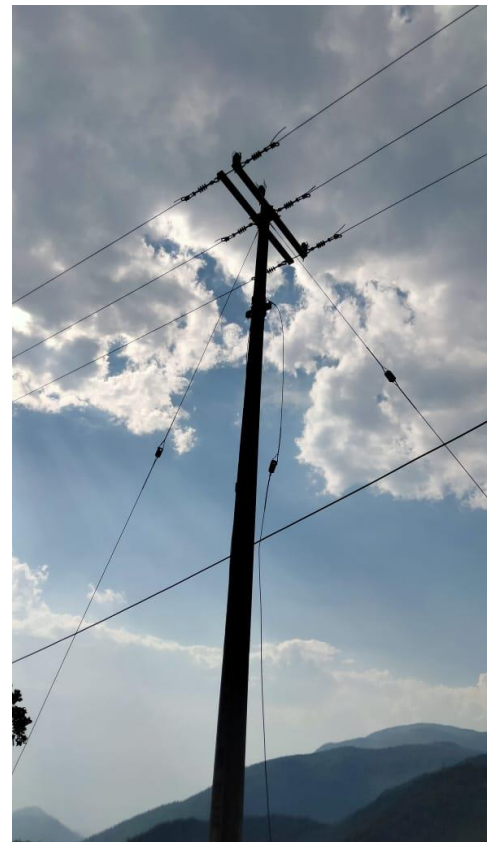



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ **Obra:** Rehabilitación de red de distribución y cárcamo de bombeo



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. DISTRITO FEDERAL
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION Y CARCAMO DE BOMBEO
PROGRAMA: AS0000.- AGUA Y SANEAMIENTO
SUB-PROG: AS0900.- RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE

N° DE OBRA: 23040

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$2,500,000.00	F.I.S.M.	\$2,500,000.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$2,500,000.00	TOTAL	\$2,500,000.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO CON BOMBA SUMERGIBLE, CAJAS DE OPERACIÓN, 11.29 M2 DE MURO DE 15CMS. DE ESPESOR DE BLOCK HUECO, APLANADOS DE MUROS, REFUERZO DE ACERO, INSTALACION ELECTRICA, RED DE DISTRIBUCION, 2,385 M DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 50MM EN RED DE AGUA POTABLE, 1,522 M DE DESMANTELAMIENTO DE TUBERIA DE PVC, CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, VALVULAS DE SECCIONAMIENTO, 278 TOMAS DOMICILIARIAS, 2,780 M DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, CONSTRUCCION DE HIDRANTE PUBLICO.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-007/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	Programado real	Termino
19/04/2023		
		17/06/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada



REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: Rehabilitación de red de distribución y cárcamo de bombeo

AVANCE DE TRABAJOS: (COL. DISTRITO FEDERAL)

TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO, CAJA DE OPERACIÓN, REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, ASI COMO REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS.

ANEXOS

INICIO



ANEXOS

DURANTE



OBRA TERMINADA



Col. Distrito Federal



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ Obra: Construcción de domo y cancha de usos múltiples



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. ANGEL ALBINO CORZO
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR1000.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Nº DE OBRA: 23044

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$2,873,109.18	F.I.S.M.	\$1,792,328.06	F.I.S.M.	\$1,080,781.12
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$2,873,109.18	TOTAL	\$1,792,328.06	TOTAL	\$1,080,781.12

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

592 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE CANCHA, EXCAVACIONES, RELLENO DE EXCAVACIONES, ACARREOS, CIMENTACION, 1.733 KG DE SUMINSTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE COLUMNA METALICA TUBO DE ACERO CED. 40, ESTRUCTURA METALICA, PERFIL MONTEN, 96 PZA DE ANCLA DE VARILLA, TENSOSES, 599 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO R72 CAL. 26, 65 M DE CANALON DE LAMINA LISA, INSTALACION ELECTRICA, 15 PZA DE LUMINARIA LED, INSTALACION PLUVIAL, ACABADOS, 102 M DE MALLA CICLONICA, PUERTA ABATIBLE, 540 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, 54 M3 DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 EN CIMENTACION, 540 M2 DE REFUERZO DE MALLA LAC, 451 M2 DE APLICACION DE PINTURA, 2 PZA DE BASE DE PORTERIA.

Numero de Contrato

MCC/DOPYDUM/FISMUN-008/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	Fecha de termino
17/04/2023	30/06/2023
Programado real	
Termino	

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 62%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada



ANEXOS

Ubicación: ANGEL ALBINO CORZO

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

=====

OBRA TERMINADA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Construcción de domo en cancha multideportiva existente en espacio público



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. CHILE VERDE
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA MULTIDEPORTIVA EXISTENTE EN ESPACIO PÚBLICO
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR1000.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Nº DE OBRA: 23046

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$2,943,581.93	F.I.S.M.	\$2,333,224.11	F.I.S.M.	\$610,357.82
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$2,943,581.93	TOTAL	\$2,333,224.11	TOTAL	\$610,357.82

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

592 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE CANCHA, EXCAVACIONES, RELLENO DE EXCAVACIONES, ACARREOS, CIMENTACION, 1,733 KG DE SUMINSTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE COLUMNA METALICA TUBO DE ACERO CED. 40, ESTRUCTURA METALICA, PERFIL MONTEN, 96 PZA DE ANCLA DE VARILLA, TENSOSES, 599 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO R72 CAL. 26, 65 M DE CANALON DE LAMINA LISA, INSTALACION ELECTRICA, 15 PZA DE LUMINARIA LED, INSTALACION PLUVIAL, ACABADOS, 102 M DE MALLA CICLONICA, PUERTA ABATIBLE, 540 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, 54 M3 DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 EN CIMENTACION, 540 M2 DE REFUERZO DE MALLA LAC, 451 M2 DE APLICACION DE PINTURA, 2 PZA DE BASE DE PORTERIA.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-009/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	Fecha de termino
17/04/2023	15/06/2023
Programado real	
Termino	

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 92%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada



ANEXOS

Ubicación: CHILE VERDE

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA MULTIDEPORTIVA EXISTENTE EN ESPACIO PÚBLICO


ANTES



DURANTE



OBRA TERMINADA

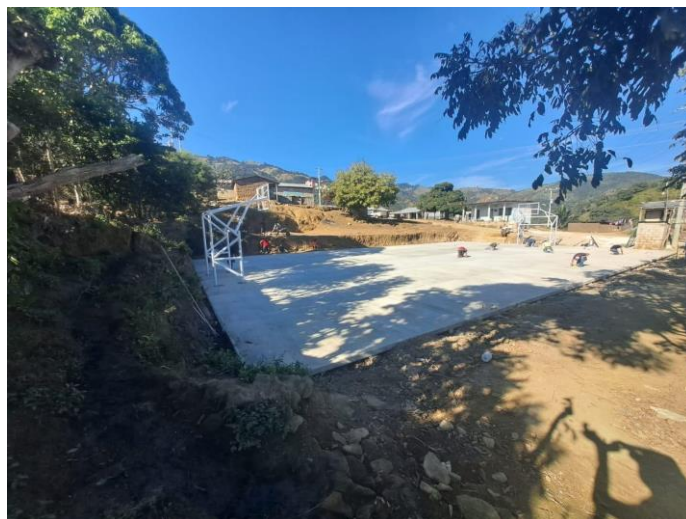



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ **Obra:** Rehabilitación de red de distribución de agua potable (2da. etapa)



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. GALECIO NARCIA
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA)
PROGRAMA: AS0000.- AGUA Y SANEAMIENTO
SUB-PROG: AS0905.- REHABILITACION

N° DE OBRA: 23050

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M	\$2,347,585.15	F.I.S.M	\$2,347,585.15	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$2,347,585.15	TOTAL	\$2,347,585.15	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

1.030 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACIONES, RELLENOS, 157 M3 DE PLANTILLA DE MATERIAL MEJORADO PARA RECIBIR TUBERIA, 727 M DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 250 MM DE DIAMETRO, 302 M DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 300 MM DE DIAMETRO, POZOS DE VISITA, ACARREOS, 26 PZA DE BROCALES PARA POZOS DE VISITA, DESCARGAS DOMICILIARIAS: 162 M2 DE TRAZO Y NIVELACION DE CALLES, EXCAVACIONES, ACARREOS, RELLENOS, 272 M DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 160MM DE DIAMETRO, 41 PZA DE SILLETAS DE PVC SANITARIO, 41 PZA DE REGISTROS, REPOSICION DE CARPETA.

Numero de Contrato

MCC/DOPYDUM/FISMUN-010/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
17/04/2023	15/06/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada



ANEXOS

Ubicación: GALECIO NARCÍA

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA)

=====

ANTES



OBRA DURANTE





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ Obra: Construcción de domo y cancha de usos múltiples



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. NUEVO CARMEN TONAPAC
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR1000.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Nº DE OBRA: 23052

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$2,862,073.06	F.I.S.M.	\$2,862,073.06	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$2,862,073.06	TOTAL	\$2,862,073.06	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE DESPLANTE, EXCAVACIONES, RELLENOS, CIMENTACION, ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, ANCLAS DE VARILLA LISA, LAMINA ZINTRO R-72 CAL. 26, INSTALACION ELECTRICA, LUMINARIA, PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE, 2 PZA DE BASE DE PORTERIA EN CANCHA DE BASQUETBOL.

Numero de Contrato

MCC/DOPYDUM/FISMUN-011/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
17/04/2023	30/06/2023

Avances

Fisico: 100%
 Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografía Terminada



ANEXOS

Ubicación: NUEVO CARMEN TONAPAC Programa: FISMUN

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

=====

ANTES



DURANTE



OBRA TERMINADA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ Obra: Construcción de cancha de usos múltiples



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. SAN JOSE MUJULAR
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR1000.-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Nº DE OBRA: 23053

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M	\$820,817.82	F.I.S.M	\$820,817.82	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$820,817.82	TOTAL	\$820,817.82	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

576 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN CANCHA, EXCAVACIONES, RELLENO DE EXCAVACIONES, PLANTILLA DE CONCRETO, CONCRETO EN CIMENTACION, ACERO DE REFUERZO, 36.92 M2 DE MURETE DE ENRASE, 579.95 M2 DE PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, REFUERZO DE MALLA LAC 6-6/10-10, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, 2 PZA DE BASE DE PORTERIA, TUBO NEGRO DE 63MM PARA CANCHA DE VOLEIBOL, INSTALACION ELECTRICA, MURO DE ACOMETIDA, 4 PZA DE LUMINARIA PARA CANCHA, ACARREOS.

Numero de Contrato

MCC/DOPYDUM/FISMUN-012/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	Programado real	Termino
24/04/2023		
		22/06/2023

Avances

Fisico: 100%
 Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada



REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas. Programa: FISMUN

Nombre de la obra: Construcción de cancha de usos múltiples

AVANCE DE TRABAJOS: (COL. SAN JOSÉ MUJULAR)

TRABAJOS DE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION EN ÁREA DE DESPLANTE, CONCRETO $F'c= 200$ KG/CM², SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PORTERIA, INSTALACIÓN ELECTRICA.

ANTES



ANEXOS

DURANTE



OBRA TERMINADA



Col. San José Mujular



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

Honorable Ayuntamiento Constitucional de
Chiapa de Corzo, Chiapas
2021-2024

