

Informe de labores de obras del 2do trimestre del ejercicio 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

Honorable Ayuntamiento Constitucional de
Chiapa de Corzo, Chiapas
2021-2024

Obras del 2do trimestre 2023

Nombre de la obra	Localidad	Inversión	%
Construcción de red de distribución de agua entubada	Los Framboyanes 1	490,613.75	0.32
Rehabilitación de escuela telesecundaria no. 115 Benito Juárez García CCT 07ETVO310S	America Libre	1,662,424.88	1.10
Construcción de sistema sanitario	La Santina	792,507.96	0.52
Construcción de domo y cancha de usos múltiples	General Emiliano Zapata li	2,791,600.31	1.84
Construcción de línea de conducción y red de distribución de agua potable	Monte Rico	3,000,000.00	1.98
Pavimentación de calles con concreto hidráulico	Paso Achiote	3,924,649.03	2.59
Pavimentación de calles con concreto hidráulico	Emiliano Zapata I	2,076,761.82	1.37
Revestimiento de camino rural	Emiliano Zapata (Zapata Iii)	5,495,000.00	3.62
Pavimentación de calles con concreto hidráulico	Rivera El Ranchito	5,038,491.90	3.32
Pavimentación de calles con concreto hidráulico	Ignacio Allende	4,397,347.75	2.90
Construcción de red de distribución de agua entubada	Lomas Verdes	579,197.55	0.38
Construcción de barda perimetral en la escuela primaria niños héroes	Julio César Ruíz Ferro	1,085,924.89	0.72
Construcción de alcantarillado pluvial	El Palmar	369,538.09	0.24
Pavimentación de calles con concreto mixto	Julio César Ruíz Ferro	1,273,532.11	0.84
Pavimentación de calles con concreto hidráulico	San Rafael	2,392,712.17	1.58
Pavimentación de calle con concreto mixto	La Trituradora	1,606,548.39	1.06
Pavimentación con concreto mixto	San Sebastián	2,018,021.84	1.33
Pavimentación de calle con concreto mixto	El Manguito Yolna	2,239,926.43	1.48
Pavimentación de calles con concreto mixto	3 de Marzo	2,119,276.43	1.40
Construcción de tanque público de agua potable ubicado en la localidad de Nuevo Bochil	Nuevo Bochil	1,831,208.68	1.21
Total		45,185,283.98	29.79



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

Obra: Construcción de red de distribución de agua entubada



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. LOS FRAMBOYANES I
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA
PROGRAMA: AS0000.- AGUA Y SANEAMIENTO
SUB-PROG: AS0900.-RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE

Nº DE OBRA: 23088

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$490,613.75	F.I.S.M.	\$268,693.72	F.I.S.M.	\$221,920.03
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$490,613.75	TOTAL	\$268,693.72	TOTAL	\$221,920.03

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

SISTEMA DE DESINFECCION: CAJAS PARA OPERACIÓN DE VALVULAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION CON HIPOCLORITO DE CALCIO, RED DE DISTRIBUCION: 987.20 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, CAJAS PARA OPERACIÓN DE VALVULAS, VALVULA DE COMPUERTA, 987.20 M DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 50MM, PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACIONES, 54.30 M3 DE PLANTILLA APISONADA, RELLENO, TOMAS DOMICILIARIAS: 235 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACIONES, RELLENOS, 47 TOMAS DOMICILIARIAS, 235 M DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM.

Numero de Contrato

MCC/DOPYDUM/FISMUN-013/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
17/04/2023	15/06/2023

Avances

Fisico: 100%
 Financiero: 55%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada



ANEXOS

Ubicación: LOS FRAMBOYANES 1

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA

=====

ANTES



DURANTE





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

□ Obra: Rehabilitación de escuela telesecundaria no. 115 Benito Juárez García CCT 07ETV0310S



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. AMERICA LIBRE
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ESCUELA TELESECUNDARIA No. 115 BENITO JUÁREZ GARCÍA CCT: 07ETV0310S
PROGRAMA: ED0000.- EDUCACION
SUB-PROG: ED1900.- MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Nº DE OBRA: 23055

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M	\$1,662,424.88	F.I.S.M	\$1,662,424.88	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$1,662,424.88	TOTAL	\$1,662,424.88	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICIONES, ACARREOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN MUROS, REHABILITACION DEL ASTA DE BANDERA, IMPERMEABILIZANTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON, REHABILITACION DE PORTERIA, JARDINERIAS, TECHADO: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, RELLENOS, ACARREOS, PLANTILLA DE CONCRETO, ACERO PARA REFUERZO, SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION HIDRAULICA.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-014/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	Fecha de termino
24/04/2023	22/06/2023
Programado real	
Termino	

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada



capturada en moto g⁺ plus

12 de mayo de 2023 6:34 p. m.

REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: FISMUN


Nombre de la obra: Rehabilitación de Escuela Telesecundaria No. 115 Benito Juárez García CCT 07ETV0310S

AVANCE DE TRABAJOS: (COL. AMERICA LIBRE)


TRABAJOS DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICIONES, ACARREOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN MUROS, REHABILITACION DEL ASTA DE BANDERA, IMPERMEABILIZANTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON, REHABILITACION DE PORTERIA, JARDINERIAS, TECHADO: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, RELLENOS, ACARREOS, PLANTILLA DE CONCRETO, ACERO PARA REFUERZO, SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION HIDRAULICA.

ANEXOS

ANTES

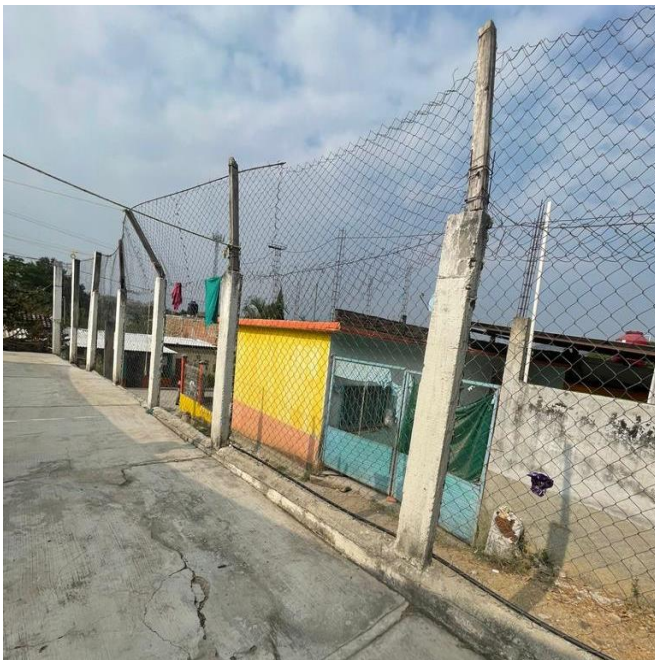

DURANTE

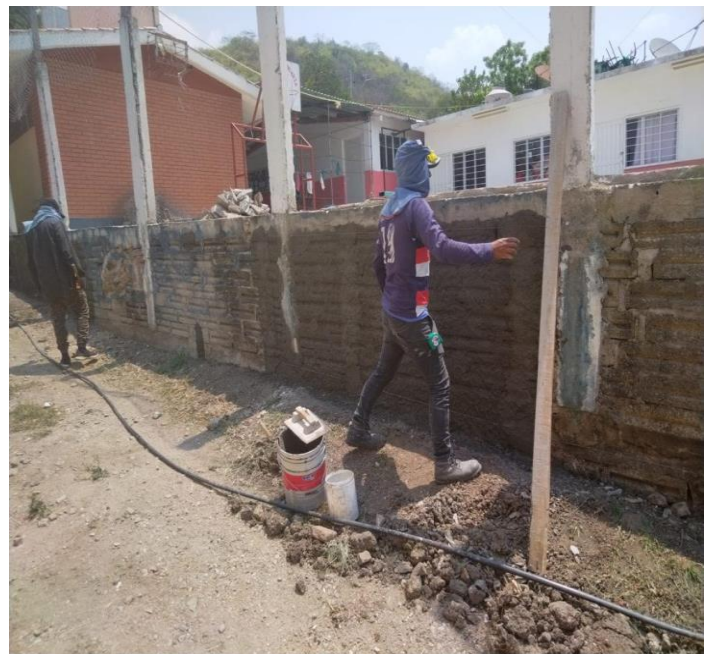

ANEXOS

OBRA TERMINADA



Col. América Libre



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

Obra: Construcción de sistema sanitario



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. LA SANTINA
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA SANITARIO
PROGRAMA: AS0000.- AGUA Y SANEAMIENTO
SUB-PROG: AS1100.- DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO

N° DE OBRA: 23085

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$792,507.96	F.I.S.M.	\$792,507.96	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$792,507.96	TOTAL	\$792,507.96	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

198 M2 DE TRAZO Y NIVELACION DE CALLES, EXCAVACIONES, 81 M3 DE RELLENO EN ZANJAS PRODUCTO DE LA EXCAVACION, 188 M3 DE RELLENO DE MATERIAL DE BANCO, 26 M3 DE PLANTILLA PARA RECIBIR TUBERIA, 198.50 M DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 250 MM, POZOS DE VISITA, ACARREOS, DESCARGAS DOMICILIARIAS: 46 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREOS, 78 M DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 160MM, 13 PZA DE REGISTROS.

Numero de Contrato

MCC/DOPYDUM/FISMUN-015/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	Programado real	Termino
24/04/2023		
		22/06/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografía Terminada



ANEXOS

Ubicación: LA SANTINA Programa: FISMUN


Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA SANITARIO

=====

ANTES



DURANTE

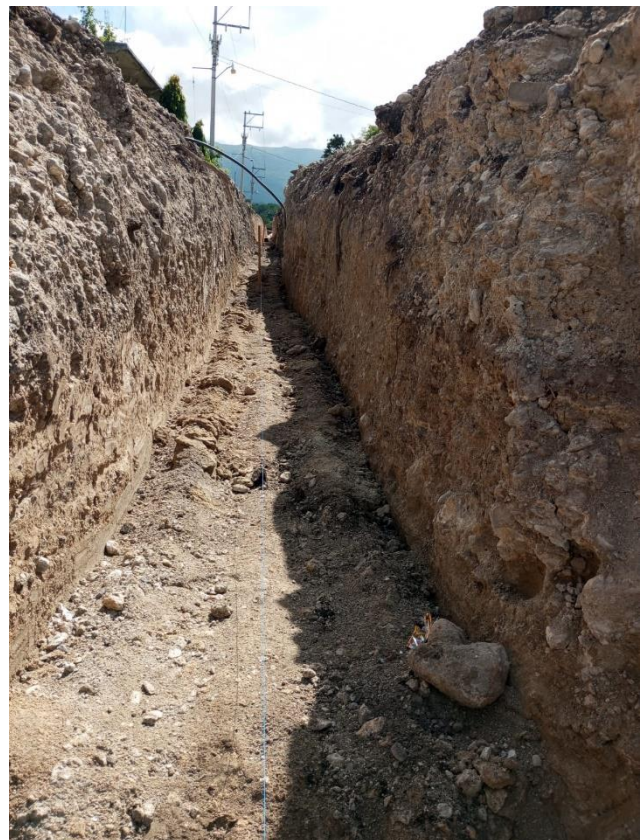

ANEXOS

Ubicación: LA SANTINA

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA SANITARIO

=====

DURANTE



OBRA TERMINADA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

Obra: Construcción de domo y cancha de usos múltiples



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. GENERAL EMILIANO ZAPATA II
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR1000.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Nº DE OBRA: 23041

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$2,791,600.31	F.I.S.M.	\$2,791,600.31	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$2,791,600.31	TOTAL	\$2,791,600.31	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE DESPLANTE, EXCAVACIONES, RELLENOS, CIMENTACION, ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, ANCLAS DE VARILLA LISA, LAMINA ZINTRO R-72 CAL. 26, INSTALACION ELECTRICA, LUMINARIA, PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE, 2 PZA DE BASE DE PORTERIA EN CANCHA DE BASQUETBOL.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-016/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Término
17/04/2023	30/06/2023
Programado real	
Termino	

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografía Terminada



ANEXOS


Ubicación: GENERAL EMILIANO ZAPATA II Programa: FISMUN

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

ANTES



DURANTE

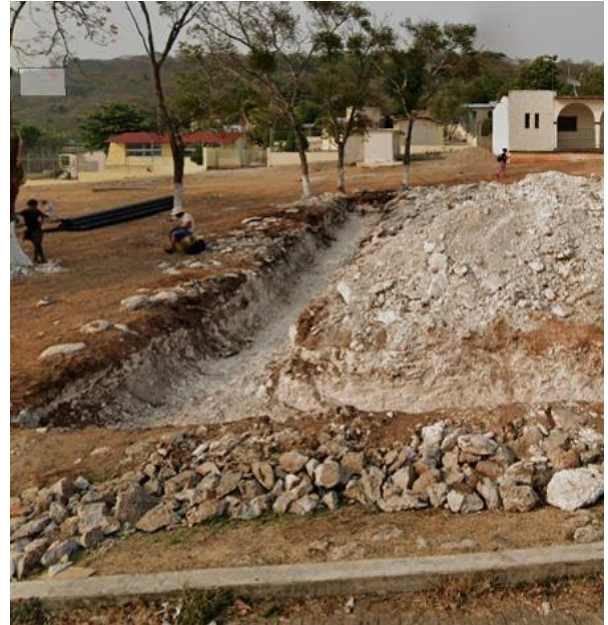

OBRA TERMINADA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ Obra: Construcción de línea de conducción y red de distribución de agua potable



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: RIBERA DE MONTE RICO
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
PROGRAMA: AS0000.- AGUA Y SANEAMIENTO
SUB-PROG: AS2100.- LINEAS DE CONDUCCION

Nº DE OBRA: 23054

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$3,000,000.00	F.I.S.M.	\$2,907,953.54	F.I.S.M.	\$92,046.46
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$3,000,000.00	TOTAL	\$2,907,953.54	TOTAL	\$92,046.46

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, CONSISTENTES EN: TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, ACARREOS, EXCAVACIONES, RELLENOS, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REHABILITACIÓN EN CAJAS DE OPERACIÓN DE VALVULAS, TENDIDO DE TUBERÍA DE PVC DE DIFERENTES DIAMETROS, PIEZAS ESPECIALES Y REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO EJECUTIVO DEL CONTRATO.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-017/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	Programado real	Termino
24/04/2023		
		07/07/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 97%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada



REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

AVANCE DE TRABAJOS: (COL. MONTE RICO)

LÍNEA DE CONDUCCIÓN, DE SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 3", ATRAQUES, VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION, VALVULA DE COMPUERTA, MALLA CICLON, CONSTRUCCION DE CARCAMO DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, INSTALACION DE ESCALERA MARINA, BOMBEO DE ACHIQUE, MURO DE ACOMETIDA, TREN DE DESCARGA, EQUIPO ELECTROMECHANICO, BOMBA TIPO SUMERGIBLE, EQUIPO DE CLORACION CON HIPOCLORITO, DEMOLICION DE TANQUE SUPERFICIAL, MURO DE MAMPOSTERIA, RED DE DISTRIBUCION CON DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 100MM, TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO.

ANEXOS

ANTES



ANEXOS

DURANTE



OBRA TERMINADA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ **Obra:** Pavimentación de calles con concreto hidráulico, Ubicado en la localidad de Paso Achiote



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. PASO ACHIOTE
NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR2000.- PAVIMENTACION

N° DE OBRA: 23069

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$3,924,649.03	F.I.S.M.	\$3,924,649.03	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$3,924,649.03	TOTAL	\$3,924,649.03	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

2,190 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACIONES, ACARREOS, 547 M3 DE RELLENO DE EXCAVACIONES, 936 M3 DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, 593 M DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X45 CMS., 2,100 M2 DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, 300 M DE ESTAMPADO DE CONCRETO EN CALLES PARA FORMACION DE CENEFA DE 50 CMS. DE ANCHO, 53 M3 DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO, SEPARACION DE JUNTA CONSTRUCTIVA, APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN GUARNICIONES, 140 M DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, 112 M DE TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 25MM, 112 M DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CEMENTAR DE 25MM, TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 50MM, 29 TOMAS DOMICILIARIAS, 14 PZA DE REGISTROS.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-018/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
02/05/2023	30/06/2023
Programado real	
Termino	

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada



REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO

AVANCE DE TRABAJOS: (COL. PASO ACHIOTE)

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, EXCAVACIONES, ACARREOS, MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS., CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10M CMS. DE ESPESOR, CORTE CON CORTADORA, ESTAMPADO DE CONCRETO PARA FORMACION DE CENEFAS, APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES.

ANEXOS

ANTES



ANEXOS

DURANTE



OBRA TERMINADA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ **Obra:** Pavimentación de calles con concreto hidráulico, Ubicado en la localidad de Emiliano Zapata I



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. EMILIANO ZAPATA I
NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR2000.- PAVIMENTACION

N° DE OBRA: 23068

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$2,076,761.82	F.I.S.M.	\$2,076,761.82	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$2,076,761.82	TOTAL	\$2,076,761.82	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

1,569 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACIONES, 362 M3 DE RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, 252.50 M DE ESTAMPADO DE CONCRETO EN CALLES PARA FORMACION DE CENEFAS DE 50 CM. DE ANCHO, ACARREOS, 1,479 M2 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, 493 M DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X45 CMS., APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA EN GUARNICIONES, 64 M DE SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLIETILENO DE 13MM DE DIAMETRO.

Numero de Contrato

MCC/DOPYDUM/FISMUN-019/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
02/05/2023	30/06/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada



REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: Pavimentación de calles con concreto hidráulico

AVANCE DE TRABAJOS: (COL. EMILIANO ZAPATA I)

TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, REHABILITACION DE DRENAJE, REHABILITACION DE AGUA ENTUBADA, CONCRETO F' c=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, ESTAMPADO DE CONCRETO PARA FORMACION DE CENEFA, CONCRETO F' c=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES, APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES, ALCANTARILLADO PLUVIAL.

ANEXOS

ANTES



ANEXOS

DURANTE



OBRA TERMINADA



Col. Emiliano Zapata I



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ **Obra:** Revestimiento de camino rural



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. EMILIANO ZAPATA
NOMBRE DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR2100.- REVESTIMIENTO

Nº DE OBRA: 23072

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M	\$5,495,000.00	F.I.S.M	\$5,495,000.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$5,495,000.00	TOTAL	\$5,495,000.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

6.00 KM DE RASTREO Y CONFIGURACION DE CAMINOS CON MAQUINA MOTOCOMFORMADORA, 6.00 KM DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO, ACARREOS, EXCAVACIONES.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-020/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
08/05/2023	
	06/07/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ **Obra:** Pavimentación de calles con concreto hidráulico, Ubicado en la localidad de Rivera El Ranchito



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. EL RANCHITO
NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR2000.- PAVIMENTACION

N° DE OBRA: 23071

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M	\$5,038,491.90	F.I.S.M	\$4,971,095.89	F.I.S.M.	\$67,396.01
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$5,038,491.90	TOTAL	\$4,971,095.89	TOTAL	\$67,396.01

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

2,590 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACIONES, 1,165.50 M3 DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, ACARREOS, 700 M DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 CON SECCION DE 15X20X40 CMS., 1,225 M2, 612.50 M2 Y 612.50 M2 DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, 1,169 M2 DE CORTE CON CORTADORA, APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES, 350 ML DE ESTAMPADO DE CONCRETO EN CALLES PARA FORMACION DE CENEFAS, 350 M DE SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO HIDRAULICO DE PVC, CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, VALVULA DE SECCIONAMIENTO, 180 M DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, 36 TOMAS DOMICILIARIAS.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-021/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
08/05/2023	06/07/2023
Programado real	
Termino	

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 99%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ Obra: Pavimentación de calles con concreto hidráulico, Ubicado en la localidad de Ignacio Allende



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. IGNACIO ALLENDE
NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR2000.- PAVIMENTACION

Nº DE OBRA: 23073

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$4,397,347.75	F.I.S.M.	\$4,351,141.23	F.I.S.M.	\$46,206.52
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$4,397,347.75	TOTAL	\$4,351,141.23	TOTAL	\$46,206.52

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

2,268 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACIONES, 1,065.60 M3 DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, ACARREOS, 640 M DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS., 2,240 M2 DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, 1,000 M DE CORTE CORTADORA, APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES, 320 M DE ESTAMPADO DE CONCRETO EN CALLES PARA FORMACION DE CENEFAS, 300 M DE SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO HIDRAULICO DE PVC, CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, VALVULA DE SECCIONAMIENTO, 180 M DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM, 36 TOMAS DOMICILIARIAS

Numero de Contrato

MCC/DOPYDUM/FISMUN-022/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	Programado real	Termino
08/05/2023		
		06/07/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

Obra: Construcción de red de distribución de agua entubada



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. LOMAS VERDES
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA
PROGRAMA: AS0000.- AGUA Y SANEAMIENTO
SUB-PROG: AS0900.-RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE

Nº DE OBRA: 23090

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$579,197.55	F.I.S.M.	\$264,626.58	F.I.S.M.	\$314,570.97
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$579,197.55	TOTAL	\$264,626.58	TOTAL	\$314,570.97

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

SISTEMA DE DESINFECCION, RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA, TOMAS DOMICILIARIAS.

Numero de Contrato

MCC/DOPYDUM/FISMUN-023/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Término
22/05/2023	20/07/2023
Programado real	
Termino	

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 46%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografía Terminada



ANEXOS

Ubicación: LOMAS VERDES


Programa: FISMUN

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA

ANTES



DURANTE

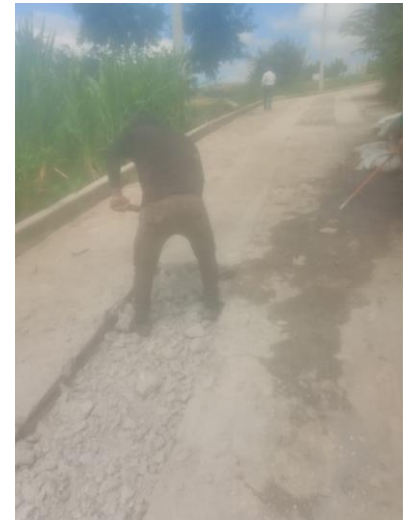

OBRA TERMINADA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ **Obra:** Construcción de barda perimetral en la escuela primaria niños héroes



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA DE PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES
PROGRAMA: ED0000.- EDUCACION
SUB-PROG: ED2100.- PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)

Nº DE OBRA: 23076

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$1,085,924.89	F.I.S.M.	\$1,085,924.89	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$1,085,924.89	TOTAL	\$1,085,924.89	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

571 M2 DE DESMANTELAMIENTO DE CERCAS DE MALLA CICLONICA, 95 PZA DE DESMANTELAMIENTO DE POSTES DE LINEA EN CERCA, 8 PZA DE DESMANTELAMIENTO DE POSTES DE ARRANQUE Y PUERTAS EN CERCAS, DESMANTELAMIENTO DE POSTES SUPERIOR, RETENIDAS Y ALAMBRES, 257 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE DESPLANTE, EXCAVACIONES, 228 M2 DE MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION, ACERO DE REFUERZO, 25 M3 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 EN CIMENTACION, 714 M3 DE MURO DE 15 CMS. DE ESPESOR DE TABICON PRENSADO, RELLENO, 128 M3 DE MATERIAL DE BANCO, ACARREOS.

Numero de Contrato

MCC/DOPYDUM/FISMUN-024/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
22/05/2023	20/06/2023

Avances

Fisico: 100%
 Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada



ANEXOS

Ubicación: JULIO CÉSAR RUÍZ FERRO

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES

ANTES



DURANTE



ANEXOS

Ubicación: JULIO CÉSAR RUÍZ FERRO


Programa: FISMUN

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES

EN PROCESO



OBRA TERMINADA

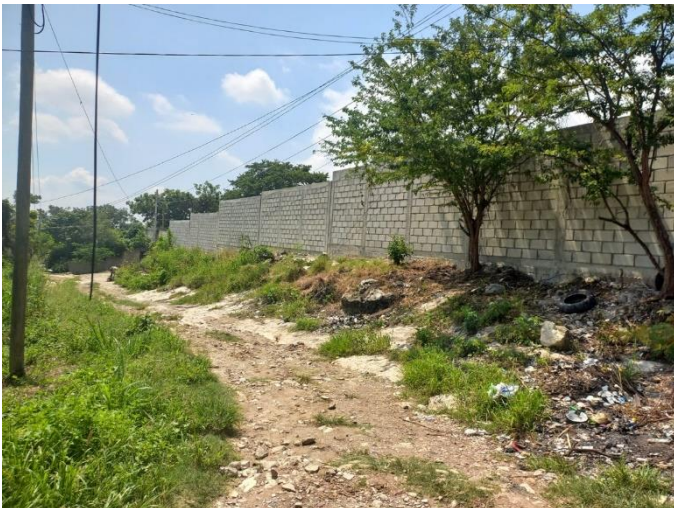

ANEXOS


Ubicación: JULIO CÉSAR RUÍZ FERRO

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES

=====

OBRA TERMINADA

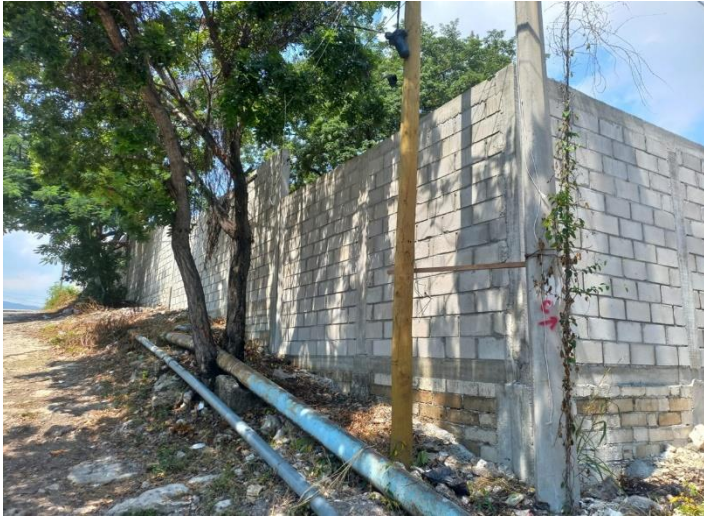



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

Obra: Construcción de alcantarillado pluvial



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. EL PALMAR
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
PROGRAMA: AS0000.- AGUA Y SANEAMIENTO
SUB-PROG: AS1100.- DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO

N° DE OBRA: 23077

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$369,538.09	F.I.S.M.	\$369,538.09	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$369,538.09	TOTAL	\$369,538.09	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

48.20 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACIONES, 69.20 M3 DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, 62.75 M3 DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, 34.08 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO, 12 M DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 102MM, ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION, CIMBRA, 5.46 M3 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 EN OBRA, ACARREOS.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-025/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
22/05/2023	15/06/2023

Avances

Fisico: 100%
 Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada



REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: Construcción de alcantarillado pluvial

AVANCE DE TRABAJOS: (COL. EL PALMAR)

TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, PLANTILLA DE CONCRETO, TUBO SANITARIO DE PVC DE 102MM, ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION, CIMBRA, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN OBRA, ACARREOS.

ANEXOS

ANTES



ANEXOS

DURANTE



OBRA TERMINADA



Col. El Palmar



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ **Obra:** Pavimentación de calles con concreto mixto, ubicado en la localidad Julio César Ruíz Ferro



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO
NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR2000.- PAVIMENTACION

Nº DE OBRA: 23079

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M	\$1,273,532.11	F.I.S.M	\$1,273,532.11	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$1,273,532.11	TOTAL	\$1,273,532.11	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

1,176.80 M2 DE TRAZO Y NIVELACION DE CALLES, EXCAVACIONES, 464 M3 DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, ACARREOS, 400 M DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS; 280 M2 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, 880 M2 DE ZAMPEADO PARA PISO ELABORADO CON PIEDRA BRAZA, CORTE CON CORTADORA, APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES, SEPARACION DE JUNTA CONSTRUCTIVA.

Numero de Contrato

MCC/DOPYDUM/FISMUN-026/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	Programado real	Termino
22/05/2023		
		20/07/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada



REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas.

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO

AVANCE DE TRABAJOS: (COL. JULIO CÉSAR RUIZ FERRO)

TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACIONES, ACARREOS, RELLENO DE EXCAVACIONES, CONCRETO F'C=200 KG/CM² DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, CONCRETO F'C=150 KG/CM² EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS., PISO DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION, APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES.

ANEXOS

ANTES



ANEXOS

DURANTE



OBRA TERMINADA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ **Obra:** Pavimentación de calles con concreto hidráulico, en la localidad San Rafael



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. SAN RAFAEL
NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR2000.- PAVIMENTACION

Nº DE OBRA: 23082

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$2,392,712.17	F.I.S.M.	\$2,365,913.18	F.I.S.M.	\$26,798.99
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$2,392,712.17	TOTAL	\$2,365,913.18	TOTAL	\$26,798.99

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

MPIA, TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACIONES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO, ESTAMPADO DE CONCRETO EN CALLES PARA FORMACION DE CENEFAS, ACARREOS, CONCRETO DE FC=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, CONCRETO DE FC=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X45 CMS., APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA EN GUARNICIONES, TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 50MM, RELLENO, VALVULA DE COMPUERTA, CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, ABRAZADERAS PARA TOMAS DOMICILIARIAS, TOMAS DOMICILIARIAS, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM DE DIAMETRO, CONCRETO DE FC=150 KG/CM2 EN CIMENTACION, CIMBRAS.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-027/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	Fecha de termino
22/05/2023	21/07/2023
Programado real	
Termino	

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 99%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografía Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ **Obra:** Pavimentación de calle con concreto mixto, ubicado en la localidad La Trituradora



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. LA TRITURADORA
NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR2000.- PAVIMENTACION

N° DE OBRA: 23086

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$1,606,548.39	F.I.S.M.	\$1,606,548.39	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$1,606,548.39	TOTAL	\$1,606,548.39	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

1,200 M2 DE TRAZO Y NIVELACION DE CALLES, EXCAVACIONES, ACARREOS, 240 M3 DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PETREO, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL, 240 M3 DE MATERIAL TRITURADO DE 3/4", 610 M2 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, 400 M DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS., 600 M2 DE PISO DE PIEDRA BRAZA, CORTE CON CORTADORA, SEPARACION DE JUNTA CONSTRUCTIVA, APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES, 60 TOMAS DOMICILIARIAS, CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, VALVULA DE SECCIONAMIENTO, 120 M DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-028/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	Programado real	Termino
05/06/2023		
		03/08/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada



REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas. Programa: FISMUN

Nombre de la obra: PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO

AVANCE DE TRABAJOS: (COL. LA TRITURADORA)

TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACIONES, ACARREOS, RELLENO DE EXCAVACIONES, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS., PISO DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION, APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES.

ANEXOS

ANTES



ANEXOS

DURANTE



OBRA TERMINADA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ Obra: Pavimentación con concreto mixto en la colonia San Sebastián



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. SAN SEBASTIAN
NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR2000.- PAVIMENTACION

Nº DE OBRA: 23078

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M	\$2,018,021.84	F.I.S.M	\$1,942,962.99	F.I.S.M.	\$75,058.85
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$2,018,021.84	TOTAL	\$1,942,962.99	TOTAL	\$75,058.85

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripcion de la Obra

1,658 M2 DE TRAZO Y NIVELACION DE CALLES, EXCAVACIONES, 466 M3 DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO, ACARREOS, 480 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS.672 M2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, 768 M2 DE ZAMPEADO PARA PISO ELABORADO CON PIEDRA BRAZA, CORTE CON CORTADORA, APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES, SEPARACION DE JUNTA CONSTRUCTIVA, MURO DE MAMPOSTERIA: 28 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE DESPLANTE, 11.90 M3 DE MATERIAL DE BANCO, 28 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, 39 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, 14.40 M DE SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 102MM.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-029/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	
Programado real	05/06/2023
Termino	03/08/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 96%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada




ANEXOS

Ubicación: SAN SEBASTIÁN Programa: FISMUN

Nombre de la obra: PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO

=====

OBRA TERMINADA

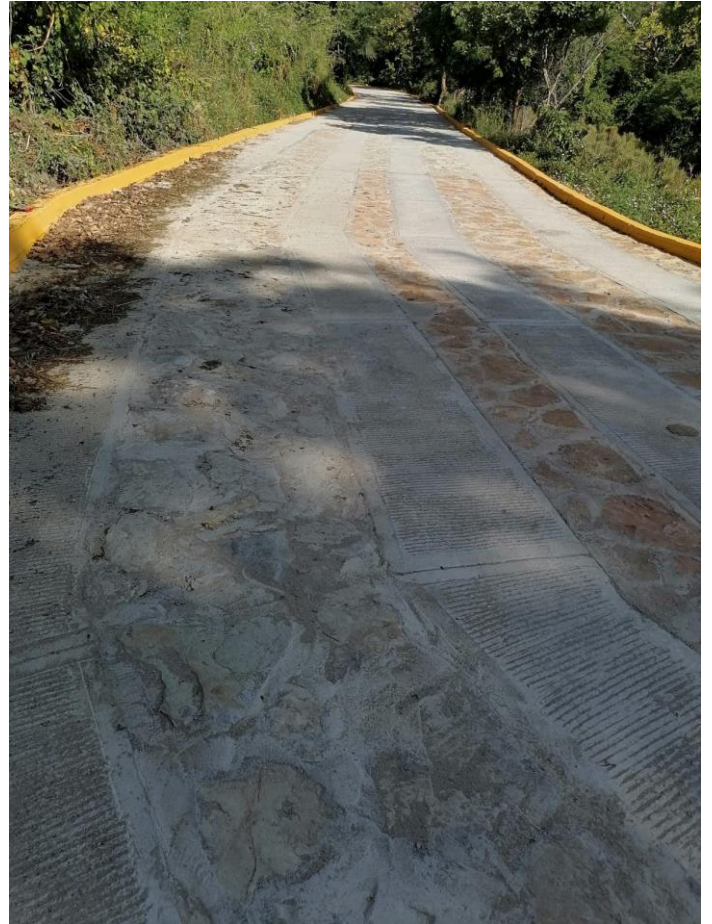



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ **Obra:** Pavimentación de calle con concreto mixto, ubicado en la localidad El Manguito Yolna



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. MANGUITO YOLNA
NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR2000.- PAVIMENTACION

Nº DE OBRA: 23097

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$2,239,926.43	F.I.S.M.	\$2,026,507.46	F.I.S.M.	\$213,418.97
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$2,239,926.43	TOTAL	\$2,026,507.46	TOTAL	\$213,418.97

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACIONES, ACARREOS, RELLENO DE EXCAVACIONES, CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, CONCRETO FC=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS., PISO DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION, APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-030/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	
Programado real	07/06/2023
Termino	05/08/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 90%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografia Terminada



REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas. Programa: FISMUN

Nombre de la obra: PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO

AVANCE DE TRABAJOS: (COL. EL MANGUITO YOLNA)

TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACIONES, ACARREOS, RELLENO DE EXCAVACIONES, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS., PISO DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION, APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES.

ANEXOS

ANTES



ANEXOS

DURANTE



OBRA TERMINADA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Pavimentación de calles con concreto mixto, ubicado en la localidad 3 de Marzo



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. 3 DE MARZO
NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR2000.- PAVIMENTACION

Nº DE OBRA: 23084

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M	\$2,119,276.43	F.I.S.M	\$1,929,577.05	F.I.S.M.	\$189,699.38
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$2,119,276.43	TOTAL	\$1,929,577.05	TOTAL	\$189,699.38

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripcion de la Obra

1,680 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACIONES, ACARREOS, 1,440 M2 DE COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL, SUMINISTRO DE MATERIAL TRITURADO, OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION, 720 M3 DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, 424 M DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS., 720 M2 DE PISO DE PIEDRA BRAZA, CORTE CON CORTADORA, SEPARACION DE JUNTA CONSTRUCTIVA, APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES, 25 TOMAS DOMICILIARIAS, 200 M DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13MM.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-032/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	
Programado real	26/06/2023
Termino	24/08/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 91%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografia Terminada



REPORTE DE AVANCE DE TRABAJOS

Municipio: Chiapa de Corzo, Chiapas. Programa: FISMUN

Nombre de la obra: PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO MIXTO

AVANCE DE TRABAJOS: (COL. 3 DE MARZO)

TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACIONES, ACARREOS, RELLENO DE EXCAVACIONES, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS., PISO DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION, APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES.

ANEXOS

ANTES



ANEXOS

DURANTE



OBRA TERMINADA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

Obra: Construcción de tanque público de agua potable ubicado en la localidad de Nuevo Bochil



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. NUEVO BOCHIL
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE
PROGRAMA: AS0000.-AGUA Y SANEAMIENTO
SUB-PROG: AS0300.- DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE

Nº DE OBRA: 23083

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$1,831,208.68	F.I.S.M.	\$1,580,408.13	F.I.S.M.	\$250,800.55
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$1,831,208.68	TOTAL	\$1,580,408.13	TOTAL	\$250,800.55

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

100 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO, 88 M3 DE DESPALME DEL TERRENO, EXCAVACION, RELLENOS, 36 HR DE BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTECEBANTE, CONCRETO EN CIMENTACION, ACERO DE REFUERZO, 74 M2 DE MURO DE MAMPOSTERIA JUNTEADA, APLANADO DE MURO, IMPERMEABILIZACION, ESCALERA MARINA, 76.27 M2 DE GUSANEADO SBRE MUROS DE MAMPOSTERIA, 121 M3 DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE MAMPOSTERIA, APLANADOS, 56 M DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLON 55X55 MM, TUBERIA DE ACERO SOLDABLE, VALVULA DE COMPUERTA, CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION CON HIPLOCLORITO DE CALCIO AL 65%, SUMINISTRO DE HIPLOCLORITO DE CALCIO AL 65%.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-033/2023

Numero de Dictamen

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 86%

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	
Programado real	14/07/2023
Termino	11/09/2023

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografia Terminada



ANEXOS

Ubicación: NUEVO BOCHIL

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE

ANTES



DURANTE





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

Honorable Ayuntamiento Constitucional de
Chiapa de Corzo, Chiapas
2021-2024

