

Informe de labores de obras del 3er trimestre del ejercicio 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

Honorable Ayuntamiento Constitucional de
Chiapa de Corzo, Chiapas
2021-2024



Obras del 3er trimestre 2023

Nombre de la obra	Localidad	Inversión	%
Construcción de tanque público de agua potable ubicado en la localidad de Vista Hermosa	Vista Hermosa	1,324,431.00	0.87
Construcción de tanque de rebombeo e instalación de bomba tipo sumergible ubicado en la localidad de Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	4,639,767.73	3.06
Pavimentación de calles con concreto hidráulico ubicado en la localidad de María Candelaria	María Candelaria	2,417,047.24	1.59
Construcción de sistema sanitario	San Francisco	3,267,129.33	2.15
Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. Francisco Sarabia	330,786.00	0.22
Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. Ignacio Allende	330,786.00	0.22
Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. Nicolas Bravo	330,786.00	0.22
Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. El Ranchito	330,786.00	0.22
Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. Julián Grajales	330,786.00	0.22
Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. La Escalera	330,786.00	0.22
Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. Salvador Urbina	330,786.00	0.22
Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. El Amatal	330,786.00	0.22
Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. Cupasmi	330,786.00	0.22
Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. Monte Rico	330,786.00	0.22
Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. Nva. Palestina	330,786.00	0.22
Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. Distrito Federal	330,786.00	0.22
Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. Galecio Narcia	330,786.00	0.22
Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. San Sebastián	330,786.00	0.22
Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. Las Tunas	330,786.00	0.22
Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. Nva Carmen Tonapac	330,786.00	0.22
Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. Playa Grande	330,786.00	0.22
Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. Juan De Grijalva	330,786.00	0.22
Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. Julio Cesar Ruiz Ferro	330,786.00	0.22



Obras del 3er trimestre 2023

Nombre de la obra	Localidad	Inversión	%
Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1	La Santina	330,786.00	0.22
Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. Vista Hermosa	330,786.00	0.22
Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Col. Narciso Mendoza	330,786.00	0.22
Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1	La Cadelaria	330,786.00	0.22
Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1	El Turizal	330,786.00	0.22
Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1	Ribera Zaragoza	330,786.00	0.22
	Total	19,918,025.30	13.13



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

Obra: Construcción de tanque público de agua potable ubicado en la localidad de Vista Hermosa



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. VISTA HERMOSA
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE
PROGRAMA: AS0000.- AGUA Y SANEAMIENTO
SUB-PROG: AS0300.- DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE

Nº DE OBRA: 23087

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$1,324,431.00	F.I.S.M.	\$1,099,613.19	F.I.S.M.	\$224,817.81
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$1,324,431.00	TOTAL	\$1,099,613.19	TOTAL	\$224,817.81

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO, DESPALME DEL TERRENO, EXCAVACION, RELLENOS, BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA, CONCRETO EN CIMENTACION, ACERO DE REFUERZO, MURO DE MAMPOSTERIA JUNTEADA, APLANADO DE MURO, IMPERMEABILIZACION, ESCALERA MARINA, 150 M3 DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE MAMPOSTERIA, APLANADOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLON 55X55 MM, TUBERIA DE ACERO SOLDABLE, VALVULA DE COMPUERTA, CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION CON HIPLOCLORITO DE CALCIO AL 65%, SUMINISTRO DE HIPLOCLORITO DE CALCIO AL 65%.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-034/2023

Numero de Dictamen

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 83%

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	
Programado real	14/07/2023
Termino	11/09/2023

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografia Terminada



ANEXOS

Ubicación: VISTA HERMOSA Programa: FISMUN

Nombre de la obra: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE

ANTES



DURANTE





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Construcción de tanque de rebombeo e instalación de bomba tipo sumergible ubicado en la localidad de Venustiano Carranza



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. VENUSTIANO CARRANZA
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE DE REBOMBEO E INSTALACION DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE
PROGRAMA: AS0000.- AGUA Y SANEAMIENTO
SUB-PROG: AS0300.- DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE

Nº DE OBRA: 23098

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M	\$4,639,767.73	F.I.S.M	\$3,543,413.23	F.I.S.M.	\$1,096,354.50
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$4,639,767.73	TOTAL	\$3,543,413.23	TOTAL	\$1,096,354.50

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO MECANICO DEL BOMBEO, BOMBA VERTICAL TIPO SUMERGIBLE, ARRANCADOR AUTOMATICO, INSTALACION ELECTRICA DE CASETA DE CONTROL, ACARREOS, CONEXIONES DE LLEGADA AL TANQUE DE REBOMBEO, VALVULA DE COMPUERTA, CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO DE 30M3: EXCAVACIONES, RELLENOS, BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, CONCRETO EN CIMENTACION, ACERO DE REFUERZO, PINTURA, 36 M DE MALLA CICLON, PORTON, ESCALERA MARINA, CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL EN REBOMBEO, AMPLIACION DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION EN MEDIA TENSION, INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO MECANICO REBOMBEO, TREN DE DESCARGA.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-035/2023

Numero de Dictamen

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 76%

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	
Programado real	07/07/2023
Termino	31/12/2023

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada



ANEXOS

Ubicación: VENUSTIANO CARRANZA

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE TANQUE DE REBOMBEO E INSTALACION DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE

ANTES



DURANTE





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

❑ **Obra:** Pavimentación de calles con concreto hidráulico ubicado en la localidad de María Candelaria



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. MARIA CANDELARIA
NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR2000.- PAVIMENTACION

Nº DE OBRA: 23089

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M	\$2,417,047.24	F.I.S.M	\$2,193,453.86	F.I.S.M.	\$223,593.38
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$2,417,047.24	TOTAL	\$2,193,453.86	TOTAL	\$223,593.38

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, DESPALME DE TERRENO A MANO, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL, MATERIAL DE BANCO, ACARREOS, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS., CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES, CONCRETO ESTAMPADO PARA CENEFA, APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-036/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
01/08/2023	29/09/2023
Programado real	
Termino	

Avances

Fisico: 100%
 Financiero: 91%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografia Terminada



ANEXOS

Ubicación: MARÍA CANDELARIA

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO

ANTES



DURANTE



EN PROCESO



ANEXOS

Ubicación: MARÍA CANDELARIA

Programa: FISMUN

Nombre de la obra: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO

=====

OBRA TERMINADA





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

Obra: Construcción de sistema sanitario



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. SAN FRANCISCO
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA SANITARIO
PROGRAMA: AS0000.- AGUA Y SANEAMIENTO
SUB-PROG: AS1100.- DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO

Nº DE OBRA: 23091

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M	\$3,267,129.33	F.I.S.M	\$3,097,815.85	F.I.S.M.	\$169,313.48
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$3,267,129.33	TOTAL	\$3,097,815.85	TOTAL	\$169,313.48

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

1,030 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACIONES, RELLENOS, 157 M3 DE PLANTILLA DE MATERIAL MEJORADO PARA RECIBIR TUBERIA, 727 M DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 250 MM DE DIAMETRO, 302 M DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 300 MM DE DIAMETRO, POZOS DE VISITA, ACARREOS, 26 PZA DE BROCALES PARA POZOS DE VISITA, DESCARGAS DOMICILIARIAS: 162 M2 DE TRAZO Y NIVELACION DE CALLES, EXCAVACIONES, ACARREOS, RELLENOS, 272 M DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 160MM DE DIAMETRO, 41 PZA DE SILLETAS DE PVC SANITARIO, 41 PZA DE REGISTROS, REPOSICION DE CARPETA.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISMUN-037/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Termino
01/08/2023	29/09/2023

Avances

Fisico: 100%
 Financiero: 95%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. Francisco Sarabia



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. FRANCISCO SARABIA
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23001

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPYDUM/FISM-OT-001/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Término
30/01/2023	13/02/2023
Programado real	
Termino	

Avances

Físico: 100%
 Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografía Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. Ignacio Allende



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. IGNACIO ALLENDE
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23002

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPYDUM/FISM-OT-002/2023

Numero de Dictamen

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	
Programado real	30/01/2023
Termino	
	13/02/2023

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografía Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. Nicolas Bravo



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. NICOLAS BRAVO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

N° DE OBRA:

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripcion de la Obra
 REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo
 MCC/DOPYDUM/FISM-OT-003/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Término
30/01/2023	13/02/2023

Avances
 Fisico: 100%
 Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. El Ranchito



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. EL RANCHITO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23004

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPyDUM/FISM-OT-004/2023

Numero de Dictamen

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio

30/01/2023

Programado real

Termino

13/02/2023

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. Julián Grajales



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. JULIAN GRAJALES
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23005

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPyDUM/FISM-OT-005/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	
Programado real	30/01/2023
Termino	13/02/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. La Escalera



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. LA ESCALERA
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23019

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPyDUM/FISM-OT-006/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	
Programado real	30/01/2023
Termino	
	13/02/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. Salvador Urbina



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. SALVADOR URBINA
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23006

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPyDUM/FISM-OT-007/2023

Numero de Dictamen

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	
Programado real	30/01/2023
Termino	13/02/2023

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. El Amatal



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. AMATAL
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

N° DE OBRA: 23007

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPYDUM/FISM-OT-008/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	
Programado real	30/01/2023
Termino	
	13/02/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. Cupasmi



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. CUPASMI
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23008

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPyDUM/FISM-OT-009/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	
Programado real	30/01/2023
Termino	
	13/02/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. Monte Rico



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: MONTE RICO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23009

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPYDUM/FISM-OT-010/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	
Programado real	30/01/2023
Termino	
	13/02/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. Nva. Palestina



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. NUEVA PALESTINA
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23010

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPYDUM/FISM-OT-011/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Término
30/01/2023	13/02/2023

Avances

Fisico: 100%
 Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografía Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. Distrito Federal



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. DISTRITO FEDERAL
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

N° DE OBRA: 23011

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPYDUM/FISM-OT-012/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	
Programado real	30/01/2023
Termino	
	13/02/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. Galecio Narcia



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. GALECIO NARCIA
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23012

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M	\$330,786.00	F.I.S.M	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPYDUM/FISM-OT-013/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	
Programado real	30/01/2023
Termino	
	13/02/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografía Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. San Sebastián



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. SAN SEBASTIAN
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

N° DE OBRA: 23013

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPYDUM/FISM-OT-014/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	
Programado real	30/01/2023
Termino	
	13/02/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografía Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. Las Tunas



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. LAS TUNAS
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

N° DE OBRA: 23014

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M	\$330,786.00	F.I.S.M	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPYDUM/FISM-OT-015/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	Programado real	Termino
30/01/2023		
		13/02/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. Nva Carmen Tonapac



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. NUEVO CARMEN TONAPAC
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23018

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPyDUM/FISM-OT-016/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	
Programado real	30/01/2023
Termino	13/02/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. Playa Grande



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. PLAYA GRANDE
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23015

Situacion Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPyDUM/FISM-OT-017/2023

Numero de Dictamen

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio

30/01/2023

Programado real

Termino

13/02/2023

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. Juan De Grijalva



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. JUAN DEL GRIJALVA
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23016

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPyDUM/FISM-OT-018/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	
Programado real	30/01/2023
Termino	
	13/02/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col Julio Cesar Ruiz Ferro



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23017

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPYDUM/FISM-OT-019/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	Programado real	Termino
30/01/2023		
		13/02/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en La Santina



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL (LA SANTINA)
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

N° DE OBRA: 23022

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M	\$330,786.00	F.I.S.M	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPYDUM/FISM-OT-020/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	
Programado real	30/01/2023
Termino	
	13/02/2023


Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Ampliacion de Plazo				

Fotografia Terminada

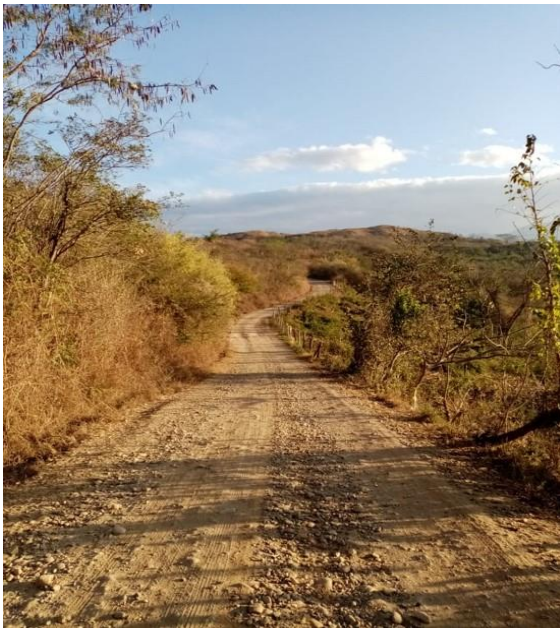



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. Vista Hermosa



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL (VISTA HERMOSA)
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23023

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPyDUM/FISM-OT-021/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	
Programado real	30/01/2023
Termino	
	13/02/2023


Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografía Terminada

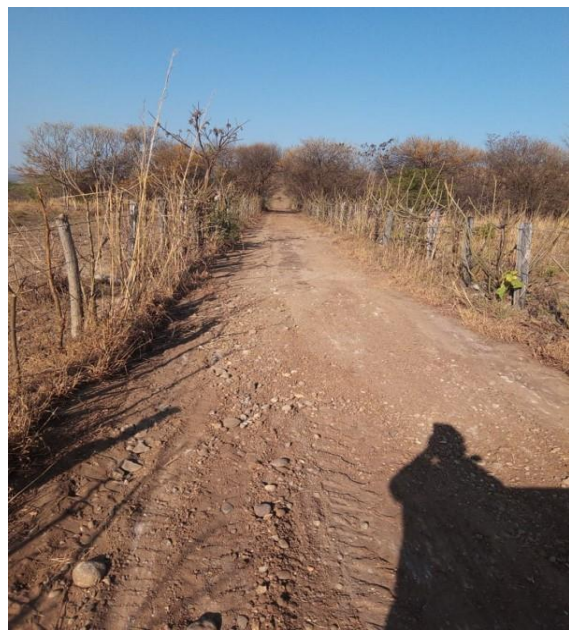



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Col. Narciso Mendoza



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. NARCISO MENDOZA
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23024

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPyDUM/FISM-OT-022/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	
Programado real	30/01/2023
Termino	13/02/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en La Cadelaria



FICHA TECNICA DE OBRA (F.I.S.M. - 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL_2023

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. LA CANDELARIA
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACIÓN
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23025

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$330,786.00	F.I.S.M.	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO/ ADMINISTRACION DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACIÓN POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Orden de Trabajo

MCC/DOPyDUM/FISM-OT-023/2023

Numero de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	
Programado real	14/02/2023
Termino	28/02/2023

Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la El Turizal



FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. EL TURIZAL
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23026

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$330,786.00	FISM	\$330,786.00	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Contrato

MCC/DOPYDUM/FISM-0T-024/2023

Número de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de Inicio	Fecha de Término
14/02/2023	28/02/2023
Programado real	
Termino	

Avances

Fisico: 100%
 Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografía Terminada





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHIAPA DE CORZO
2021-2024
GOBERNEMOS JUNTOS

- ❑ **Obra:** Rehabilitación de camino rural (tramos aislados) etapa 1, ubicada en la Ribera Zaragoza



FICHA TÉCNICA DE OBRA (FISM 2023)

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO
LOCALIDAD: COL. RIBERA ZARAGOZA
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) ETAPA 1
PROGRAMA: UR0000.- URBANIZACION
SUB-PROG: UR0500.- CAMINOS RURALES

Nº DE OBRA: 23027

Situación Financiera

INVERSIÓN PROGRAMADA		INVERSIÓN EJERCIDA		SALDO	
FISM	\$330,786.00	FISM	\$330,786.00	FISM	\$0.00
APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00	APORTACIÓN	\$0.00
TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$330,786.00	TOTAL	\$0.00

Modalidad de Ejecución: ORDEN DE TRABAJO/ ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Descripción de la Obra

REHABILITACIÓN DE 1.09 KM DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTENTE EN: BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS "B" Y "C", OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL Y ACARREOS.

Numero de Contrato

MCC/DOPyDUM/FISM-OT-025/2023

Número de Dictamen

Periodo de Ejecucion

Fecha de inicio	
Programado real	14/02/2023
Termino	28/02/2023


Avances

Fisico: 100%

Financiero: 100%

Tipo	Importe	Inicio	Termino	Observaciones
Contrato				
Diferido				
Amplacion de Plazo				

Fotografia Terminada

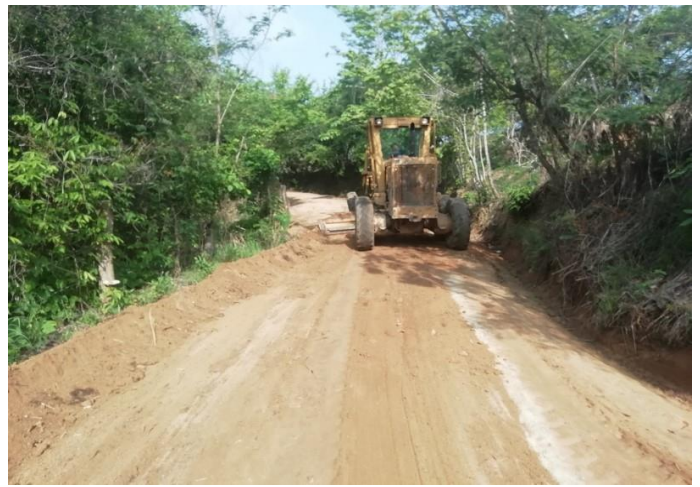



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

CHIAPA DE CORZO

2021-2024

GOBERNEMOS JUNTOS

Honorable Ayuntamiento Constitucional de
Chiapa de Corzo, Chiapas
2021-2024

